

Datos de la Fianza
FOLIO 1131380

Movimiento : POLIZA	R.F.C. Fiado : VASA521020A12	Monto Afianzado del	\$32,230.71
Fianza : 19A24594	Endoso : 19A24594	Movimiento	
Ramo : ADMINISTRATIVO			
Subramo : OBRA			
Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			
Moneda : PESOS	Código Seguridad: 8IIRRLiN		
Agente : 855155	C.C. : 3003010		
Nombre : FIDEL BALDERAS RODRIGUEZ			
División : FORANEA			
Monto Total de la Fianza:	\$32,230.71		

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

ANTE: EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. PARA GARANTIZAR POR EL ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ, CON DOMICILIO BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO 760 A COL. GUADALUPE MAINERO, C.P. 87100, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: R.F.C. VASA521020A12, EL CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE INVITACION POR ASIGNACIÓN DIRECTA, CONTRATO NUMERO FH-04-19, DE FECHA 8 DE MAYO DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y POR LA OTRA PARTE ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ, RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$322,307.10 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 10/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO., ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARÁ CUANDO ASÍ LO AUTORIZA POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE CONSTITUYE FIADORA DE ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ, Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.*** FIN DE TEXTO ***

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$32,230.71 (***) TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 71/100 M.N. (***)

MIGUEL ÁNGEL ROBLES SAN MARTIN
JEFE DE OFICINA

TAMPICO, TAMAULIPAS, A 10 DE MAYO DE 2019

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx


Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 019A 2459 4113 1380

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Del. Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8



ARMANDO DAVID

Vanoye Sanchez

INGENIERIA CIVIL

Haciendo realidad sus ideas

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A1 327

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409115676

Fecha y Hora de emisión

2019-06-11T14:47:27

Folio Fiscal

BDE015EF-8C81-11E9-93C1-00155D014009

Emisor

RFC: VASA521020A12

Razón Social: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-06-11T14:47:27

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
12,250.00	MTK - Metro cuadrado	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$320,640.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FH-04-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL E.J. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM ClaveProdServ - 72103301 - Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parqueaderos	22.68	277,850.95

TOTAL EN LETRA:

TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal

277,850.95 MXN

IVAT 0.160000

44,456.15 MXN

RET. CONTRALORIA MPAL

1,389.25 MXN

0.50

RETENCION 0.10

277.85 MXN

Total

320,640.00 MXN

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BDE015EF-8C81-11E9-93C1-00155D014009|2019-06-11T14:47:27|TBN040609RKA|o+rdp0fc6P8Jm7cfIUWntWTTK1npWKU96ocwRQ4L62EdiOaWQsdhL2Gb9jID9WSRceDGfKGXF+wHRziY6U9So dJnNzg9SkglyA/UIWkaZxtiXJ+XYZ7FcTDqvvom2cr1KDNVn/+xXhNC/G6hy4cwuVB9honPwZyC+M2hOyBlv70RrOUL+BZcrSzkP7mY7n+qLx4l YMwJZ4doiobl8Nrm1CNqIEA1MQX31UP421bpbHuYTG0EY5EguYpUy6g/S5I46YewQ/d81g1S7nAs73KNINoYFNP+siGhXIN/dy9sJQC+76Th7Y uPIQo3HUqS6rC1BQ/eP778i2IFGQ==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

o+rdp0fc6P8Jm7cfIUWntWTTK1npWKU96ocwRQ4L62EdiOaWQsdhL2Gb9jID9WSRceDGfKGXF+wHRziY6U9SodJnNzg9SkglyA/UIWkaZxtiXJ +XYZ7FcTDqvvom2cr1KDNVn/+xXhNC/G6hy4cwuVB9honPwZyC+M2hOyBlv70RrOUL+BZcrSzkP7mY7n+qLx4lYMWJZ4doiobl8Nrm1CNqIEA 1MQX31UP421bpbHuYTG0EY5EguYpUy6g/S5I46YewQ/d81g1S7nAs73KNINoYFNP+siGhXIN/dy9sJQC+76Th7Y uPIQo3HUqS6rC1BQ/eP778i2IFGQ==

Sello digital del SAT

.E5wKHBmEtiDPAeFZN5znBYTxJssE7348vT3ZdV44aTo+1FtyYHMjxVEESDQpALhGcOHTpgOspa/YmfBE3bRtllovOfGW79V+T7VR/WTBa0SG uOpKdSHAwgAWpIp/qFxFCTGNZwBULBkjiIUU8dZXXG7+13qvAXniK8AIOFWwuHYBdwCg+ibwEUPgw1cJLhDTE6hBzyBIVQycvX2TXps9eiW+I xLoMCRgVzfv+Xeq2Ojt5+O81uL/1wM3sRh9d6uCy1f01TNqbxoE2LV59jfd7fOKptuTWO8ZKA282IFBdiej7WTu5SYNjmK9E93Q2JPZaXNB9qS d8OVipSKA==




Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.facturax.com>

Página 1 de 1

R E C I B O			
OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		Nº DE CONTRATO: FH-04-19	
LOCALIDAD: EJ. JESUS RAMIREZ	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)	
DOMICILIO: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760 COL. GPE. MAINERO CD. VICTORIA, TAM.		11 DE JUNIO DEL 2019	
R.F.C. VASA521020A12		IMP. DEL CONTRATO	BUENO POR:
		\$ 322,307.10	\$ 322,307.10
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		FECHAS DE EJECUCION	
(TRESCIENTOS VEINTE MIL, SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		PLAZO DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019	
TRABAJOS DE:		OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	
1 (UNICA)		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	
ANTIPOIS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D E D U C C I O N E S			
0.10% RETENCION	\$ 277.85		
0.50% SECODAM:	\$ 1,389.25		
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 1,667.12		
AVANCES		PENAL CONVENCIONAL	
FISICO	100%	ACUM. ANTERIOR	
PROGRAMADO %	100%	ACTUAL	
ESTIMADO %	100%	DEVOLUCION	
POR APLICAR		SALDO DE ASIGNACION	
		\$0.00	
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ	
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANO OBRAS Y SERVICIOS	
		C. MARTIN CASULLO TORRES	
		SECRETARIO MUNICIPAL	
		AYUNTAMIENTO 2018 - 2021	
		OBRAS PÚBLICAS	
		LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA	
		CONTRALOR	
		CONTRALORIA MUNICIPAL	
		2018 - 2021	

OPERADO
TOTAL DEDUCCIONES: \$ 1,667.12
NETO PAGAR: \$ 320,640.00



ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.				ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1				
LOCALIDAD: EJ. JESUS RAMIREZ		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		Nº DE CONTRATO: FH-04-19		
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				PLAZO DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019				
META: 9728.50 M2				FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	V O L U M E N			IMPORTE (\$)
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	
1	PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS.. DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESDADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	22.75	9,728.50	0.00	9,728.50	0.00	\$ 221,323.38
2	SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONAMIENTO Y MOTOCONFORMACION PARA LA FORMACION DE LA RASANTE DESEADA, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	58.10513	972.85	0.00	972.85	0.00	\$ 56,527.58
								\$ 277,850.95
								\$ 277,850.95
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA				
CONTRATISTA				SUPERVISOR				

OPERADO
HIDROCARBUROS 019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADOR

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
HOJA: 1 DE 1

OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

Nº DE CONTRATO: FH-04-19

RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

LOCALIDAD: EJ. JESUS RAMIREZ

PLAZO DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019

META: 9728.50 M2

EJE	DE	A	LONGITUD	ANCHO	AREA	MOTOCONFORMACION DE TERRACERIAS	REVESTIMIENTO DE 10 CMS.
1	A	C	98.00	7.50	735.00	735.00	73.50
1	D	F	222.00	9.50	2109.00	2109.00	210.90
2	A	E	303.00	5.50	1666.50	1666.50	166.65
3	A	C	158.00	5.50	869.00	869.00	86.90
4	A	B	87.00	5.00	435.00	435.00	43.50
A	2	4	130.00	5.50	715.00	715.00	71.50
B	1	4	210.00	9.00	1890.00	1890.00	189.00
C	2	3	64.00	5.50	352.00	352.00	35.20
D	1	2	87.00	5.50	478.50	478.50	47.85
E	1	2	87.00	5.50	478.50	478.50	47.85
					9728.50	9728.50	972.85

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

OPERADO

HIDROCARBUROS 019

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
HOJA: 1 DE 1

LOCALIDAD: EJ. JESUS RAMIREZ

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

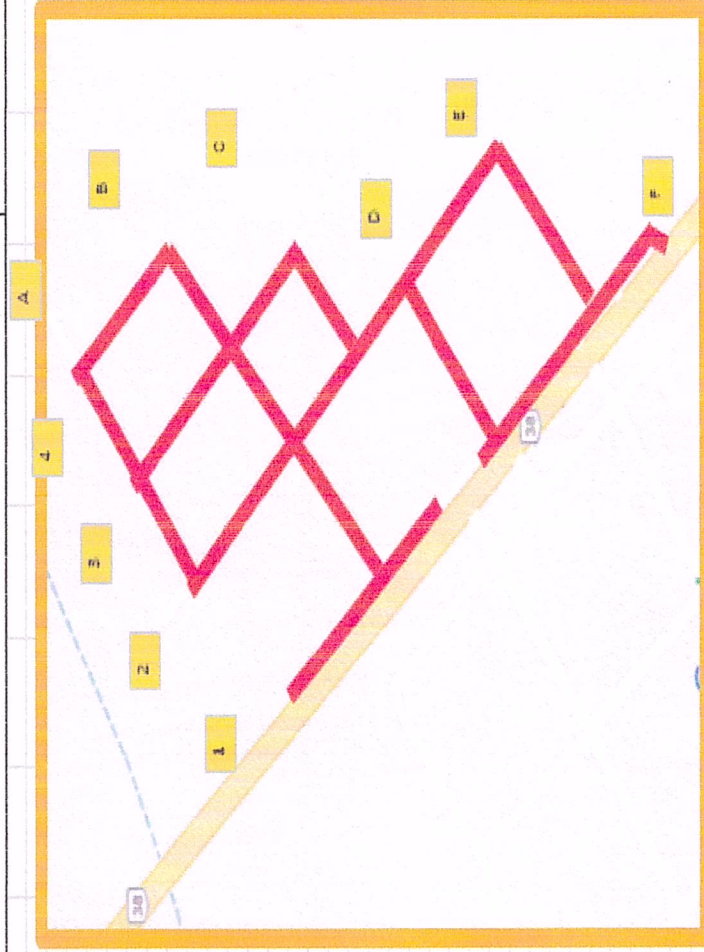
Nº DE CONTRATO: FH-04-19

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

PLAZO DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019

META: 9728.50 M2

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019



ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

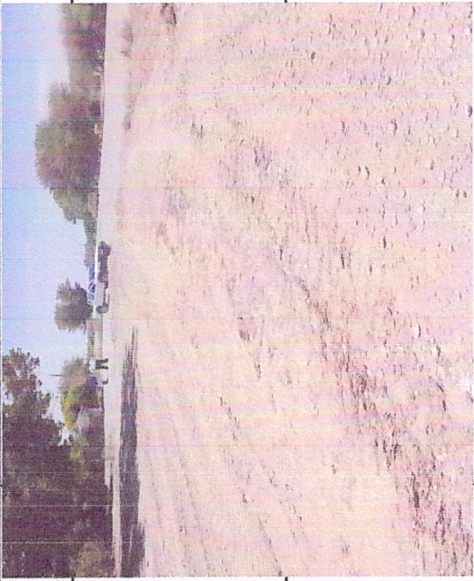
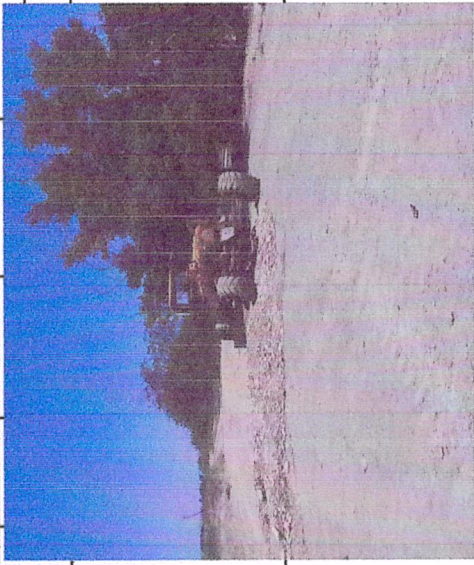
CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

LORENZO A. ALVAREZ
SUPERVISOR

OPERACIÓN
HIDROCARBUROS 2019

FOTOGRAFIA

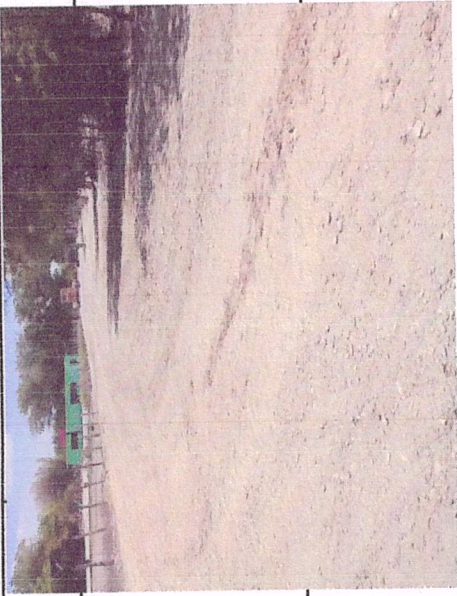
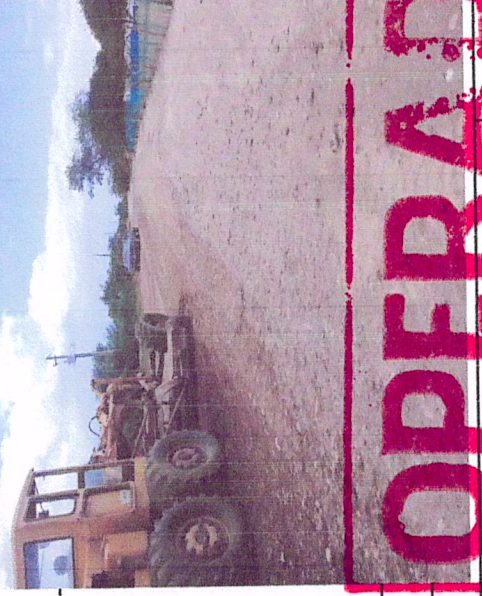
OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: EJ. JESUS RAMIREZ	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Nº DE CONTRATO: FH-04-19	
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		PLAZO DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019	FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019	
META: 9728.50 M2				
				
				
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ  CONTRATISTA		ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA  SUPERVISOR		

OPERADO
HIDROCARBUROS 019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FOTOGRAFIA

OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: EJ. JESUS RAMIREZ	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	Nº DE CONTRATO: FH-04-19
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		PLAZO DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019
META: 9728.50 M2		FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019
  		
  		
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ CONTRATISTA		ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR

OPERADO

HIDROCARBUROS 2019



ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Siendo las 6:00 hrs. del día del mes de del 2019, reunidos en la localidad de Ramirez del Municipio de Abasolo del Estado de Tamps., los CC. , Representante de la Delegación de la SEDESOL, el , Representante de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), y , Representante del Comité de Participación Social FISMDF, e integrantes de los Comités de Participación Social FISMDF, procediendo a la Capacitación en Materia de Participación Social, bajo el siguiente: Temario

1) Definición, objetivo y acciones de la Participación Social FISMDF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISMDF y sus funciones; 3) Características del Programa; 4) Funciones y Responsabilidades del Comité de Participación Social FISMDF; 5) Medios institucionales para presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigilancia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Olivia Soledad Guerrero S.	Presidente	Olivia Soledad Guerrero Santillanes
Octavia Zuniga Ramirez	Tesoroero	Octavia Zuniga R.
Martha Alicia Montez Zuniga	Secretario	Martha Alicia Mtz Z.
Sanjuana Amador Abregón	1º vocal	Sanjuana Amador A.
M.A Guadalupe Hernandez Mesa	2º vocal	Ma Goe Hdz M
Guillermo Hernandez Mesa	3º vocal	Guillermo Hdz M

☒ Mujeres Capacitadas: ☒ Hombres Capacitados: () Sub Total: ()
 Otras Beneficiarias Capacitadas: () Otros Beneficiarios Capacitados: () Sub Total: ()
TOTAL: ()

Ramo: 33 Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Sub Programa: (S12. PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES)
☒ Obra () Servicio () Acción: Rehabilitación de Tenaceras en
Diversas Calles en el Ed. Modelo en el
Municipio de Abasolo, Tamps.
 Ubicación:
 Localidad: Jesús Ramirez. Municipio: Abasolo.
 Monto: # (\$XXX)
 Tipos de Apoyo: ☒ Federal () Estatal () Municipal () Beneficiarios

C. MARTIN CASTILLO TORRES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS
2018 - 2021

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL
2018 - 2021

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



OPERANDO
HIDROCARBUROS



Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Reynaldo Lucio Perez,	Rehabilitación de Terracerías.	4º Vocal	Ed. Jesus Ramirez	Reynaldo Lucio Perez
Leonardo Martinez Ortega,	= "	5º Vocal	=	Leonardo Martinez Ortega
Maria Mercedes Lopez Martinez,	= "	6º Vocal	=	Maria Mercedes Lopez
Felimon Ramirez Lopez,	= "	7º Vocal	=	Felimon Ramirez Lopez
Rogelio Perez Garcia,	= "	8º Vocal	=	Rogelio Perez Garcia
Ma Silbestroan Guzman Garcia	= "	9º Vocal	=	Ma Silbestroan Guzman
Hortencia Hernandez Hernandez,	= "	10º Vocal	=	Hortencia Hernandez
Ruben Ramirez Zavala,	= "	11º Vocal	=	Ruben Ramirez
Karla Wanda Perez Guzman,	= "	12º Vocal	=	Karla Wanda Perez
Rogelio Perez Guzman	= "	13º Vocal	=	Rogelio Perez G.

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: FH-04-19

FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

DOMICILIO FISCAL: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 COL. MAINERO CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P. 87100

R.F.C.: VASA521020A12

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL 12 DÍA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO Y EL **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.


UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-04-19**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **11** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALES ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.





**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-04-19**



PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	9,728.50
SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES,ACAMELLONAMIENTO Y MOTOCONFORMACION PARA LA FORMACION DE LA RASANTE DESEADA, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	972.85

III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. FH-04-2019 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 322,307.10 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 10/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-04-19**



IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **30 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2019 AL 8 DE JUNIO DEL 2019.


SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **11 DE JUNIO DEL 2019**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **33 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	10 DE MAYO DEL 2019 AL 8 DE JUNIO DEL 2019	\$277,850.95	0.00	0.00	\$1,667.12	A1 327

RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$322,307.10	0.00	0.00



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021
Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-04-19**

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE “**LA CONTRATISTA**” Y A FAVOR DE “**LA CONTRATANTE**” DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE “**LA CONTRATANTE**” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE “**LA CONTRATISTA ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 11 DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

OPERADO
HIDROCAREBUROS 2019




**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-04-19**




ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OPERADO
FIN DEL ACTA
HIDROCARBUROS 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FH/04/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA FH-04-19.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **11 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID RAMIREZ GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** SUBDIRECTOR DE **INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

OBLIGACIONES CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 10 DE MAYO DEL 2019 AL 8 DE JUNIO DEL 2019





PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	9,728.50
SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES,ACAMELLONAMIENTO Y MOTOCONFORMACION PARA LA FORMACION DE LA RASANTE DESEADA, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	972.85

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 10 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2019.

OPERADO
MEPCREBUROS 2019



EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPOS.

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.

Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS				

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente al **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ.** mediante oficio sin número de fecha 8 DE MAYO DEL 2019.

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. **FH-04-2019**

REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.



Palacio Municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021






FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EFRAÍN GONZÁLEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-----**FIN DEL ACTA**-----

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. JESUS RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATO DE OBRA N.º: FH/04/19

PLAZO DE EJECUCION: 10 DE MAYO DEL 2019 AL 8 DE JUNIO DEL 2019.

BITACORA DE OBRA

10/Mayo	Iniciamos los trabajos con la motoconformadora quitando en todas las calles la parte contaminada y retirando del lugar.
15/Mayo	Se continuaron los trabajos de limpieza con la moto y una retro y camión para retirar material contaminado.
18/Mayo	Se procedio a la recuperación de la corona y cunetes para mejorar los pendientes.
25/Mayo	Incorporación de agua y compactación con rodilla para firmeza a la calle.
30/Mayo	Se continua con la incorporación de humedad a la compactación.
08/Junio	Se concluyeron los trabajos.

LIC: LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

~~OBRAS PUBLICAS:~~

ING. ARMANDO DAVID VANDOE SANCHEZ

~~CONTRATISTA:~~
