



REFERENCE

R E C I B O		Nº DE CONTRATO: IS-05-19	
OBRA :CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)	
LOCALIDAD: 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES		RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
CONTRATISTA: C. BRYAN RENDON FERNANDEZ			
DOMICILIO:EJERC. LIBERT. DE TAM. #310 COL. LINDA VISTA, en Ciudad Victoria, Tam.		FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2019	
R.F.C.		BUENO POR:	
REFB9204158PS		\$ 807,247.53	
RECIBI DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		FECHAS DE EJECUCION	
(OCHOCIENTOS TRES MIL ,SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)		DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019	
TRABAJOS DE:		OBRA :CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	
1 (UNICA)		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	
ANTICIPOS		MONTO ASIGNADO \$ 807,247.53	
IMPORTE		PAGOS ANTERIORES	
AMORTIZACION ANTERIOR		SUB-TOTAL \$ 807,247.53	
SUBTOTAL			
ESTA ESTIMACION		IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 695,903.04	
SALDO POR AMORTIZAR		AMORTIZACION DE ANTICIPO	
		SUB-TOTAL \$ 695,903.04	
		I.V.A. \$ 111,344.49	
		TOTAL \$ 807,247.53	
DEDUCCIONES			
0.10% RETENCION		\$ 695.90	
0.50% SECODAM:		\$ 3,479.52	
TOTAL DE DEDUCCIONES		\$ 4,175.42	
AVANCES		PENAL CONVENCIONAL	
FISICO		ACUM. ANTERIOR	
PROGRAMADO %		ACTUAL	
ESTIMADO %		DEVOLUCION	
		POR APLICAR	
C. BRYAN RENDON FERNANDEZ		C. HOMERO CONDE DOMINGUEZ	
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
		LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCOBAR	
		SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	
		CONTADOR MUNICIPAL	
		2018 - 2021	

ESTIMACION

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.												ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: NCP. DOLORE Y CABECERA MUNICIPAL		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL		Nº DE CONTRATO: IS-05-19		DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019					
CONTRATISTA: C. BRYAN RENDON FERNANDEZ													
META 7 CUARTOS DORMITORIO													
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	V O L U M E N		ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE (\$)			
						PRESENTE							
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	\$17.60	120.56	0.00	120.56		120.56	0.00	\$	2,121.81		
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	M2	\$1,815.00	28.00	0.00	28.00		28.00	0.00	\$	50,820.00		
3	CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	\$395.00	207.20	0.00	207.20		207.20	0.00	\$	81,844.00		
4	MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$364.80	223.16	0.00	223.16		223.16	0.00	\$	81,408.77		
5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	\$485.15	112.00	0.00	112.00		112.00	0.00	\$	54,336.80		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$438.95	103.76	0.00	103.76		103.76	0.00	\$	45,544.35		
7	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$1,339.60	144.92	0.00	144.92		144.92	0.00	\$	194,131.48		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$190.10	700.86	0.00	700.86		700.86	0.00	\$	133,233.01		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	\$3,262.90	7.00	0.00	7.00		7.00	0.00	\$	22,840.30		
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	\$2,515.80	7.00	0.00	7.00		7.00	0.00	\$	17,610.60		
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO,CABLE THW/ CAL 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	\$1,715.99	7.00	0.00	7.00		7.00	0.00	\$	12,011.92		
										SUBTOTAL	\$ 695,903.04		
C. BRYAN RENDON FERNANDEZ												ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA	
CONTRATISTA												SUPERVISOR	

GENERADOR

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)

HOJA: 1 DE 1

LOCALIDAD: NCP. DOLORES, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Nº DE CONTRATO: IS-05-19

CONTRATISTA: C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019

META 7 CUARTOS DORMITORIO

FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2019

CONCEPTOS

		ANCHO	LARGO	PZAS.	AREA	UNIDAD	CANTIDAD	CUARTOS	TOT
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	4.15	4.15	1.00	17.2225	M2	1.00	17.22	120.56
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	0.2	0.60	4.00					
		0.4	0.20	4.00		PZA	4.00	4.00	28.00
3	CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA		4.00	4.00		ML	16.00		
			2.50	4.00		ML	13.60	29.60	207.20
4	MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.		3.85	4.00	35.42	M2	35.42		
			2.10		2.10	M2	2.10	31.88	223.16
			1.20		1.44	M2	1.44		
5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		4.00	4.00	1.00	ML	16.00	7.00	112.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.		3.85	1.00	14.8225	M2	14.82	14.82	103.7575
7	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		4.55	1.00	20.7025	M2	20.70	20.70	144.9175

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Supervisor

GENERADOR

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: NCP. DOLORES Y CABECERA MUNICIPAL			MUNICIPIO: ABASOLO, TAM			RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL			Nº DE CONTRATO: IS-05-19		
CONTRATISTA: C. BRYAN RENDON FERNANDEZ						PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019					
META 7 CUARTOS DORMITORIO						FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2019					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	V O L U M E N PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE (\$)		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	MUROS EXTERIOR MURO INTERIOR LOSA INTERIOR LOSA EXTERIOR PERALTE	4.15 3.85 3.85 4.15 4.55 0.10	2.50 2.50 3.85 0.20 0.20 4.55	4.00 4.00 1.00 2.00 2.00 4.00	41.50 38.50 14.82 1.66 1.82 1.82					
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO					100.12	M2	100.12	7.00	700.8575	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO				1.00	1.00	PZA.	1.00	1.00	7.00	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS, CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."				2.00	2.00	PZA	2.00	2.00	7.00	
										\$	

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ
COMPRANTISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
10-04-20 A. Alvarez.
SUPERVISOR

CROQUIS

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
HOJA: 1 DE 1

LOCALIDAD: NCP. DOLORES Y CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Nº DE CONTRATO: IS-05-19

CONTRATISTA: C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019

META 7 CUARTOS DORMITORIO

FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2019

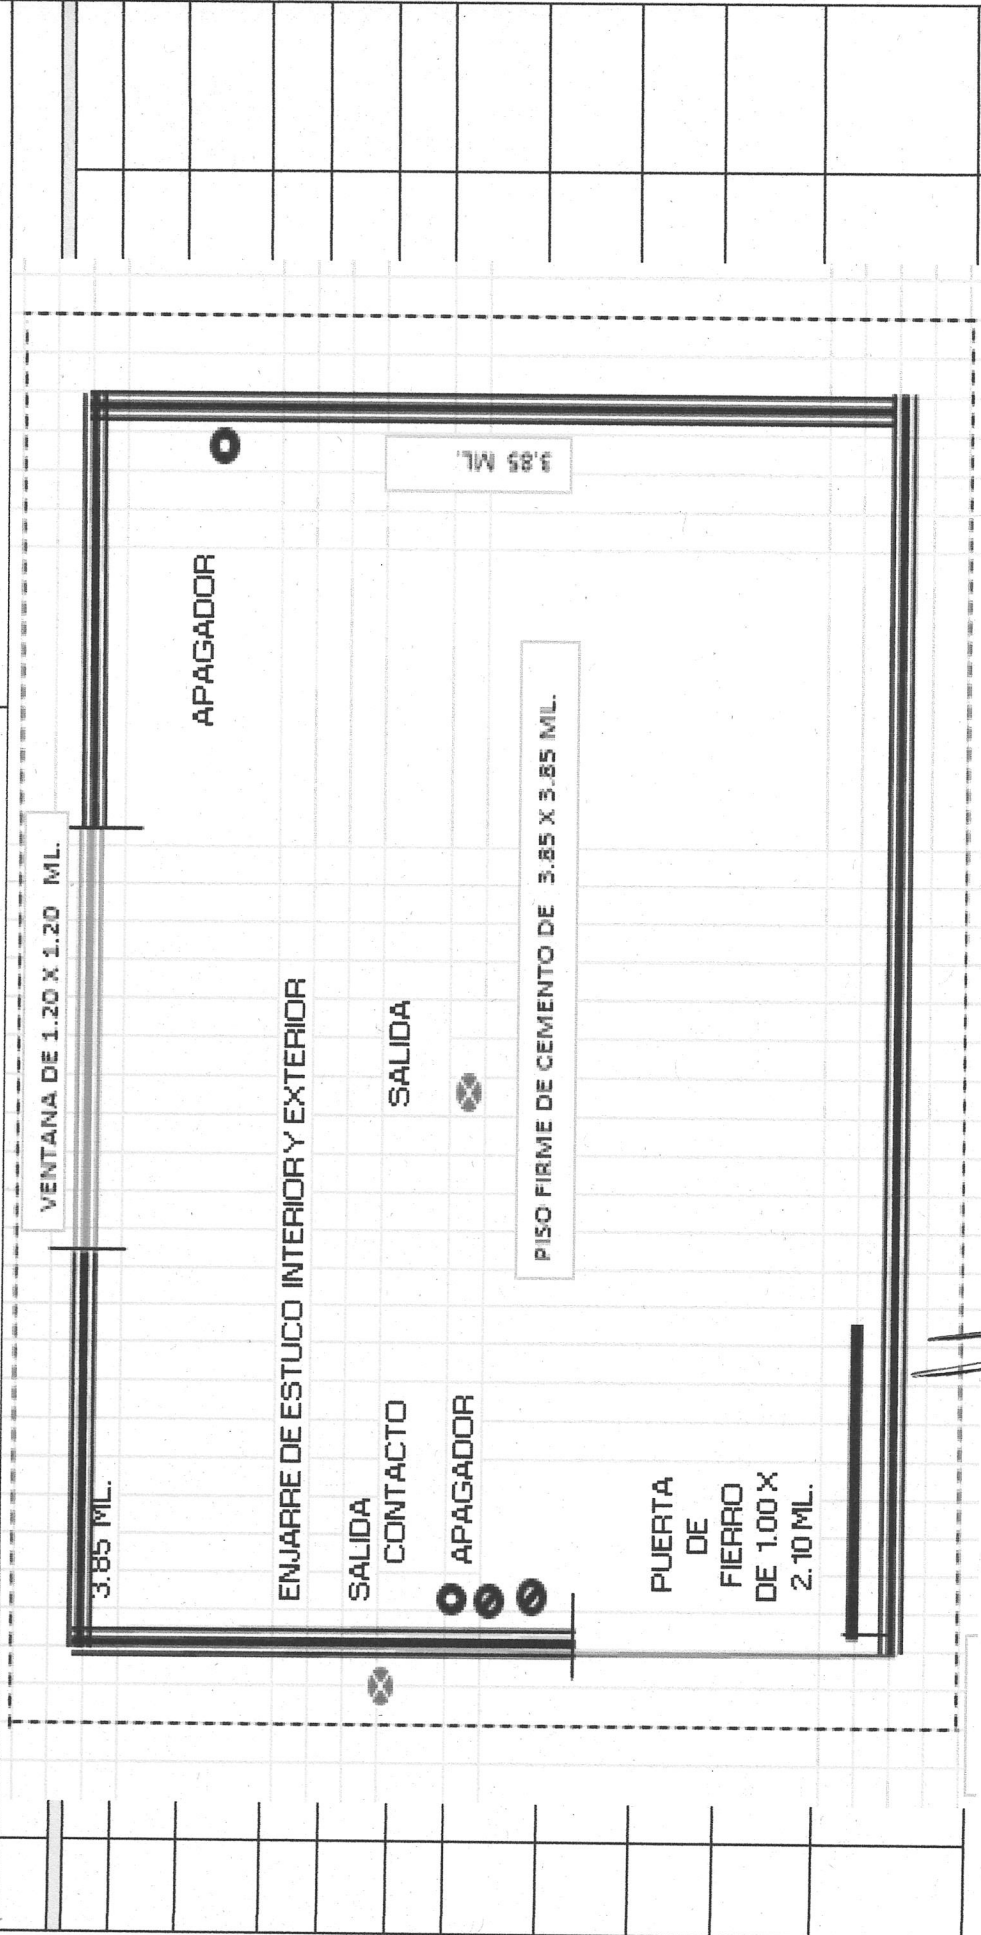

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

CROQUIS

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
HOJA: 1 DE 1

LOCALIDAD: NCP. DOLORES Y CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Nº DE CONTRATO: IS-05-19

CONTRATISTA: C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019

META 7 CUARTOS DORMITORIO

FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2019

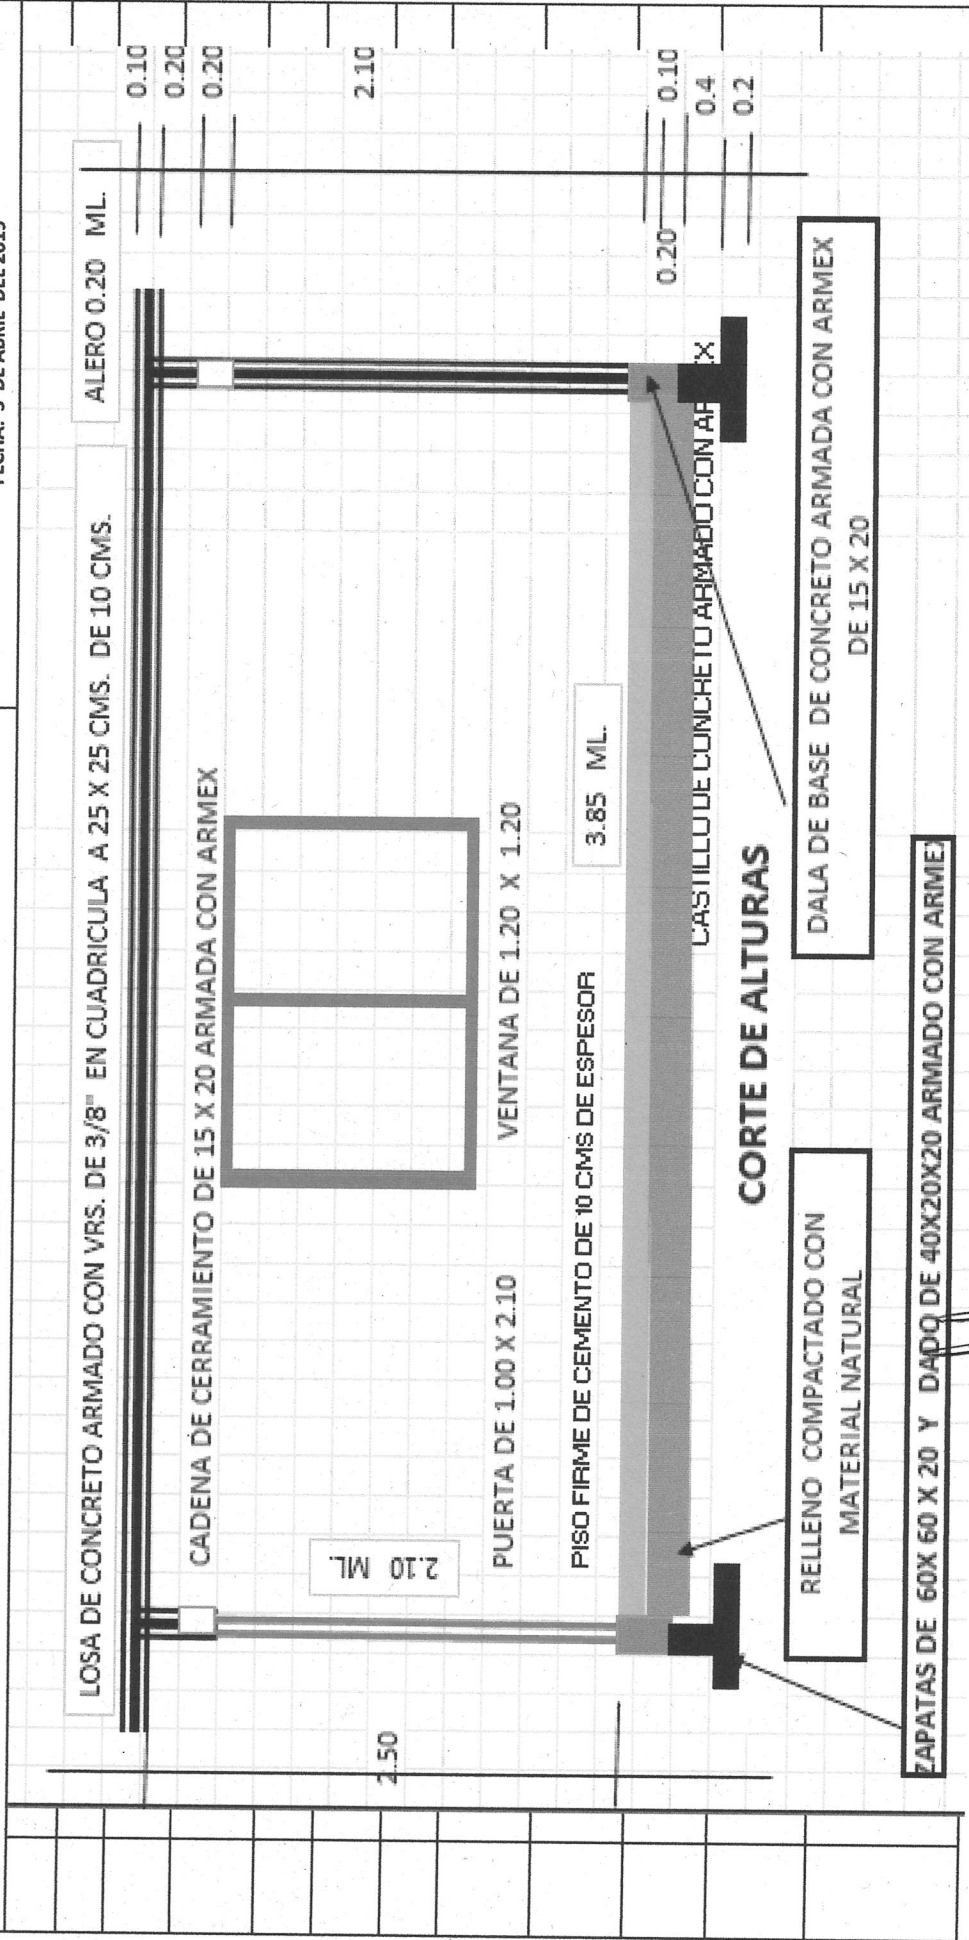










C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR





















10 MAR 2019

 		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM. ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
FOTOGRAFIA		GENERADOR Nº: 1 (UNICO)	
CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP.		Nº DE CONTRATO: IS-05-19	
MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2019	
C. BRYAN RENDON FERNANDEZ		PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
C. BRYAN RENDON FERNANDEZ		ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA	
CONTRATISTA		SUPERVISOR	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



FOTOGRAFIA										GENERADOR Nº: 1 (UNICO)	
CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.											
5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES				MUNICIPIO: ABASOLO, TAM				Nº DE CONTRATO: IS-05-19		PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: DEL 1 DE MARZO AL 10 ABRIL DEL 2019	
C. BRYAN RENDON FERNANDEZ				FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2019							
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: IS-05-19

FECHA: 8 DE ABRIL DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 1 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

DOMICILIO FISCAL: EJERCITO LIBERTADOR DE TAMAULIPAS NO. 310 ENTRE PEDRO RUIZ MOLINA Y CALLE POSTERIOR: MANUEL ESCANDON: COLONIA: LINDA VISTA, CD. VICTORIA, TAM. C.P. 87086


R.F.C.: REFB9204158P5

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO Y EL BRYAN RENDON FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:


BRYAN RENDON FERNANDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA.
PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO

**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-05-19**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **5** DEL MES DE **ABRIL** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. LIC. **EFRAIN GONZALES ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, LIC. **LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **C. BRYAN RENDON FERNANDEZ** LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.



ACTA FINIQUITO DE OBRA CONTRATO No. IS-05-19



LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	120.56
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	M2	28.00
CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	207.20
MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	223.16
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	112.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	103.76
LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	144.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	700.86
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	7.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FUO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	7.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS, CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	7.00



ACTA FINIQUITO DE OBRA CONTRATO No. IS-05-19



III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. IS-05-2019, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 807,247.53 (OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 41 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 DE MARZO DEL 2019 AL 10 DE ABRIL DEL 2019.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 5 DE ABRIL DEL 2019, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 39 (DIAS.) CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	1 DE MARZO DEL 2019 AL 10 DE ABRIL DEL 2019	\$695,903.04	0.00	0.00	\$4,175.42	25



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-05-19**



RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 807,247.53	0.00	0.00

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE “**LA CONTRATISTA**” Y A FAVOR DE “**LA CONTRATANTE**” DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE “**LA CONTRATANTE**” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE “**LA CONTRATISTA C. BRYAN RENDON FERNANDEZ**.” MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **5 DE ABRIL** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-05-19**



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA




C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS



LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIN DEL ACTA

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **IS/05/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA IS-05-19.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **5 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID RAMIREZ GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** SUBDIRECTOR DE **INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **C. BRYAN RENDON FERNANDEZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

OBLIGACIONES CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 1 DE MARZO DEL 2019 AL 10 DE ABRIL DEL 2019

ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. IS-05-19

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	120.56
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	M2	28.00
CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	207.20
MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	223.16
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	112.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	103.76
LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	144.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	700.86
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2,10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	7.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	7.00

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 41 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2018.

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPOS.

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.

Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS				

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente al C. BRYAN RENDON FERNANDEZ mediante oficio sin número de fecha 5 DE ABRIL DEL 2019.

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.


TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. IS-05-2019

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 DE 16 M2 CADA UNO 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP. DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA




C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA


PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS



LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIN DEL ACTA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN EL NCP.
DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATO DE OBRA N.º : IS/05/19

PLAZO DE EJECUCION: 1 DE MARZO DEL 2019 AL 10 DE ABRIL DEL 2019.

BITACORA DE OBRA

01/mar	Iniciamos con limpieza Trazo y nivelacion.
04/mar	Realizamos ESCUACION de zapatas.
08/mar	Continuamos con cadenas de Base cimbra y Decimbro Continuamos con pegado de Block.
12/mar	Colado de piso Firme
14/mar	Colocacion de Armado con varilla Inoxye Cimbra y Desimbra, Armado y colado y mano de obra.
22/mar	Colocacion de Estuco Blanco.
26/mar	Instalacion de puerta y ventanas.
29/mar	Instalacion Electrica.
03/Abril	Asi Terminamos la Obra.

LIC: LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

OBRAS PUBLICAS:

BRAYAN RENDON FERNANDEZ

CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE
ABASOLO



Tam
TAMAULIPAS



Fecha de instalación: (19/03/19)

Nombre del funcionario municipal

Cargo del funcionario municipal

P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, de igual forma me permito invitarle el día 19 del mes de Marzo del año en curso, a la instalación del Comité de Participación Social FISMDF, el cual fungirá como un espacio para recibir y atender las demandas de los ciudadanos respecto de las obras de infraestructura social básica que requiera el municipio y que estén contenidas en el Catálogo de obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal conforme a la normativa vigente.

Nota: Se anexa calendario de programación de Formación de Comité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


Yesika Yanet Selvera Garza
Presidente municipal



HOMERO CONDE RODRIGUEZ
Director de Obras Públicas



ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Siendo las 6:00 hrs. del día 19 del mes de Marzo del 2019, reunidos en la localidad de Abasolo del Municipio de Abasolo del Estado de Tamps., los CC. _____, Representante de la Delegación de la SEDESOL, el _____, Representante de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), y _____, Representante del Comité de Participación Social FISMDF, e integrantes de los Comités de Participación Social FISMDF, procediendo a la Capacitación en Materia de Participación Social, bajo el siguiente: Temario

- 1) Definición, objetivo y acciones de la Participación Social FISMDF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISMDF y sus funciones; 3) Características del Programa; 4) Funciones y Responsabilidades del Comité de Participación Social FISMDF; 5) Medios institucionales para presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigilancia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<u>Maria Luisa Sanchez Rodriguez</u>	<u>Presidente</u>	<u>Leiba S.</u>
<u>Udales Conel Ricardo</u>	<u>Tesoro</u>	<u>Ricardo Udales Conel</u>
<u>Conilo Daran Martha Alicia Udales</u>	<u>Secretario</u>	<u>Martha Alicia U. Conilo Daran</u>
<u>Garcia Yanes Maria</u>	<u>1. Vocal</u>	
<u>Martinez Udales Maubol</u>	<u>2. Vocal</u>	
<u>Zetecaga Oez Udales</u>	<u>3. Vocal</u>	

☒ Mujeres Capacitadas: ☒ Hombres Capacitados: ☐ Sub Total: ☐
☐ Otras Beneficiarias Capacitadas: ☐ Otros Beneficiarios Capacitados: ☐ Sub Total: ☐
TOTAL: ☐

Ramo: 33 Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Sub Programa: (S12. PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES)

() Obra () Servicio () Acción: Construcción de 700 Cordones Delineadores de 4x4 de 6mz Cada uno 5 en la cabecera municipal y 2 en el lcp. Dolores del Monapo de Abasolo Tamps.

Ubicación:

Localidad: Cabecera municipal. Municipio: Abasolo

Monto: # 807,247.52 (\$XXX)

Tipos de Apoyo: ☒ Federal () ☒ Municipal () ☐ Beneficiaria

C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2018-2021

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

LIC. EFRAIN GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



Anexo 2.2. Formato de invitación a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: 19 Marzo 2019

(C.


Vecinos del Municipio de E. Dabreg

Presentes

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, en referencia a las obras que se financiarán con los recursos del FISMDF, para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a la Capacitación en Materia de Participación Social FISMDF, para el seguimiento de Obras programadas para el ejercicio fiscal 2019; la cita es el próximo 19 marzo del año en curso, a las 10:00, en las instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal de Abasolo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Yesika Yanet Selvera Garza

Presidente municipal


HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Director de Obras Públicas



Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF


[illegible]



Anexo 3. Formato para registrar las actividades desarrolladas por los Comités de Participación Social FISMDF

Actividades desarrolladas por el Comité de Participación Social FISMDF del Municipio de

No. de obras revisadas:	Construccion de 7 Cordos Dormitorios de 4x4
No. obras directas:	Construccion de 7 Cordos
No. obras complementarias:	Construccion de 7 Cordos.
Monto FISMDF revisado:	
Monto FISMDF en proyectos directos:	807,247.03
Monto FISMDF en proyectos complementarios:	807,247.03
No. de integrantes del comité:	#7
Actividades desarrolladas por los integrantes del Comité:	


Yesika Yanet Selvera Garza
Presidente Municipal


HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Director de obras



Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los Comités de participación social

Fecha de la Interposición:			Ejercicio:	
QUEJA	DENUNCIA	SUGERENCIA	NO. REGISTRO:	
X			01	

NOMBRE DE LA QUEJA, DENUNCIA Y/O SUGERENCIA

--

DATOS DE LA OBRA

Ubicación o dirección:		
Localidad: Abasolo	Municipio: Abasolo	Estado: Tamaulipas

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROMOVENTE

Anónimo: _____	
Nombre Completo: _____	
Sexo: _____	Edad: _____
Ocupación: _____	Escolaridad: _____
Teléfono: _____	
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.	
Si la queja, denuncia y/o sugerencia es de un Servidor Público, anotar nombre, dependencia, cargo	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
Fecha	Nombre y Firma de quien recibe la queja, denuncia y/o sugerencia
Acuse de recibo	
Fecha	Nombre y Firma
