



E X P E D I E N T E T E C N I C O

OBRA No.
IS-09-19

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO
GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

MUNICIPIO: ABASOLO

LOCALIDAD: EJIDO GUADALUPE VICTORIA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: VIVIENDA

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO

II.- TIPO DE OBRA:

NUEVA (X) EN PROCESO () AMPLIACION () REHABILITACION () COMPLEMENTARIA ()

III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

— CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA,
— MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

IV.- COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$579,287.66 (PESOS)

V.- ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS):

FEDERAL	\$	
ESTATAL	\$	
MUNICIPAL	\$	\$579,287.66
BENEFICIARIOS	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
SUMA	\$	\$579,287.66

VI.- RECURSOS LIBERADOS:

1a MINISTRACION	\$		FECHA	
2a MINISTRACION	\$		FECHA	
3a MINISTRACION	\$		FECHA	
TOTAL	\$	\$579,287.66		

VII.- NUMERO DE BENEFICIARIOS: 20

VIII.- UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS TOTALES DEL PROYECTO: 5.00

IX.- FECHA DE INICIO: 1 DE MAYO DEL 2019 FECHA DE TERMINACION: 13 DE JUNIO DEL 2019

X.- AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 13 DE JUNIO DEL 2019: 100%

XI.- NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2019: 579

XII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: POR CONTRATO

M A C R O L O C A L I Z A C I O N
CROQUIS DE UBICACION DE LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA,
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

0

NORTE



M I C R O L O C A L I Z A C I O N
CROQUIS DE UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

0

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA,
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

NORTE



DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE
VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
EQUILIBRIO ECOLOGICO EN LA SECCION V
ARTICULO 28 , ESTA OBRA
NO REQUIERE DE DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL POR SU NATURALEZA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA PUBLICAS

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2018 - 2021

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA,
MUNICIPIO DE ABAZOLO, TAMAULIPAS.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

R. AYUNTAMIENTO



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMOM 2018 - 2021

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C. MARTIN CASTILLO TORRES

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



CONTRALOR

CONTRALOR
MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ


NOMBRE Y FIRMA

2018 - 2021

PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS

PLANTA ARQUITECTONICA


PLANO DE CUARTO DORMITORIO

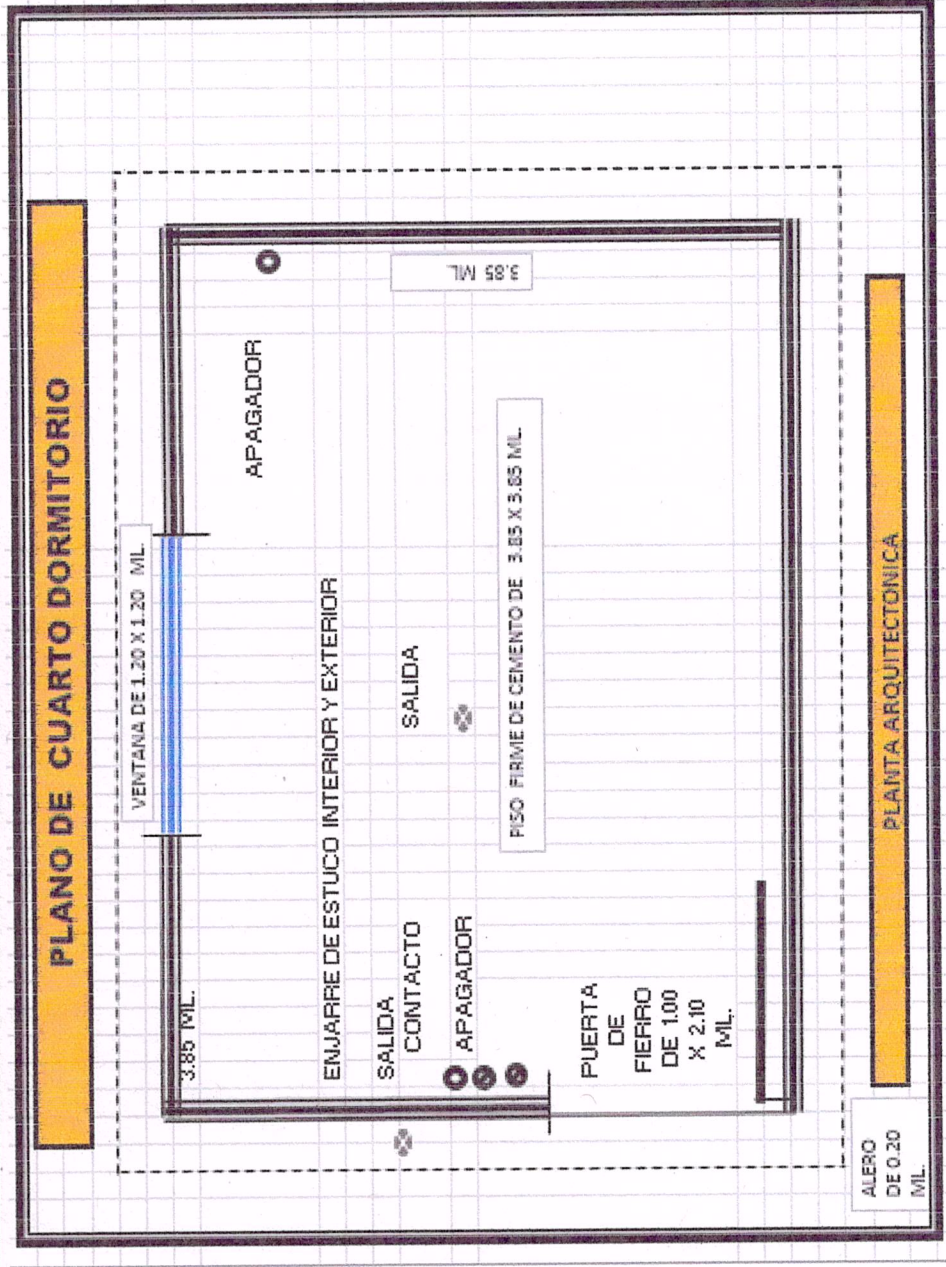

PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS


PLANTA DE CIMENTACION

4.15

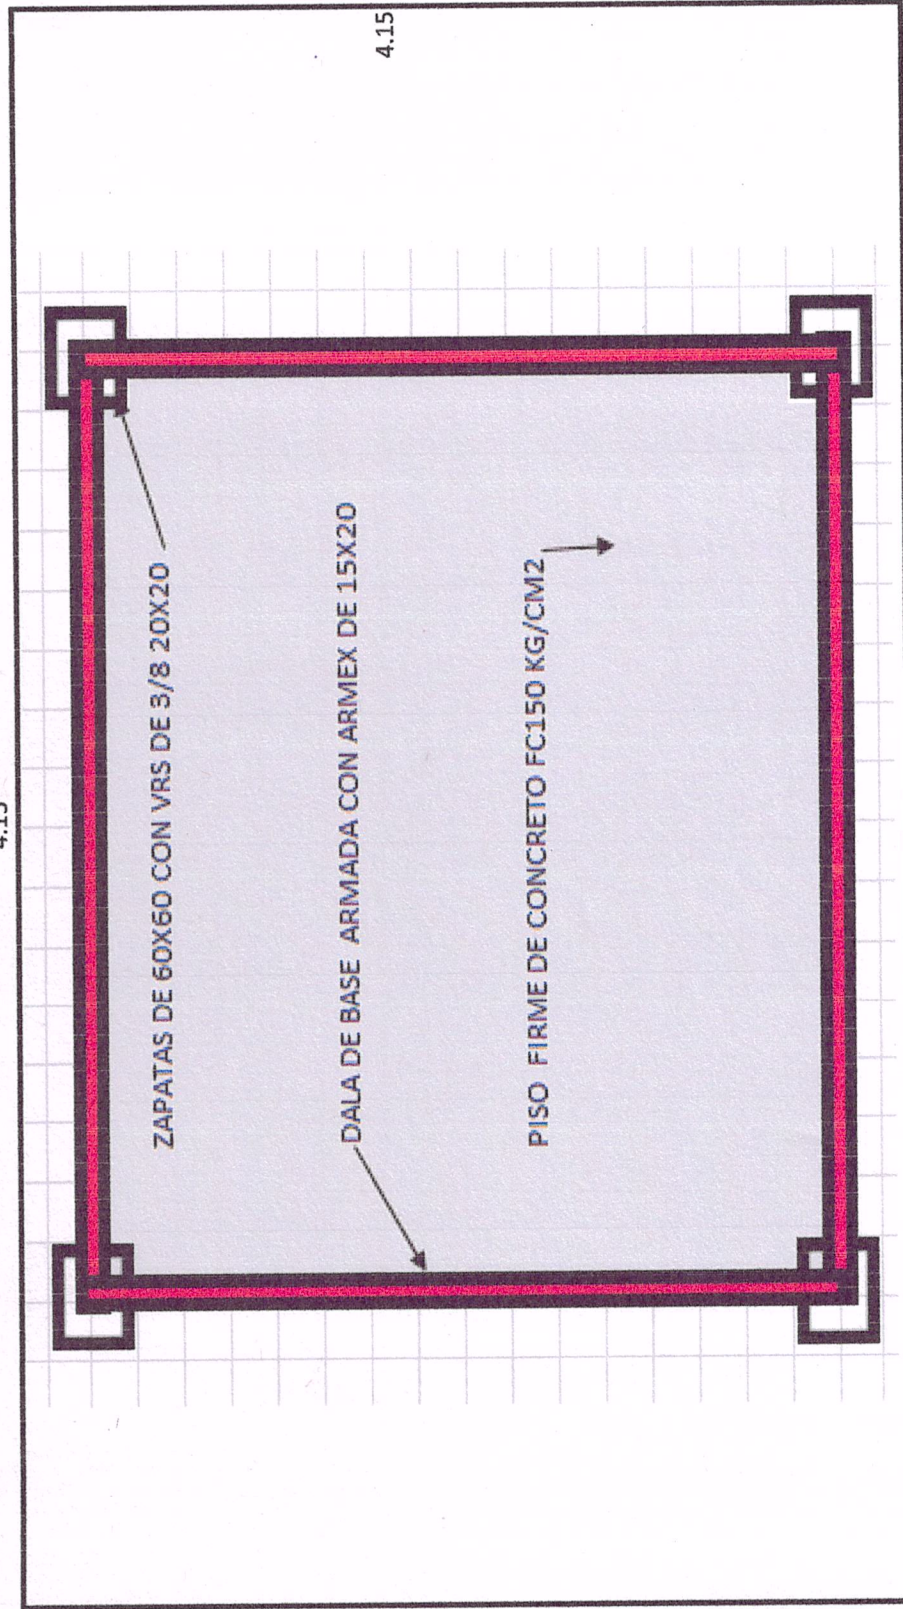

PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS

DETALLE DE ALTURAS

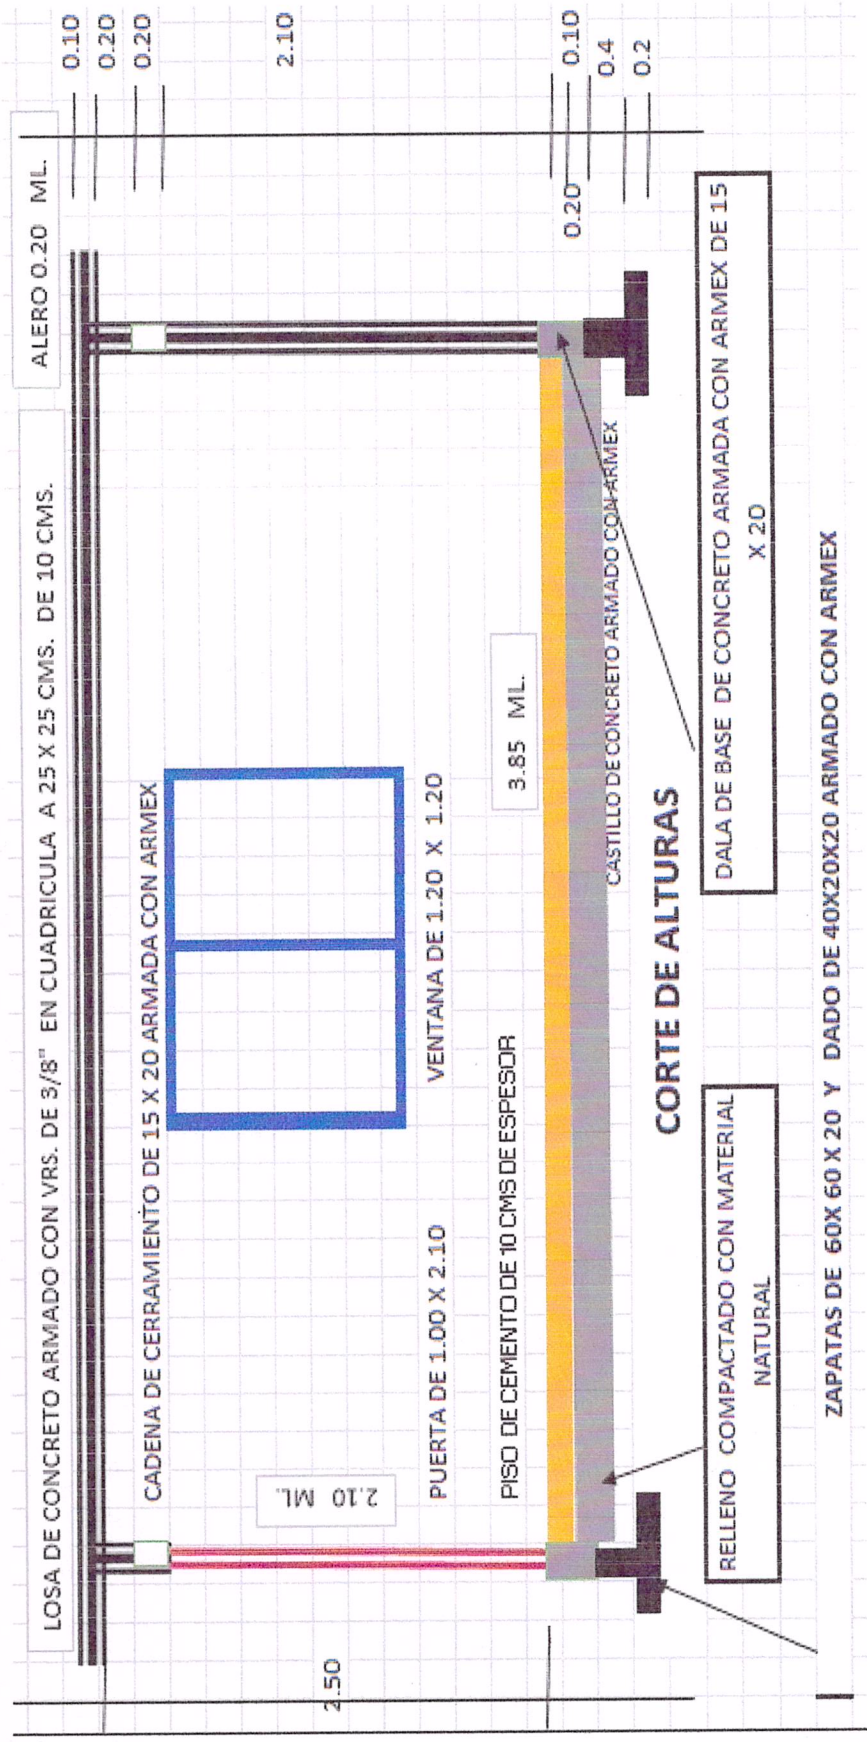

PRESUPUESTO BASE

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	86.11	\$17.15	\$1,476.83
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	M2	20.00	\$1,616.19	\$32,323.80
3	CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	148.00	\$396.01	\$58,609.48
4	MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	159.40	\$384.62	\$61,308.43
5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	80.00	\$474.12	\$37,929.60
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	74.11	\$439.56	\$32,576.89
7	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	103.51	\$1,296.82	\$134,237.08
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	500.61	\$189.64	\$94,936.15
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2,10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	\$3,263.40	\$16,317.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	\$2,516.23	\$12,581.15
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO,CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	10.00	\$1,708.95	\$17,089.50

\$	499,385.91
\$	79,901.75
\$	579,287.66

ELABORO

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO
PRESUPUESTOS

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOEMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ESTACA MAD	Estaca de madera de pino	pza	0,10000	\$ 4,10	\$ 0,41
CLAVO	Clavo de 2 1/2"	kg	0,00500	\$ 31,00	\$ 0,16
CAL HIDRA	Cal hidra	kg	0,01000	\$ 83,00	\$ 0,83
PINTVINCOMEX	Pintura vinil-acrilica	lto	0,00100	\$ 20,00	\$ 0,02
	Suma de Materiales				\$ 1,42
Mano de Obra					
CUAD.TOPOGRAFOS	(1 topografo + 2 cadeneros + cabo)	jor	0,00208	\$ 1.100,00	\$ 2,29
CUAD. 3 AYUDANTES	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0,00213	\$ 1.100,00	\$ 2,34
	Suma de Mano de Obra				\$ 4,63
Equipo					
CARRETE DE HILO	CARRETE DE HILO	pza	0,00255	\$ 60,00	\$ 0,15
FLEXOMETRO	FLEXOMETRO	pza	0,0038	\$ 60,00	\$ 0,23
MARRO O MASO	MARRO	pza	0,00481	\$ 105,00	\$ 0,51
MACHETE	MACHETE	pza	0,00691	\$ 90,00	\$ 0,62
EQ TOP	Equipo de Topografía	hora	0,00900	\$ 550,00	\$ 4,95
VEHICULO	VEHICULO DE TRANSPORTE	hora	0,00084	\$ 1.130,00	\$ 0,94
	Suma de Equipo				\$ 7,40
	Costo Directo				\$ 13,44
	Indirectos			% 8,00	\$ 1,08
	Indirectos de Campo			% 8,00	\$ 1,08
	Subtotal				\$ 15,59
	Utilidad			% 10,00	\$ 1,56
	Subtotal				\$ 17,15
PRECIO UNITARIO					\$ 17,15
DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.					

(Handwritten signature)

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOEMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CONSTRUCCIONDE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO
CON ARMEX:

2

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ARMEX	ARMEX	pza	0,15000	\$ 105,00	\$ 15,75
VARILLA	VARILLA 3/8	pza	0,29000	\$ 132,00	\$ 38,28
	Suma de Materiales				\$ 54,03
Mano de Obra					
CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,35930	\$ 1.100,00	\$ 395,22
AD. 3 AYUDANTES	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0,45790	\$ 1.100,00	\$ 503,69
AD.FIERREROS	(1 oficial fierrero + 1 ayudante fierrero + cabo)	jor	0,28189	\$ 1.100,00	\$ 310,07
	Suma de Mano de Obra				\$ 1.208,99
Auxiliares					
PICO	PICO	pza	0,0259	\$ 230,00	\$ 5,96
PALA	PALA	pza	0,0259	\$ 145,00	\$ 3,76
CARRETILLA	CARRETILLA	pza	0,0159	\$ 1.000,00	\$ 15,90
SEGUETA	SEGUETA	pza	0,0259	\$ 120,00	\$ 3,11
CUBETA	CUBETA	pza	0,0399	\$ 35,00	\$ 1,40
REGLA	REGLA	pza	0,0299	\$ 120,00	\$ 3,59
CUCHARA	CUCHARA	pza	0,049	\$ 70,00	\$ 3,43
CONCRETO150	CONCRETO FC=150 KG/CM3	m2	0,119	\$ 1.250,00	\$ 148,75
					\$ 185,89
Costo Directo					\$ 1.266,61
Indirectos					% 8,00 \$ 101,33
Indirectos de Campo					% 8,00 \$ 101,33
Subtotal					\$ 1.469,26
Utilidad					% 10,00 \$ 146,93
Subtotal					\$ 1.616,19
PRECIO UNITARIO					\$ 1.616,19
UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.					

J. L. L. L.

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EIJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3

CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLO DE 15X15 CM CONCRETO F'C=150 KG/CMS CON ARMEX.
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

ARMEX	armex	ml	0,90000	\$ 145,00	\$ 130,50
AQUEMADO	Alambre quemado	kg	0,06000	\$ 27,00	\$ 1,62
Suma de Materiales					\$ 132,12

Mano de Obra

CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,05000	\$ 1.100,00	\$ 55,00
CUAD.FIERREROS	(1 oficial fierrero + 1 ayudante fierrero + cabo)	jor	0,01100	\$ 1.100,00	\$ 12,10

Suma de Mano de Obra

\$ 67,10

Auxiliares

CONCRETO150	Concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2	m3	0,03374	\$ 1.600,00	\$ 53,98
CIMBRACOMUN	Cimbra acabado comun	m2	0,03890	\$ 160,00	\$ 6,22
FLEXOMETRO	FLEXOMETRO	pza	0,03300	\$ 60,00	\$ 1,98
MARRO	MARRO	pza	0,03240	\$ 105,00	\$ 3,40
BOTES	BOTES	pza	0,05594	\$ 60,00	\$ 3,36
PLOMADA	PLOMADA	pza	0,01355	\$ 35,00	\$ 0,47
CUCHARA	CUCHARA	pza	0,12500	\$ 120,00	\$ 15,00
PALA	PALA	pza	0,12150	\$ 70,00	\$ 8,51
MARTILLO	MARTILLO	pza	0,12560	\$ 145,00	\$ 18,21

Suma de Auxiliares

\$ 111,13

Costo Directo		\$ 310,35
Indirectos	% 8,00	\$ 24,83
Indirectos de Campo	% 8,00	\$ 24,83
Subtotal		\$ 360,01
Utilidad	% 10,00	\$ 36,00
Subtotal		\$ 396,01

PRECIO UNITARIO

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

\$ 396,01

(Firma)

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EIJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4

MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

BLOCK15	Block de concreto de 15x20x40 cm.	pza	13,00000	\$ 10,00	\$ 130,00
---------	-----------------------------------	-----	----------	----------	-----------

Suma de Materiales

\$ 130,00

Mano de Obra

CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,06640	\$ 1.100,00	\$ 73,04
----------------	---	-----	---------	-------------	----------

Suma de Mano de Obra

\$ 73,04

Equipo

CANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	hora	0,08935	\$ 350,00	\$ 31,27
-----------	----------------------------	------	---------	-----------	----------

Suma de Equipo

\$ 31,27

Auxiliares

MORTERO C-A 1:4	Mortero relacion Cemento-Arena Prop. 1:4	m3	0,01600	\$ 1.600,00	\$ 25,60
PLOMADA	PLOMADA	pza	0,05600	\$ 120,00	\$ 6,72
NIVEL	NIVEL	pza	0,12590	\$ 120,00	\$ 15,11
CUCHARA	CUCHARA	pza	0,13390	\$ 70,00	\$ 9,37
BOTE	BOTE	pza	0,22990	\$ 35,00	\$ 8,05
PALA	PALA	pza	0,01290	\$ 145,00	\$ 1,87
AGUA	AGUA	pza	0,03290	\$ 12,00	\$ 0,39

Suma de Auxiliares

\$ 67,11

Costo Directo

\$ 301,43

Indirectos

% 8,00 \$ 24,11

Indirectos de Campo

% 8,00 \$ 24,11

Subtotal

\$ 349,65

Utilidad

% 10,00 \$ 34,97

Subtotal

\$ 384,62

PRECIO UNITARIO

\$ 384,62

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.



CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EIJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE:
CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ARMEX	armex	ml	1,00000	\$ 135,00	\$ 135,00
AQUEMADO	Alambre quemado	kg	0,07000	\$ 27,00	\$ 1,89
	Suma de Materiales				\$ 136,89
Mano de Obra					
CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,05792	\$ 1.100,00	\$ 63,71
CUAD.FIERREROS	(1 oficial fierrero + 1 ayudante fierrero + cabo)	jor	0,02400	\$ 1.100,00	\$ 26,40
	Suma de Mano de Obra				\$ 90,11
Auxiliares					
PLOMADA	PLOMADA	pza	0,02542	\$ 120,00	\$ 3,05
CUCHARA	CUCHARA	pza	0,02590	\$ 70,00	\$ 1,81
PALA	PALA	pza	0,02890	\$ 145,00	\$ 4,19
FLEXOMETRO	FLEXOMETRO	pza	0,05490	\$ 60,00	\$ 3,29
MARRO	MARRO	pza	0,04590	\$ 105,00	\$ 4,82
MARTILO	MARTILO	pza	0,03490	\$ 60,00	\$ 2,09
BOTE	BOTE	pza	0,03320	\$ 35,00	\$ 1,16
NIVEL	NIVEL	pza	0,05200	\$ 120,00	\$ 6,24
ESCALERA	ESCALERA	pza	0,04900	\$ 1.200,00	\$ 58,80
CONCRETO150	Concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2	m3	0,01900	\$ 1.300,00	\$ 24,70
CIMBRACOMUN	Cimbra acabado comun	m2	0,21500	\$ 160,00	\$ 34,40
	Suma de Auxiliares				\$ 144,56
	Costo Directo				\$ 371,57
	Indirectos			% 8,00	\$ 29,73
	Indirectos de Campo			% 8,00	\$ 29,73
	Subtotal				\$ 431,02
	Utilidad			% 10,00	\$ 43,10
	Subtotal				\$ 474,12
PRECIO UNITARIO					\$ 474,12

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.

[Firma]

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EIJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGUA	AGUA	m3	0,00500	\$ 31,00	\$ 0,16
MPINO	Madera de pino de 3a	pza	0,35000	\$ 7,00	\$ 2,45
CLAVO	Clavo 2 1/2	kg	0,12580	\$ 31,00	\$ 3,90
	Suma de Materiales				\$ 6,50
Mano de Obra					
CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,20000	\$ 1.100,00	\$ 220,00
	Suma de Mano de Obra				\$ 220,00
Auxiliares					
PALA	PALA	pza	0,02615	\$ 145,00	\$ 3,79
NIVEL	NIVEL	pza	0,02999	\$ 163,00	\$ 4,89
REGLA	REGLA	pza	0,08899	\$ 60,00	\$ 5,34
CUCHARA	CUCHARA	pza	0,08919	\$ 120,00	\$ 10,70
FLEXÓMETRO	FLEXÓMETRO	pza	0,19800	\$ 60,00	\$ 11,88
PLOMADA	PLOMADA	m2	0,58990	\$ 120,00	\$ 70,79
BOTE	BOTE	pza	0,19990	\$ 35,00	\$ 7,00
CONCRETO250	CONCRETO251	m3	0,07255	\$ 49,50	\$ 3,59
	Suma de Auxiliares				\$ 117,98
	Costo Directo				\$ 344,48
	Indirectos			% 8,00	\$ 27,56
	Indirectos de Campo			% 8,00	\$ 27,56
	Subtotal				\$ 399,60
	Utilidad			% 10,00	\$ 39,96
	Subtotal				\$ 439,56

**PRECIO UNITARIO
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.**

\$ 439,56

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOEMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

7 LOSA SE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARAMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 25CM. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, MATERIAÑES Y MANO DE OBRA. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

ACERO#3	Acero de refuerzo Limite elástico fy=4200 kg/cm2.	kg	1,01192	\$ 132,00	\$ 133,57
AQUEMADO	Alambre quemado	kg	0,01500	\$ 27,00	\$ 0,41

Suma de Materiales

\$ 133,98

Mano de Obra

CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,00619	\$ 1.100,00	\$ 6,80
CUAD.FIERREROS	(1 oficial fierro + 1 ayudante fierro + cabo)	jor	0,00650	\$ 1.100,00	\$ 7,15

Suma de Mano de Obra

\$ 13,95

Equipo

MARRO	MARRO	pza	1,19590	\$ 351,20	\$ 420,00
SERRUCHO	SERRUCHO	pza	1,19290	\$ 110,00	\$ 131,22
PALA	PALA	pza	1,29560	\$ 70,00	\$ 90,69
CLAVO	CLAVO	pza	0,29290	\$ 120,00	\$ 35,15
CIMBRACOMUN	CIMBRACOMUN	m2	0,29490	\$ 70,00	\$ 20,64
MARTILLO	MARTILLO	pza	0,99900	\$ 60,00	\$ 59,94
SEGUETA	SEGUETA	pza	0,28960	\$ 120,00	\$ 34,75
FLEXOMETRO	FLEXOMETRO	pza	0,28650	\$ 60,00	\$ 17,19
AGUA	AGUA	pza	0,39690	\$ 12,00	\$ 4,76
PLOMADA	PLOMADA	pza	0,35890	\$ 120,00	\$ 43,07
BOTE	BOTE	pza	0,14660	\$ 35,00	\$ 5,13
CONCRETO250	CONCRETO251	m3	0,12690	\$ 46,00	\$ 5,84

Suma de Equipo

\$ 868,38

Costo Directo		\$ 1.016,32
Indirectos	% 8,00	\$ 81,31
Indirectos de Campo	% 8,00	\$ 81,31
Subtotal		\$ 1.178,93
Utilidad	% 10,00	\$ 117,89
Subtotal		\$ 1.296,82

PRECIO UNITARIO
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTAISEIS PESOS 82/100 M.N.

\$ 1.296,82

[Handwritten signature]

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EIJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, POR EL COSTO DEL FILETE NOSE DESCUENTA LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AQUEMADO	AQUEMADO	kg	0,25000	\$ 237,00	\$ 59,25
ACERO#3	ACERO#4	kg	0,30000	\$ 132,00	\$ 39,60
Suma de Materiales					\$ 98,85
Mano de Obra					
CUAD.FIERREROS	(1 oficial fierro + 1 ayudante fierro + cabo)	jor	0,01365	\$ 1.100,00	\$ 15,02
AD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,02569	\$ 1.100,00	\$ 28,26
Suma de Mano de Obra					\$ 43,27
Auxiliares					
ANDAMIOS	MODULO DE ANDAMIOS TUBULAR	jor	0,00590	\$ 351,20	\$ 2,07
LLANA	LLANA	pza	0,01190	\$ 110,00	\$ 1,31
REGLA	REGLA	pza	0,01560	\$ 70,00	\$ 1,09
NIVEL	NIVEL	pza	0,00290	\$ 120,00	\$ 0,35
CUCHARA	CUCHARA	pza	0,00400	\$ 70,00	\$ 0,28
BOTE	BOTE	pza	0,01300	\$ 35,00	\$ 0,46
PALA	PALA	pza	0,00650	\$ 145,00	\$ 0,94
Suma de Auxiliares					\$ 6,50
Costo Directo					\$ 148,62
Indirectos				% 8,00	\$ 11,89
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 11,89
Subtotal					\$ 172,40
Utilidad				% 10,00	\$ 17,24
Subtotal					\$ 189,64
PRECIO UNITARIO					\$ 189,64

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.

Julio

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOEMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO PZA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PTAMET	Ventana metalica de 1.20 X 1.20 m...	pza.	0,84540	\$ 2.050,00	\$ 1.733,06
Suma de Materiales					\$ 1.733,06
Mano de Obra					
CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0,21100	\$ 1.100,00	\$ 232,10
Suma de Mano de Obra					\$ 232,10
Auxiliares					
MORTERO C-A 1:4	Mortero relacion Cemento-Arena Prop. 1:4	m3	0,01350	\$ 1.600,00	\$ 6,81
Suma de Auxiliares					\$ 6,81
Costo Directo					\$ 1.971,97
Indirectos					\$ 157,76
Indirectos de Campo					% 8,00 \$ 157,76
Subtotal					% 8,00 \$ 2.287,48
Utilidad					\$ 228,75
Subtotal					% 10,00 \$ 2.516,23

PRECIO UNITARIO
DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 23/100 M.N.

(Handwritten signature)

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EIJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO Y/O CONTACTO, INCLUYE: APAGADOR Y CONTACTO SENCILLO, CON PLACA, LÍNEA MATIX, MARCA BTICINO, TUBO POLIDUCTO DE 21 MM, CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO." PZA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TUBOCONDUIT19	Tubo poliducto de 21 mm.	ml	8,00000	\$ 7,00	\$ 56,00
CONECTOR CONDUIT19	Conector pliducto de 21 mm	pza	2,00000	\$ 2,50	\$ 5,00
CODOCONDUIT19	Codo pilducto de 21 mm	pza	2,00000	\$ 6,20	\$ 12,40
CAJACUADPVC4X4	Caja cuadrada de pvc de 4x4	pza	1,00000	\$ 16,00	\$ 16,00
CAJARECTPVC4X2	Caja rectangular de pvc de 4x2	pza	1,00000	\$ 9,50	\$ 9,50
AG.SENCILLO	Apagador sencillo	pza	1,00000	\$ 42,00	\$ 42,00
CONTACTO	Contacto sencillo	pza	1,00000	\$ 48,00	\$ 48,00
TAPA	Placa linea matix	pza	2,00000	\$ 21,00	\$ 42,00
CABLE12	Cable de cobre tipo thw-ls 75 °C calibre awg # 12	ml	24,00000	\$ 12,00	\$ 288,00
CINTAAISLAR	Cinta de aislar	rollo	0,10000	\$ 30,00	\$ 3,00
C.AHULADA	Cinta ahulada	pza	0,10000	\$ 48,00	\$ 4,80
CEMENTO PVC	Cemento pvc	lto	0,10000	\$ 35,00	\$ 3,50
Suma de Materiales					\$ 530,20
Mano de Obra					
CUAD.ELECTRICISTAS	(1 oficial electricista + 1 ayudante electricista + cabo)	jor	0,41382	\$ 1.100,00	\$ 455,20
Suma de Mano de Obra					\$ 455,20
Auxiliares					
MORTERO C-A 1:4	Mortero relacion Cemento-Arena Prop. 1:4	m3	0,22119	\$ 1.600,00	\$ 353,90
Suma de Auxiliares					\$ 353,90
Costo Directo					\$ 1.339,31
Indirectos				% 8,00	\$ 107,14
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 107,14
Subtotal					\$ 1.553,59
Utilidad				% 10,00	\$ 155,36
Subtotal					\$ 1.708,95
PRECIO UNITARIO					\$ 1.708,95
UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 95/100 M.N.					

**CUADRO GENERADOR CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA
MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

CONCEPTOS		ANCHO	LARGO	PZAS.	AREA	UNIDAD	CANTIDAD	CUARTOS	TOT	PU	IMPORTE
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	4.15	4.15	1.00	17.2225	M2	1.00	5.00	86.11	\$ 17.15	\$ 1,476.83
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	0.2	0.60	4.00							
		0.4	0.20	4.00		PZA	4.00	5.00	20.00	\$ 1,616.19	\$ 32,323.80
3	CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	CADENA	4.00	4.00		ML	16.00	5.00	148.00	\$ 396.01	\$ 58,609.48
		CASTILLO	2.50	4.00		ML	13.60				
4	MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	MUROS	3.85	2.30	4.00	M2	35.42				
		PUERTA	1.00	2.10		M2	2.10	5.00	159.40	\$ 384.620	\$ 61,308.43
		VENTANA	1.20	1.20		M2	1.44				
5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		4.00	4.00		ML	16.00	5.00	80.00	\$ 474.12	\$ 37,929.60
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.		3.85	1.00		M2	14.82	5.00	74.1125	\$ 439.56	\$ 32,576.89
7	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		4.55	1.00		M2	20.70	5.00	103.5125	\$ 1,296.82	\$ 134,237.08
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	MUROS EXTERIOR	4.15	2.50	4.00						
		MURO INTERIOR	3.85	2.50	4.00						
		LOSA INTERIOR	3.85	3.85	1.00						
		LOSA EXTERIOR	4.15	0.20	2.00						
		PERALTE	4.55	0.20	2.00						
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO		0.10	4.55	4.00			5.00	500.6125	\$ 189.64	\$ 94,936.15
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FUO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO			1.00		PZA.	1.00	1.00	5.00	\$ 3,263.40	\$ 16,317.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."			2.00		PZA	2.00	2.00	10.00	\$ 1,708.950	\$ 17,089.50

\$499,385.91

\$79,901.75

\$579,287.66

**CONVOCATORIA****1.- CONVOCANTE: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS**

2.-LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	FECHA	HORA
INVITACION	12 DE ABRIL DEL 2019	
VISITA DE OBRA	16 DE ABRIL DEL 2019	11:00
JUNTA DE ACLARACIONES	16 DE ABRIL DEL 2019	12:00
APERTURA DE PROPUESTAS	24 DE ABRIL DEL 2019	12:00
FALLO Y ADJUDICACION	26 DE ABRIL DEL 2019	13:00
CONTRATO	29 DE ABRIL DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	44 DIAS

4.-ANTICIPOS Y PORCENTAJES QUE SE OTORGARAN; Para todo lo relacionado con este rubro en caso de que la DOP otorgue algún anticipo, el LICITANTE adjudicatario del Contrato se deberá sujetar a lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, la DOP otorgará un anticipo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. Además del anticipo antes mencionado, se otorgará un anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato.

Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue.

5.- MONEDA. La moneda en que deberá presentarse la proposición será en pesos mexicanos.

6.-CONDICIONES DE PAGO: FORMA DE PAGO.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato recibirá de la DOP, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

- a) En periodos que abarcarán un mes calendario, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES , el LICITANTE adjudicatario del Contrato, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, mismas que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Supervisión de la DOP, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la tesorería del municipio de ABASOLO, Tamaulipas, MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.

7.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, los acuerdos tomados y las explicaciones, adecuaciones e indicaciones establecidas en el Acta, deberán ser consideradas por todos los licitantes en la elaboración de su proposición; el no hacerlo será motivo suficiente para desechar la misma.

El LICITANTE en su proposición deberá incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como copia fotostática del acta de visita al sitio generada entre el representante de la CONVOCANTE y los LICITANTES asistentes, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

8.- JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se celebrará DE ACUERDO AL PROGRAMA DEL CONCURSO, en LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS.

9.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, FALLO Y FIRMA DE CONTRATO

El Acto de Presentación de proposiciones (Técnicas y Económicas) y Apertura de las mismas, se llevará a cabo en la Sala de Juntas ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO, Tam. ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicadas en este párrafo, por lo que se recomienda a los LICITANTES presentarse con la debida anticipación.



ACTO DE FALLO

La comunicación del fallo se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicada La Dirección de obras públicas, ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO , Tam.

FIRMA DEL CONTRATO.

EL LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, quedará obligado a firmarlo EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 DEL 2019. PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.

10.- Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

11.- Llenar el anexo complementario para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él.

12.-No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de esta Ley.

13.- A las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado;

En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de esta Ley;

14.-Llenar el anexo donde los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

15.-Las bases contienen el plano y proyectos de esta licitación.

16.-Servicios relacionados con las demás obras públicas (no aplica)

17.- Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes;

18.- (no aplica)

19.- El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse;

20.- Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse

21.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS.

Los criterios generales en que se basará la evaluación de las proposiciones, consistirán en verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y económicos de la obra, considerados en la proposición y se considerará lo siguiente:

En caso de discrepancias entre la información contenida en la invitación a cuando menos tres personas, las bases de licitación, la junta de aclaraciones u oficio de aclaraciones, prevalecerá lo establecido en los oficios de aclaraciones emitidos con posterioridad a la junta de aclaraciones, la junta de aclaraciones, las bases de licitación y la invitación a cuando menos tres personas, respectivamente.

EN LO TÉCNICO SE VERIFICARÁ:

Para la evaluación técnica de las proposiciones se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

- I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;
- II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
- III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos;
- IV. Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron;
- V. Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
- VI. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y
- VII. De los estados financieros:
 - a. Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado;



(NO APLICA PARA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)

- b. Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
- c. El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A. Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios, además se verificará:

I. De los programas:

- a. Que el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;
- b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos;
- c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y
- d. en el procedimiento constructivo a realizar;
- e. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, se verificará que los suministros sean congruentes con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, y
- f. Que los insumos propuestos por el LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo:

- a. Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE;
- b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DOP hubiere establecido en el procedimiento de construcción, y
- c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como referencia los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;



III. De los materiales:

- a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y , en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate, y
- b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACIÓN, y

IV. De la mano de obra:

- a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
- b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, y se tomarán en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de la DOP, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
- c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

Si algún LICITANTE se encuentra participando simultáneamente en distintas LICITACIONES, se verificará que su capacidad técnica, económica y financiera garantice a la DOP la ejecución de los trabajos materia de esta LICITACIÓN, considerando los compromisos que se pudieran derivar de las restantes LICITACIONES.

Si algún LICITANTE se encuentra participando simultáneamente en dos o más LICITACIONES, en las que el periodo de ejecución de los trabajos se traslape, proponiendo el mismo personal técnico y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (Anexo AT3), así como con la misma maquinaria y equipo de construcción, enlistada en la Relación de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AT9); al adjudicársele el primer Contrato, automáticamente quedará descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES.

EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ:

Para la evaluación económica de las proposiciones se considerarán entre otros los siguientes aspectos:

- I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
- II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del



III. proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

A. Además se verificará:

I. Del presupuesto de obra:

- a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;**
- b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y**
- c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;**

II. Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable a la materia, y se revisará:

- a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;**
- b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;**
- c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;**
- d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores;**
- e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y**



- f. Que los costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
- III. Se verificará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado:
- a. Que los costos de los materiales considerados por el LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las BASES DE LA LICITACIÓN;
 - b. Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y
 - c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
- IV. Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado:
- a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
 - b. Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatario del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y
 - c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las BASES DE LA LICITACIÓN, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;
- V. Se verificará que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:



- a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITANTE adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;
 - b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
 - c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;
 - d. Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las Erogaciones de los Trabajos, y
 - e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LA LICITACIÓN;
- VI. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes;
- VII. Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y
- VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el Programa Calendarizado de las Erogaciones de los Trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN LOS ASPECTOS ANTERIORES, SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE Y SE DEVOLVERAN AL CONCURSANTE SOLO SE ARCHIVARA EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS Y SE DEVOLVERAN LAS RESTANTES.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES

Con las proposiciones que hayan sido calificadas como solventes técnica y económicamente, se efectuará un análisis comparativo que servirá como base para la emisión del fallo.

MECANISMO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Una vez hecha la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los LICITANTES, a aquel cuya propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las BASES DE LA LICITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la DOP y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

La DOP emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica del acto del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

22.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligación de presentar completas y sin errores sus proposiciones y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, la DOP desechará las proposiciones que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

- I. Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS o en las BASES DE LA LICITACIÓN.
- II. Las proposiciones de aquellos LICITANTES que no den cumplimiento a los requisitos legales exigidos o no acrediten satisfactoriamente la experiencia, capacidad técnica o financiera requeridas.
- III. Aquellas proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la DOP en las BASES DE LA LICITACIÓN.
- IV. Aquellas proposiciones cuyo plazo de ejecución de los trabajos sea diferente al establecido por la DOP, en la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y en las BASES DE LA LICITACIÓN.
- V. Aquellas proposiciones que no incluyan los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos satisfactoriamente, conforme al programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
- VI. Aquellas proposiciones cuyo programa calendarizado de ejecución general de los trabajos o programas de utilización de recursos no sean factibles de ejecutar.
- VII. Aquellas proposiciones que contengan materiales que no sean de las especificaciones, características y calidad, solicitadas en las BASES DE LA LICITACIÓN y en el proyecto.
- VIII. Aquellas proposiciones que no contengan los desgloses correspondientes de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo de construcción, en los análisis de precios unitarios.



- IX. Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria y/o equipo de construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, en los análisis de precios unitarios correspondientes.
- X. Aquellas proposiciones que no hayan considerado los costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos.
- XI. Aquellas proposiciones cuyo importe total y/o de los precios unitarios para cada uno de los conceptos de trabajo, comparados con los existentes en el mercado, sean de tal forma bajos, y como resultado de la revisión efectuada, se concluya que el postor no podrá ejecutar la obra sin pérdida que se traduzca en falta de cumplimiento del Contrato.
- XII. Aquellas proposiciones en las que el cargo por concepto de maquinaria y/o equipo de construcción, no se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución de los conceptos de trabajo correspondientes; que el costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga y que en la determinación del costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos.
- XIII. Aquellas proposiciones en las que en sus precios unitarios intervengan destajos o lotes, por concepto de materiales, mano de obra y equipo de construcción.
- XIV. Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis de los Precios Unitarios (Anexo AE9) de los conceptos de trabajo, o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15).
- XV. Aquellas proposiciones que incluyan en el Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AE8), el cargo por concepto de almacenaje, el cual deberá ser integrado en el Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4), o que no presente completa la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AT10), con los datos solicitados en las BASES DE LA LICITACIÓN.
- XVI. Aquellas proposiciones en las que figuren en los análisis de precios unitarios, los cargos por concepto de asociación en cámaras industriales o comerciales, aportación de los Contratistas para la ejecución de obras o prestación de servicios de beneficio social.
- XVII. Aquellas proposiciones que contengan información falsa, total o parcialmente.
- XVIII. Aquellas en las que el LICITANTE se encuentre en cualquiera de los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y que por su conducto no participen en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas



- XIX.** Que el LICITANTE presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier Compañía o Asociación.
- XX.** Que el LICITANTE se ponga de acuerdo con otros LICITANTES, para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la LICITACIÓN, la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.
- XXI.** El no poner el motivo de la LICITACIÓN o el Número de la misma, en todos y cada uno de los formatos que haga entrega el LICITANTE.
- XXII.** Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos sea incongruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
- XXIII.** Que el procedimiento constructivo descrito no sea aceptable, porque demuestra que el LICITANTE desconoce los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.
- XXIV.** Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por la convocante en el apartado AT1A.
- XXV.** Si algún LICITANTE se encuentra participando simultáneamente en dos o más LICITACIONES, en las que el periodo de ejecución de los trabajos se traslape, proponiendo el mismo personal técnico y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (Anexo AT3), así como con la misma maquinaria y equipo de construcción, enlistada en la Relación de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AT9); al adjudicársele el primer Contrato, automáticamente quedará descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES.
- XXVI.** La falta de presentación de escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los procedimientos de contratación.

23.- DE LAS GARANTÍAS PARA EL CONTRATO.

FIANZA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, El LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización, deducción o devolución del anticipo que en su caso reciba, deberá presentar a favor del municipio de ABASOLO Tamps y a satisfacción de la DOP, una Fianza por el importe total del anticipo otorgado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, debiéndose pegar



estrictamente al formato de Póliza de Fianza para garantizar la debida aplicación del anticipo otorgado para Contrato, contenido en las BASES DE LA LICITACIÓN.

Para el caso de anticipos otorgados en el primer ejercicio presupuestario, la garantía antes mencionada deberá entregarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Para los ejercicios subsecuentes, deberá presentar dicha garantía por el importe total otorgado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el LICITANTE adjudicatario del Contrato, reciba la notificación por escrito del monto concedido para la compra de materiales y equipos de instalación permanente.

Las citadas garantías deberán cubrir entre otros aspectos, que los recursos asignados se apliquen debidamente, se efectúe la total amortización y en su caso la devolución total, de acuerdo con los términos contenidos en el Contrato respectivo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, el LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar el debido cumplimiento de las

obligaciones estipuladas en el Contrato, deberá presentar a favor del municipio de ABASOLO TAMPS. y a satisfacción de la DOP, una Fianza por un importe igual al

10 % (diez por ciento) del valor total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, debiéndose apegar estrictamente al formato de Póliza de Fianza para garantizar el debido cumplimiento del Contrato, contenido en las BASES DE LA LICITACIÓN.

La garantía antes mencionada deberá entregarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que el LICITANTE hubiese recibido copia del Acta de Fallo de Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Quedarán a salvo los derechos de la DOP, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Punto.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al término de la obra, no obstante su recepción formal, el LICITANTE adjudicatario del Contrato, se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo, en el Código Civil Federal. En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto en los trabajos, durante el periodo antes citado, la garantía deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la DOP informará a la Afianzadora el estado de



las obras o trabajos realizados.

La cancelación de las fianzas será a petición de la DOP.

**24.- EN ANEXOS AT2 MODELOS DE CONTRATOS, FIANZAS Y SOLICITUD DE
PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS**

25.- EL LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, quedará obligado a firmarlo dentro del plazo fijado en el Primer Párrafo del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el LICITANTE injustificadamente y por causas imputables a él mismo no formaliza el Contrato que le fuera adjudicado, será sujeto de lo previsto en el artículo 78 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No podrá formalizarse Contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

26.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentación de proposiciones, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Programa Calendarizado de las Erogaciones de los Trabajos, pactado, dichos costos, cuando procedan, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en los Artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La DOP propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo señalado en la Fracción II del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas.

- a) Para que proceda la solicitud de ajuste de costos, "La Contratista" deberá presentar su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis en la Dirección de Obras Públicas de "La Contratante" ubicada en la presidencia municipal La Dirección de obras públicas, ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO TAMP. en horario de 9:00 a 14:00 horas.

27.- Las BASES DE LA LICITACIÓN, a través de las cuales se instruye a los LICITANTES la forma en que deberán integrar sus proposiciones técnica y económica, se encuentran disponibles para su consulta y adquisición a partir de la fecha de la invitación y hasta el día 16 DE ABRIL DEL 2019, en: La Dirección de obras públicas, ubicada en la presidencia municipal DE ABASOLO, Tam. En horario de 9:00 a 14:00 horas.

ATENTAMENTE

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



PADRON DE CONTRATISTAS

REGISTRO	CONTRATISTAS	RFC	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	COLONIA	CORREO E	TÉLEFONO 1	CIUDAD	ESTADO	ESPECIALIDAD 1	FECHA DE REGISTRO
ABA-01	ING. ARMANDO DAVID VANOVE	VASA21020A12	ING. ARMANDO DAVID VANOVE	BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760.	COL. MAINERO C.P. 87100	ing.vanove@gmail.com	8341628355	VICTORIA	TAM.	DISEÑOS Y OBRAS CIVILES.	16 DICIEMBRE 2016
ABA-02	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	REHRC40300A1	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	BIERC. LIBERT. DE TAMA. #310.	COL. LINDA VISTA	rene-rendon@hotmail.com	8341711487	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	20 DICIEMBRE 2016
ABA-03	ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ	VARY8606201F2	ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ	C. PEÑA NEVADA SUR No. 116	FRACC. SIERRA GRANDE	vary_09@hotmail.com	8341628355	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	6 ENERO 2017
ABA-04	BRYAN RENDON FERNANDEZ	REH9204158P5	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CALLE EJ. LIBERTADOR DE TAMAULIPAS Num. 310	LINDA VISTA	briden_13@hotmail.com	8342275790	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	28 ENERO 2017
ABA-05	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	GUCC781105P91	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	CALLE REFINERIA No. 937	COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87030	gregoriodelacruz@t.net.mx	8411007423	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	20 ABRIL 2017
ABA-06	JUAN JOSE PUGA CASTRO	PUC791226NGA	JUAN JOSE PUGA CASTRO	C. PEÑA NEVADA SUR No. 116	FRACC. COL. CENTRO CIERRA GRANDE	vary_09@hotmail.com	8341506961	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	6 SEPTIEMBRE 2017
ABA-07	GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	GUCC781105P91	GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	CALLE MADERO NUM. 325	FRACC. INDUSTRIAL		834175247	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	12 SEPTIEMBRE 2017
ABA-08	JUAN SAMUEL MARTINEZ AVALOS	MAJU40516VBA	JUAN SAMUEL MARTINEZ AVALOS	CALLE NTE. NORBERTO TREVINO ZAPATA NUM. 1018	COL. VISTA HERMOSA		8341162590	VICTORIA	TAM.	INGENIERIA CIVIL	28 SEPTIEMBRE 2017
ABA-09	EDMUNDO GARCIA NERI	GANE831114V26	EDMUNDO GARCIA NERI	CALLE PUERTO RICO No. 205	COL. CONSTITUCION	tracedosyconstrucciones@hotmail.com	8361155883	ALDAMA	TAM.	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	12 SEPTIEMBRE 2017
ABA-10	ARNOLDO SANCHEZ REYES	ACCO90923HA3	ARNOLDO SANCHEZ REYES	CALLE PELICANOS No. 222	FRACC. BRISAS DEL CAMPO	arnoldofor@hotmail.com	8992282260	RIO BRAVO	TAM.	CONSTRUCCION Y URBANIZACION REMODELACIONES, IMPERMEABILIZACIONES Y ACABADOS	14 MARZO 2019
	LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO	AUM1690209G60	LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO	CALLE EL CEREZO No. 1513	FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS	luisalfonsoaguilars9@hotmail.com	8341216285	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA	25 MARZO 2019



ABASOLO TAM. A 12 DE ABRIL DEL 2019.

ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

**ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA
CALLE MAERO NUM. 325
FRACC. INDUSTRIAL
CD. VICTORIA TAM.**

PRESENTE:

**CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73
DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO
TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA:**

**CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE
VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

**TODO EL CONCURSO SE PARTIRA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.**

PROGRAMA DE CONCURSO		
	FECHA	HORA
INVITACION	12 DE ABRIL DEL 2019	
VISITA DE OBRA	16 DE ABRIL DEL 2019	11:00
JUNTA DE ACLARACIONES	16 DE ABRIL DEL 2019	12:00
APERTURA DE PROPUESTAS	24 DE ABRIL DEL 2019	12:00
FALLO Y ADJUDICACION	26 DE ABRIL DEL 2019	13:00
CONTRATO	29 DE ABRIL DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	44 DIAS

**EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN
DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE
ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REUNA LAS
CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS.**

ATENTAMENTE:

**DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



ABASOLO TAM. A 12 DE ABRIL DEL 2019.
ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONASING. RENE RENDON HERNANDEZ
EJ. LIBERTADOR
COL. LINDAVISTA
CD. VICTORIA TAM.
PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

TODO EL CONCURSO SE PARTIRA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	FECHA	HORA
INVITACION	12 DE ABRIL DEL 2019	
VISITA DE OBRA	16 DE ABRIL DEL 2019	11:00
JUNTA DE ACLARACIONES	16 DE ABRIL DEL 2019	12:00
APERTURA DE PROPUESTAS	24 DE ABRIL DEL 2019	12:00
FALLO Y ADJUDICACION	26 DE ABRIL DEL 2019	13:00
CONTRATO	29 DE ABRIL DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	44 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



ABASOLO TAM. A 12 DE ABRIL DEL 2019.

ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONAS

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ
C. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA N°1018
COL. VISTA HERMOSA
CD VICTORIA TAM

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

TODO EL CONCURSO SE PARTIRA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	FECHA	HORA
INVITACION	12 DE ABRIL DEL 2019	
VISITA DE OBRA	16 DE ABRIL DEL 2019	11:00
JUNTA DE ACLARACIONES	16 DE ABRIL DEL 2019	12:00
APERTURA DE PROPUESTAS	24 DE ABRIL DEL 2019	12:00
FALLO Y ADJUDICACION	26 DE ABRIL DEL 2019	13:00
CONTRATO	29 DE ABRIL DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	44 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

ABASOLO TAM. A 12 DE ABRIL DEL 2019.
ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONASLIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRALORIA MINICIPAL

PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA PARA DAR SEGUIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

TODOS EL CONCURSO SE PARTIRA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	FECHA	HORA
INVITACION	12 DE ABRIL DEL 2019	
VISITA DE OBRA	16 DE ABRIL DEL 2019	11:00
JUNTA DE ACLARACIONES	16 DE ABRIL DEL 2019	12:00
APERTURA DE PROPUESTAS	24 DE ABRIL DEL 2019	12:00
FALLO Y ADJUDICACION	26 DE ABRIL DEL 2019	13:00
CONTRATO	29 DE ABRIL DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	44 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Recibí

ABASOLO TAM. A 12 DE ABRIL DEL 2019.
ASUNTO: INVITACION A 3 PERSONASING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO
REGIDORA COMISION DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR INVITACION A 3 PERSONAS A LA OBRA PARA DAR SEGUIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA OBRA :

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

TODOS EL CONCURSO SE PARTIRA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA DE CONCURSO		
	FECHA	HORA
INVITACION	12 DE ABRIL DEL 2019	
VISITA DE OBRA	16 DE ABRIL DEL 2019	11:00
JUNTA DE ACLARACIONES	16 DE ABRIL DEL 2019	12:00
APERTURA DE PROPUESTAS	24 DE ABRIL DEL 2019	12:00
FALLO Y ADJUDICACION	26 DE ABRIL DEL 2019	13:00
CONTRATO	29 DE ABRIL DEL 2019	11:00
PLAZO DE EJECUCION	DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	44 DIAS

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON BASE EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS FORMULARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO, SE ADJUDICARA EL CONTRATO SOLO SI SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A) REUNA LAS CONDICIONES NECESARIAS B) GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mxMunicipio de Abasolo Admón.
2018-2021
