



LISTA DE ASISTENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

REGIDORA COMISION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO

DIRECTOR DE LA SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

EMPRESAS PARTICIPANTES

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA

ABASOLO, Tam. A 25 DE ABRIL DEL 2019.

ANALISIS TECNICO FINANCIERO CONCURSO FH-01-19

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, se revisaron las cotizaciones que presentaron las empresas invitadas para la ejecución de la obra:

PROYECTO:

CONCURSO FH-01-19

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE
ABASOLO TAM.

En este municipio, cuyos montos se indican a continuación:

NO.	CONCURSANTE	IMPORTE
1	ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	\$ 575,054.43
2	C. BRYAN RENDON FERNANDEZ	\$ 593,590.14
3	ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	\$ 616,290.61

Considerando: la experiencia, capacidad técnica, equipo y maquinaria de construcción necesaria para la ejecución de los trabajos, de las empresas que participan, se concluyen que todas cubren estos requisitos y cuentan con la solvencia suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato, como se establece en el artículo antes citado.

Sirva la información anterior para formular el dictamen y fallo correspondiente.

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



ABASOLO, Tam. A 25 DE ABRIL DEL 2019

DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada:

CONCURSO FH-01-19
REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

En este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de **\$ 575,054.43 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO Pesos 43/100 m.n.)** Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

ABASOLO, Tam. A 25 DE ABRIL DEL 2019.

ASUNTO: ADJUDICACION DE CONTRATO

**EDMUNDO GARCIA NERI
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.-**

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra:

**CONCURSO FH-01-19
REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO
EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió **F A L L O** en su favor en los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a **ADJUDICARLE** el contrato número **FH-01-19** para la construcción de las obras que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo firma del contrato antes citado.

ATENTAMENTE:

**DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS**



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

ACTA DE FALLO

CONCURSO FH-01-19

**REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO
EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2019, EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; SE REUNIERON LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ REVISADAS Y ANALIZADAS LAS PROPUESTAS NO DESECHADAS SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:


NO.	CONCURSANTE	IMPORTE
1	ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	\$ 575,054.43
2	C. BRYAN RENDON FERNANDEZ	\$ 593,590.14
3	ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	\$ 616,290.61

LA PRESENTE ACTUACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVÓ A ACABO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SUS RESPECTIVOS ARTÍCULOS.

LA PROPUESTA QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD Y LAS AUTORIDADES REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y PREVIO EL DICTÁMEN EMITIDO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO POR UN MONTO \$ 575,054.43 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO Pesos 43/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A. SE CITA A LA EMPRESA GANADORA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 11:00 EN



LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, PARA FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO.

Leída la presente actuación, se procedió a la firma de la misma por quienes intervinieron, entregándose un ejemplar de esta acta a los participantes.

LISTA DE ASISTENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

REGIDORA COMISION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO

DIRECTOR DE LA SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

EMPRESAS PARTICIPANTES

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ


C. BRYAN RENDON FERNANDEZ

ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA

CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS, SUBESTACIONES Y OBRA CIVIL
CALLE MADERO # 325, FRACC. INDUSTRIAL C.P. 87018 CD VICTORIA, TAM.
TELEFONOS (01) 834 31 3-48-45, CEL: 044 834 117 52 47

**REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN
EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

PRESUPUESTO BASE

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	29,083.10	15.98	464,747.94
2	SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	985.46	59.80	58,930.51
3	SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	127.20	59.80	7,606.56
SUB TOTAL					\$531,285.01
16% iva					\$85,005.60
TOTAL OBRA					\$616,290.61

ELABORO

ING. GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA





BRF
Construcciones

BRYAN RENDON FERNANDEZ
CONTRATISTA
CONSTRUCCION EN GENERAL

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO
EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PRESUPUESTO BASE

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	29,083.10	15.20	442,063.12
2	SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	985.46	62.60	61,689.80
3	SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	127.20	62.60	7,962.72
SUB TOTAL					\$511,715.64
16% iva					\$81,874.50
TOTAL OBRA					\$593,590.14

ELABORO

BRYAN RENDON FERNANDEZ

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019

Haciendo realidad sus ideas



DISEÑOS
Obras Civiles


Redes de A. Potable y Alcantarillado

• Vivienda • Escuelas • Edificaciones • Centros de Salud

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PRESUPUESTO BASE

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	29,083.10	14.79	430,139.05
2	SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	985.46	58.95559	58,098.38
3	SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	127.20	58.95559	7,499.15
SUB TOTAL					\$495,736.58
16% iva					\$79,317.85
TOTAL OBRA					\$575,054.43

ELABORO 


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ


OPERADO
HIDROCARBUROS 2019

PROGRAMA DE OBRA					
REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.					
Nº	CONCEPTO	25 DIAS			
		MES 1			
		10	20	25	
1	PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.				
2	SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.				
3	SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.				

ELABORADO POR:


 ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

DATOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.
META A CUMPLIR: 29,083.10 M2
UBICACION: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
IMPORTES: CON IVA TOTAL: \$ 575,054.43
ANTICIPO: NO HABRA ANTICIPO
TIPO DE CONTRATO: INVITACION A TRES
PLAZO DE EJECUCION: DEL 1 AL 25 DE MAYO 2019, PERIODO 25 DIAS.
FECHA DE CONTRATO: 29 DE ABRIL DEL 2019
LUGAR: MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM, REPRESENTADO POR: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO; EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ EL MISMO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

ANTECEDENTES

El presente Contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de adjudicación directa en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su reglamento.

[Firma]

[Firma]



CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

DECLARACIONES

1. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

1.1 Necesita ejecutar la obra de REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. La cual beneficiará a esta comunidad.

1.2 Que para su correcta y oportuna realización desea emplear los servicios de una empresa constructora solvente que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con los requisitos de calidad óptima; aplicándose fielmente a las especificaciones requeridas por "EL MUNICIPIO".


1.2 "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene personalidad jurídica para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.


1.4 LA YESIKA YANET SELVERA GARZA, PRESIDENTA MUNICIPAL, acredita su personalidad y facultades como presidenta MUNICIPAL por constancia de mayoría y por licencia de la titular conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.5 EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO que acredita su personalidad en su carácter de secretario del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam

1.6 EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Municipio de Abasolo, Tam, conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.7 EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que acredita su personalidad en su carácter de contralor del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

1.8 Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Abasolo, Tam, situado en la C. Lázaro Cárdenas y Guillermo Prieto s/n en el Municipio de Abasolo, Tam. C.P. 87760.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: Bajo formal protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcance de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Presente Contrato.

2.2 La empresa CONTRATISTA denominada ING. ARMANDO D. VANOYE SÁNCHEZ, cuenta con R.F.C. VASA521020A12

2.3 Tiene establecido su domicilio en Blvd. José López Portillo Nº 760 Col. Guadalupe Mainero C.P. 87100, en Ciudad Victoria, Tam., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.4 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del Presente contrato.

2.5 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas y que ratifica su declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 43 de la mencionada Ley.

2.6 Conoce debidamente el sitio de la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.7 "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes

[Firma manuscrita]


[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 385 01 77 385 02 29 y 385 00 91
www.abasolo.gob.mx





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.


Conforme al objeto del presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar la obra u objeto de este contrato hasta su total terminación. Acatando estrictamente la documentación referente al proyecto ejecutivo, catálogo de obra y programa, que firmados se anexan como parte integrante del presente contrato y como si se insertaran a la letra, así como todo lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Estado y Normas establecidas en los diversos ordenamientos de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal, por lo que es obligación de "EL CONTRATISTA" revisar acuciosamente todos los planos y especificaciones de la obra. En caso de detectar algún posible error, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas para que previa verificación, aprobación en su caso y firma de la supervisión que asigne la Dirección referida, se corrija.

"EL CONTRATISTA" deberá mostrar y explicar ampliamente a "EL MUNICIPIO" para su revisión y aprobación, los procedimientos y criterios técnicos que aplicará para resolver los trabajos objeto de éste contrato. "EL CONTRATISTA" estará sujeto a supervisiones por conducto del personal de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, fungiendo como órgano de vigilancia y control, otorgándole todas las facilidades técnicas y humanas para el buen cumplimiento y ejecución de la presente obra.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo del contratista. "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "EL CONTRATISTA" y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es por la cantidad de \$ 575,054.43 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.) Incluido el IVA., integrando en él, todos los conceptos, volúmenes y precios unitarios detallados sobre la base de los cargos directos e indirectos necesarios para entregar puntualmente la obra con la calidad requerida. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

este concepto. Si hubiere conceptos fuera de presupuesto, estos deberán presentarse para autorización previamente a su ejecución; acompañado de: presupuesto y análisis de Precios Unitarios, fotografías, notas de bitácora donde autorizan su ejecución, generadores con croquis y programa de ejecución de los mismos. Dicha suma sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional entre las partes. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO", sea necesario llevar a cabo dichas modificaciones o trabajos extraordinarios, se procederá de la siguiente forma:


A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones o trabajos extraordinarios de que se trate, "EL MUNICIPIO" estará facultado para ordenarle su ejecución, a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizarlos conforme dichos precios.


B.- Si para estas modificaciones o trabajos extraordinarios, no existen conceptos y precios en el contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible determinarlos con base en los elementos contenidos en los análisis de precios establecidos para la formulación del presupuesto de contrato, procederá a determinarlos con la intervención de "EL CONTRATISTA", y éste, estará obligado a ejecutarlos conforme a tales precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabulares en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso, "EL CONTRATISTA", estará obligado a ejecutarlos.

D.- Si, aun así, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos A), B) y C), "EL CONTRATISTA", requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios, acompañados de sus respectivos análisis. En la inteligencia, de que para fijarlos, deberá aplicar el mismo criterio seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, conforme las especificaciones del proyecto y catálogo de conceptos; debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo inmediato. Si ambas partes llegaron a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere éste inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar las modificaciones o trabajos extraordinarios conforme a dichos precios.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el párrafo anterior, o bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL MUNICIPIO" podrá ordenarle la ejecución de las modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo equipo, personal, etc., que intervengan en estos trabajos.





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato DEL 1 AL 25 DE MAYO 2019, PERIODO 25 DIAS.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO. - "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA", el sitio en el cual deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, con la salvedad de ocupación u oposición de terceros ajenos a este contrato, igualmente se obliga a expedir las autorizaciones que se requieran para su realización. El retraso en la entrega del sitio prorroga en igual plazo la entrega de la obra. La entrega deberá constar por escrito en la bitácora de obra.

QUINTA. - ANTICIPOS. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO SE OTORGARA ningún anticipo y QUE SE PAGARA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA MEDIANTE EL PAGO DE ESTIMACION UNICA.


SEXTA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimación única; debidamente requisitadas con generadores, carátula de estimación y demás documentos de apoyo necesarios, obligatoriamente revisados y calificados por la supervisión de obra de la Dirección de Obras Públicas del Municipio; dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de corte para su validación y firmas. Estas serán pagadas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendario. El pago se realizará en la Tesorería Municipal.


"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para justificar atraso en los pagos o en la ejecución de la obra.

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y/o verificar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecución de las obras se realicen de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto de la obra realizada, y de comunicar a "EL CONTRATISTA", por escrito, las instrucciones que estime pertinente.

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA", en acatamiento a lo que establecen los Artículos 39 y 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tamaulipas, se obliga a constituir las garantías siguientes:

A.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - Fianza a favor del Municipio de Abasolo, Tam., por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la obra contratada, y deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia de la adjudicación. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza.





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos de los insumos pactados en este Contrato, cuando durante la vigencia del contrato y la ejecución de la obra dentro del programa correspondiente, ocurran circunstancias de orden económico no previstas dentro del contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción en un 5% (cinco por ciento) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

Con base a la solicitud que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", este llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante

por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.


Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido amortizado en su totalidad.

DÉCIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - La recepción de los trabajos será efectuada en forma total, salvo pacto en contrario que conste por escrito, por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra terminada con estándar de calidad de acuerdo al catálogo de contrato, así como de las modificaciones que durante el proceso de la obra "EL MUNICIPIO" solicite cumpliendo además con los términos comprometidos en programa contratado. "EL CONTRATISTA" avisará por escrito la terminación de la obra y "EL MUNICIPIO".

Realizará la inspección, constatando su conclusión en un plazo de 5 (cinco) días naturales posteriores al aviso. El acto de Entrega-Recepción de los trabajos se llevará a efecto dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, después de que "EL MUNICIPIO" verifique su terminación. Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega, serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Si aparecieren defectos o vicios ocultos dentro del año siguiente a la fecha de recepción por "EL MUNICIPIO", ésta ordenará su reparación o reposición inmediata y "EL CONTRATISTA" se obliga desde ahora a ejecutarla por su cuenta, sin derecho a retribución alguna.

"EL CONTRTISTA" se obliga a presentar el Finiquito del Contrato a más tardar 15 días después de terminada la obra, en la inteligencia, de que, de no cumplir con este requisito. "EL MUNICIPIO" resolverá





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

con los documentos que obren en su poder, aún sin la intervención del "EL CONTRATISTA", y éste no podrá anteponer recurso alguno para nulificarlo.

Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A.- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" el valor de la obra recibida.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a "EL CONTRATISTA" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.

C.- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba se liquidará en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.


D.- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decimosexta, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "EL MUNICIPIO", el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer, permanentemente en el lugar de la obra a su representante profesional, que fungirá como su Residente de Construcción; el cual, deberá tener conocimiento y poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, deberá presentar Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que lo acredite como Arquitecto o Ingeniero Civil, al momento de la apertura de la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar o rechazar al Representante Profesional.

De acuerdo a la normatividad "EL CONTRATISTA" llevará una bitácora de obra, en hojas foliadas y selladas por "EL MUNICIPIO", la cual debe contener en el encabezado el registro de firmas autorizadas por ambos, para el asiento y autorización de las notas respectivas. La bitácora que en este acto presenta "EL CONTRATISTA", misma que permanecerá en residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos, debiendo las notas de precisar según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional la ubicación. Causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y la fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.


"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" se obligan a aceptar la bitácora de obra como un documento anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus asientos se consideren como un elemento

[Firmas manuscritas]



Palacio Municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx





CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19


contractual. Esta bitácora registrará el cumplimiento de todas las obligaciones contratadas, constituirá el instrumento legal y técnico donde se asienten los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, y permitirá a los órganos de control y vigilancia el apoyo documental e informativo que requieran las revisiones de las obras.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos objeto de este contrato y que se refieran a los rubros antes citados, por lo que en este acto releva a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil o penal que pudiera derivar de la plantilla de trabajadores de "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan con las normas de calidad establecidas, y que, la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, y daños y perjuicios que por observancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyos caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.


DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL MUNICIPIO" tendrá facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa de Obras aprobado vigente. "EL MUNICIPIO" comparará el avance de las mismas conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieran efectuado varias comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que, en tal evento de común acuerdo, se hará al Programa las modificaciones que procedan, previa justificación. "EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 835 01 77, 835 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
por el progreso.



CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. En caso de suspensión del Presente Contrato, dicho convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza no imputable a "EL CONTRATISTA", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurrieran tales eventos.


DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato o suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DECIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente; lo que deberá efectuarse durante los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de rescisión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de "EL CONTRATISTA" que pudiesen existir, además de lo anterior, la rescisión tendrá lugar en los siguientes casos y se tendrán que tomar las medidas que a continuación se establecen:

A.- "EL MUNICIPIO" procederá a la rescisión del Contrato por alguna de las siguientes causas: cuando "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada o lo suspenda injustificadamente, incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de "EL

[Firma manuscrita]



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

MUNICIPIO" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como cualquier otra casusa que implique contravención a los términos del Contrato.

B.- Cuando" EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión administrativa del Contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, dentro del término de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga.



C.- Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".

D.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.


DÉCIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DÉCIMA NOVENA. - OBLIGACIONES.- Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:



Palacio municipal
Guillermo Prieto S/N
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



CONTRATO DE OBRA

Nº: FH-01-19

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

VIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2018.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ABASOLO, TAM.
AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ABASOLO, TAM.
AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ABASOLO, TAM.
AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ABASOLO, TAM.
AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL


LA CONTRATISTA

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



ARMANDO DAVID

Vanoye Sanchez

INGENIERIA CIVIL

Haciendo realidad sus ideas

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A1 324

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409115676

Fecha y Hora de emisión

2019-05-22T13:39:07

Folio Fiscal

E1DC8006-7CC0-11E9-9616-00155D014007

Emisor

RFC: VASA521020A12

Razón Social: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-05-22T13:39:07

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
17,000.00	MTK - Metro cuadrado	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$572,080.00 (QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FH-01-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM ClaveProdServ - 72103301 - Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parqueaderos	29.16	495,736.58

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 01/100 MXN

Subtotal

495,736.58 MXN

IVAT 0.160000

79,317.85 MXN

RET. CONTRALORIA MPAL

2,478.68 MXN

0.50

RETENCION 0.10

495.74 MXN

Total

572,080.01 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1DC8006-7CC0-11E9-9616-00155D014007|2019-05-22T13:39:07|7B9040609RKA|ROMIBJ5gkKwXQkQDwDoms0/A/DoUlsf1MIEAJEBqogPK38WfeQAIAxfssaA30/A/PL3dx2ltsLs2YuoBKRfyrMbi+in2xm0ScJio07GfORIGz6Kmw/J3ulk3zgNpbBpniOOYXUYBYJ2UZcAy5o+Xa/a504J5guwEKJHV8YhLqXfRoi6nOBP4b/61M36ZJ/EGhtKcpr/tc8fWeSVAEhdaz9R5OohfFO3uaA/o/wMVeAO00CJ11T9ULAPEX00YHppWJ5Hwt+dw6IKRWWh69SWydmndf38xtJYnNHMFvFA4f3OHe7q5+OqIEJO/3Ah0holOulKTfaV6e7zQ==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

ROMIBJ5gkKwXQkQDwDoms0/A/DoUlsf1MIEAJEBqogPK38WfeQAIAxfssaA30/A/PL3dx2ltsLs2YuoBKRfyrMbi+in2xm0ScJio07GfORIGz6Kmw/J3ulk3zgNpbBpniOOYXUYBYJ2UZcAy5o+Xa/a504J5guwEKJHV8YhLqXfRoi6nOBP4b/61M36ZJ/EGhtKcpr/tc8fWeSVAEhdaz9R5OohfFO3uaA/o/wMVeAO00CJ11T9ULAPEX00YHppWJ5Hwt+dw6IKRWWh69SWydmndf38xtJYnNHMFvFA4f3OHe7q5+OqIEJO/3Ah0holOulKTfaV6e7zQ==

Sello digital del SAT

nI3YZnlPIPhXIEBTYSMZ0J3cgXFAmWtah1HYvHwEmYoQISwGsi9vQvNPwk/GJy4HOYZTT0ZM+JRefuoE7nAmT0I3dYx/a/CvYQ1zQ/zcCBSTVFRJ3CRovYhdzDJT5pKaGmrWNSk+H502JDIPQ4IRBYRMJ9+ehT8TT9+IP3BbBKSLLqyhgqjbnTalz4c1hx2XJw6GUuczkro4+bfFmYb27xt1M8NGE0IibBMK0t0KZD3qVYhv9ZYTm3wYRMRvCruQrsVIRZf6TKUJorFLU19yJEssISA7n7ViqnL6MkDcuJedS41oSAfmm100LE+felz7oLIBkQaV74n+sZg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.facturax.com>

Página 1 de 1

Datos de la Fianza**FOLIO 1124935**

Movimiento : POLIZA
Fianza : 19A21209
Ramo : ADMINISTRATIVO
Subramo : OBRA
Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD
Moneda : PESOS
Agente : 855155
Nombre : FIDEL BALDERAS RODRIGUEZ
División : FORANEA
Monto Total de la Fianza: \$57,505.44

R.F.C. Fiado : VASA521020A12
Endoso : 19A21209

Monto Afianzado del
Movimiento \$57,505.44

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

ANTE: EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

PARA GARANTIZAR POR: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, CON DOMICILIO BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO 760 A, COL. GUADALUPE MAINERO, C.P.87100, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: R.F.C. VASA521020A12, EL CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE INVITACION A TRES, CONTRATO NUMERO FH-01-19, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y POR LA OTRA PARTE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, RELATIVO A: "REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM". CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$575,054.43 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO.

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARÁ CUANDO ASÍ LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE CONSTITUYE FIADORA DE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.*** FIN DE TEXTO ***


MIGUEL ÁNGEL ROBLES SAN MARTIN**JEFE DE OFICINA****TAMPICO, TAMAULIPAS, A 29 DE ABRIL DE 2019**

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 019A 2120 9112 4935

Fianzas Dorama, S.A.

Av. Patriotismo No. 201 Piso 1

Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,

Del. Benito Juárez, Ciudad de México

Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

RECEIBO			
OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		Nº DE CONTRATO: FH-01-19	
LOCALIDAD: EJ. EL MODELO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ			
DOMICILIO: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760 COL. GPE. MAINERO CD. VICTORIA, TAM.		22 DE MAYO DEL 2019	
R.F.C. VASA521020A12		IMP. DEL CONTRATO \$ 575,054.43	
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		BUENO POR: \$ 575,054.43	
(QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 01/100 M.N.)		FECHAS DE EJECUCION	
		PLAZO 1 AL 25 DE MAYO	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.:		TRABAJO DE:	
1 (UNICA)		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	
OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
ANTIPO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D E D U C C I O N E S			
0.10% RETENCION	\$ 495.74		
0.50% SECODAM:	\$ 2,478.68		
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 2,974.43		
AVANCES			
FISICO	100%	FINANCIERO	100%
PROGRAMADO %	100%	ACUM. ANTERIOR	100%
ESTIMADO %	100%	ACTUAL	100%
DEVALUACION \$ -			
POR PAGAR \$ -			
IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 495,736.58			
AMORTIZACION DE ANTICIPO			
SUB-TOTAL \$ 495,736.58			
I.V.A. \$ 79,317.85			
TOTAL \$ 575,054.43			
MONTOS ASIGNADOS \$ 575,054.43			
PAGOS ANTERIORES			
SUB-TOTAL \$ 575,054.43			
TOTAL DEDUCCIONES \$ 2,974.43			
NETO A PAGAR \$ 572,080.01			
SALDO DE ASIGNACION \$ 0.00			
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		C. MARTIN GONZALEZ TORRES	
CONTRATISTA		SECRETARÍA MUNICIPAL	
C. HOMERO GONZALEZ RODRIGUEZ		LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA	
DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS		CONTRALOR	
2018 - 2021		2018 - 2021	

ESTIMACION

ESTIMACION										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
OBRA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.											
LOCALIDAD: EJ. EL MODELO		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		Nº DE CONTRATO: FH-01-19					
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				PLAZO 1 AL 25 DE MAYO							
META: 29,083.10 M2				FECHA: 22 DE MAYO DEL 2019							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	V O L U M E N			IMPORTE (\$)			
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO				
1	PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	14.79	29,083.10	0.00	29,083.10	29,083.10	0.00	\$	430,139.05	
2	SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	58.95559	985.46	0.00	985.46	985.46	0.00	\$	58,098.38	
3	SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	58.95559	127.20	0.00	127.20	127.20	0.00	\$	7,499.15	
										SUBTOTAL	\$ 495,736.58
											\$ 495,736.58
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ										ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA	

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

NOTARIO A. ANGEL Z.

SUPERVISOR

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

CONTRATISTA

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADOR

OBRA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.					ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 2			
LOCALIDAD: EJ. EL MODELO		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		Nº DE CONTRATO: FH-01-19		
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				PLAZO 1 AL 25 DE MAYO		FECHA: 22 DE MAYO DEL 2019		
META: 29,083.10 M2								
CALLE	DE	A	LONGITUD	ANCHO	AREA	MOTOCONFORMACION DE TERRACERIAS	REVESTIMIENT O DE 10 CMS.	REVESTIMIENT O DE 15 CMS.
1	B	D	112.00	5.50	616.00	616.00	61.60	
	CRUCERO CON C		16.00	5.50	88.00	88.00	8.80	
	D	E	102.00	5.50	561.00	561.00	56.10	
2	4	D	343.00	5.50	1886.50	1886.50	0.00	
3	ACCESO		35.00	12.00	420.00	420.00	42.00	
	A	E	457.00	4.80	2193.60	2193.60	219.36	
	A	E	457.00	6.00	2742.00	2742.00	274.20	
	E	F	106.00	8.00	848.00	848.00	0.00	127.20
4	ACCESO		35.00	12.00	420.00	420.00	42.00	
	B	F	460.00	5.50	2530.00	2530.00		
5	C	F	335.00	5.50	1842.50	1842.50		
6	D	F	321.00	5.50	1765.50	1765.50		

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

HIDROCARBUROS 2019

GENERAL RADIOPHON

OBRAS DE REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.						ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 2 DE 2
LOCALIDAD: EJ. EL MODELO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		Nº DE CONTRATO: FH-01-19		
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ		PLAZO 1 AL 25 DE MAYO				
META: 29,083.10 M2		FECHA: 22 DE MAYO DEL 2019				
B	1	2	103.00	6.00	618.00	
	2	3	101.00	6.00	606.00	
	3	4	107.00	6.00	642.00	
	4	5	54.00	6.00	324.00	32.40
C	0	1	104.00	6.00	624.00	62.40
	1	2	103.00	6.00	618.00	61.80
	2	3	101.00	6.00	606.00	60.60
	3	4	107.00	6.00	642.00	64.20
	4	5	104.00	6.00	624.00	
D	3	6	348	6.00	2088.00	
E	3	7	458	6.00	2808.00	
F	0	7	495	6.00	2970.00	
						985.46
						127.20

ING. ARMANDO DAVILA YANOYE SANCHEZ

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

forward A-Answer 2.

SUPERVISOR

CONTRATTISTA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FOTOGRAFIA

OBRA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 2 DE 2
LOCALIDAD: EJ. EL MODELO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Nº DE CONTRATO: FH-01-19
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		PLAZO 1 AL 25 DE MAYO	
META: 29,083.10 M2		FECHA: 22 DE MAYO DEL 2019	

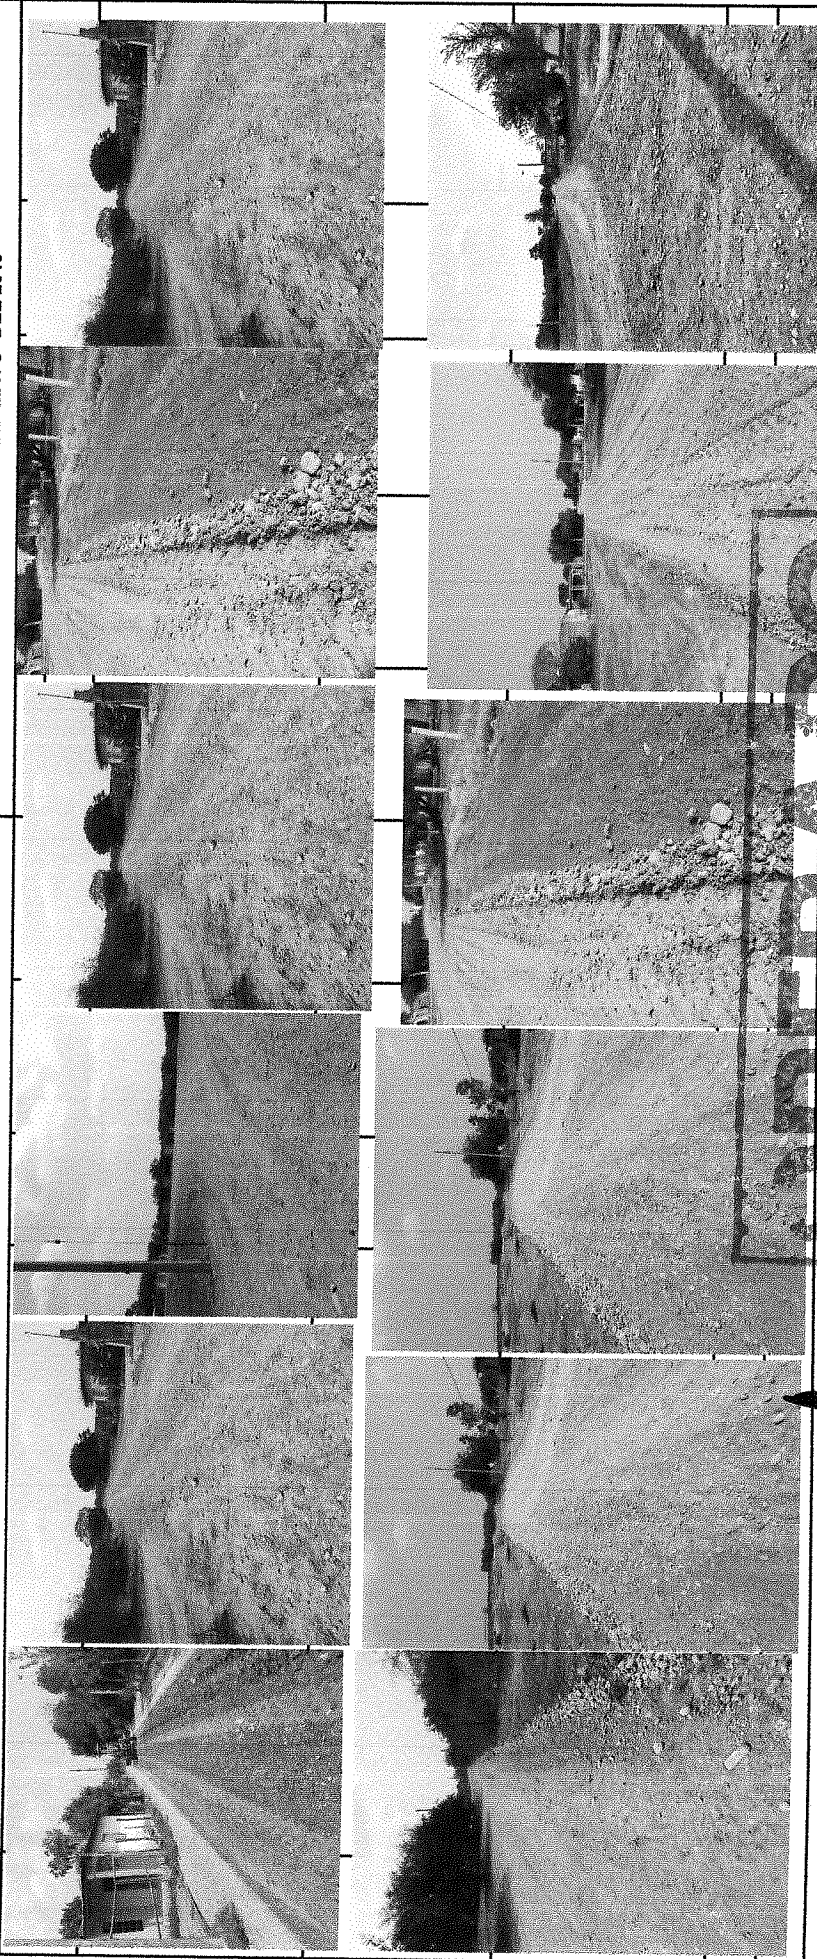

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ





CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

ACORDO A. ALVAREZ

SUPERVISOR

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019

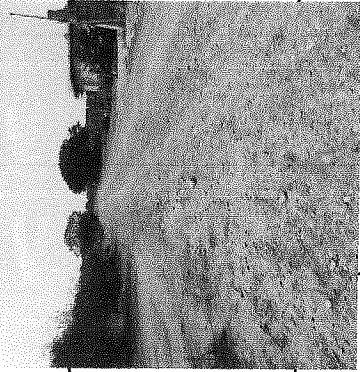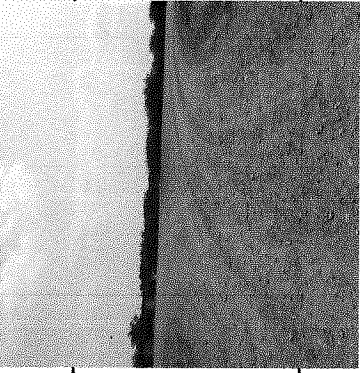
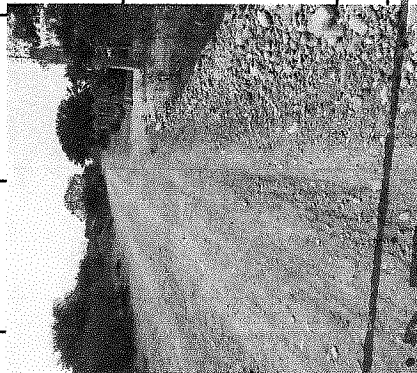
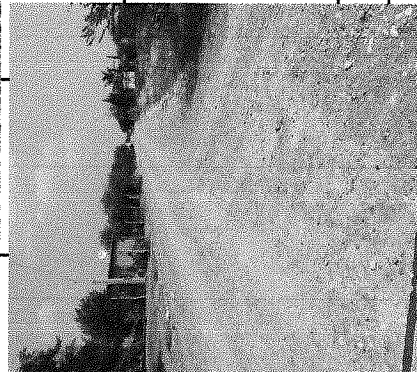
FOTOGRAFIA			
OBRA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 2 DE 2	
LOCALIDAD: EJ. EL MODELO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Nº DE CONTRATO: FH-01-19
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		PLAZO 1 AL 25 DE MAYO	
META: 29,083.10 M2		FECHA: 22 DE MAYO DEL 2019	
			
			
			
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ CONTRATISTA		ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR	

COPIADO
HIDROCARBUROS 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

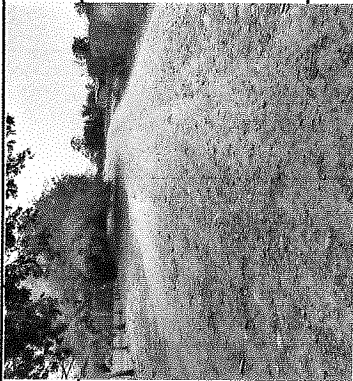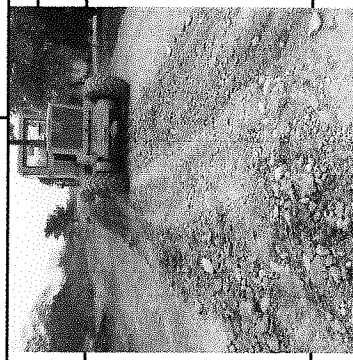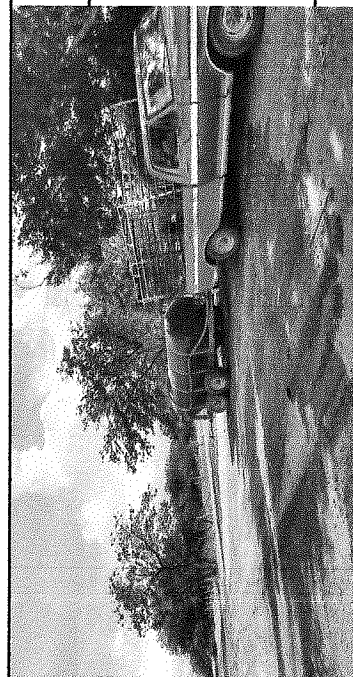

FOTOGRAFIA			
OBRA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 2 DE 2	
LOCALIDAD: EJ. EL MODELO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Nº DE CONTRATO: FH-01-19
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ		PLAZO 1 AL 25 DE MAYO	
META: 29,083.10 M2		FECHA: 22 DE MAYO DEL 2019	
			
			
ING. ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ CONTRATISTA		ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA CORREO A. ALVAREZ Z. SUPERVISOR	

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: FH-01-2019

FECHA: 23 DE MAYO DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 1 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

DOMICILIO FISCAL: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 COL. MAINERO CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P. 87100

R.F.C.: VASA521020A12

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL 23 DÍA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO Y EL **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.


UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


RECIBE:


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Trabajando por el progreso.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-01-19**



I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **22** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALES ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:





ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-01-19



PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	29,083.10
SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	985.46
SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	127.20

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-01-19**



III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. IS-07-2019** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE “**LA CONTRATANTE**” Y “**LA CONTRATISTA**”, CON UN MONTO ORIGINAL DE **\$575,054.43 (QUINIENTOS SETENTAICINCO MIL CINCUENTAICUATRO PESOS 43/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.


IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **21 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS **DEL 1 DE MAYO DEL 2019 AL 25 DE MAYO DEL 2019.**

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **22 DE MAYO DEL 2019**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **22 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	1 DE MAYO DEL 2019 AL 25 DE MAYO DEL 2019	\$495,736.58	0.00	0.00	\$2,974.43	A1 324



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-01-19**



RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$575,054.43	0.00	0.00

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 22 DE **MAYO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN



Palacio Municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021





**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FH-01-19**



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EFRAÍN GONZÁLEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL


TESTIGOS

LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FH/02/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA FH-01-19.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **21** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:


POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL LIC. **EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, LIC. **LUIS DAVID RAMIREZ GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ** SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.


OBLIGACIONES CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 1 DE MAYO DEL 2019 AL 25 DE MAYO DEL 2019



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx




ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FH-01-19

PREPARACION DE LAS TERRACERIAS, CONSISTENTE EN ESCARIFICACION DE 10 CMS. . DE ESPESOR PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA, INCLUYE ACAMELLONADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS AISLADAS ASI COMO MALEZA.	M2	29,083.10
SUB-RASANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	985.46
SUB-RASANTE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ESPESOR , INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	127.20

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 21 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2018.

OPERADO
HIDROCARBUROS 2019



EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPOS.

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.

Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS				

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente al ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ. mediante oficio sin número de fecha 29 DE ABRIL DEL 2019.

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. FH-01-2019

REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio Municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ABASOLO
Trabajando por el progreso.



FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIN DEL ACTA





NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE TERRACERIA EN DIVERSAS CALLES EN EL EJ. EL MODELO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

CONTRATO DE OBRA N.º: FH/01/19

PLAZO DE EJECUCION: 01 DE MAYO DEL 2019 AL 25 DE MAYO DEL 2019.

BITACORA DE OBRA

01/Mayo	Iniciamos los trabajos con la motoconformadora quitando en todas las calles la parte contaminada y retirandola del lugar.
07/Mayo	Se continua los trabajos de limpieza con la moto y un retro y camión para retirar material contaminado.
09/Mayo	Se procedio a la recuperación de la corona y el coneteo para mejorar los pendientes.
14/Mayo	Incorporación de agua para dar firmeza a la calle.
20/Mayo	Se continua con la incorporación de humedad a la compactación.
25/Mayo	Se concluyeron los trabajos.

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA
Lorenzo A. Alvarez Z.
OBRAS PUBLICAS:

ING. ARMANDO DAVID MANOYE SANCHEZ

CONTRATISTA:



ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Siendo las 16:00 hrs. del día del mes de del 2019, reunidos en la localidad de Modelo del Municipio de Abasolo del Estado de Tamps. los CC. , Representante de la Delegación de la SEDESOL, el , Representante de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), y , Representante del Comité de Participación Social FISMDF, e integrantes de los Comités de Participación Social FISMDF, procediendo a la Capacitación en Materia de Participación Social, bajo el siguiente: Temario

- 1) Definición, objetivo y acciones de la Participación Social FISMDF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISMDF y sus funciones; 3) Características del Programa; 4) Funciones y Responsabilidades del Comité de Participación Social FISMDF; 5) Medios institucionales para presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigilancia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MA. Guillermina Medina Mendoza	Presidente	Ma. Guillermina Medina M.
Genia Ileana Hernández	Tesoroero	<i>[Firma]</i>
M.A. Guadalupe J. Pérez	Secretario	Ma. Guadalupe Ortiz P.
Lucia Ruelas Gomez	1º Vocal	Lucia Ruelas
	2º Vocal	
	3º Vocal	

☒ Mujeres Capacitadas: ☒ Hombres Capacitados: () Sub Total: ()
 Otras Beneficiarias Capacitadas: () Otros Beneficiarios Capacitados: () Sub Total: ()
 TOTAL: ()

Ramo: 33 Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Sub Programa: (SI2. PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES)


☒ Obra () Servicio () Acción: Rehabilitación de Terracerías en Diverseas Calles en la Ej. Modelo en el Municipio de Abasolo, Tam.

Ubicación: Ej. Modelo Municipio: Abasolo


Localidad: Ej. Modelo Monto: \$ (\$XXX)

Tipos de Apoyo: Federal () Estatal () Beneficiarios

C. MARTIN CASTILLO TORRES C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CONTRALOR MUNICIPAL



Palacio Municipal
 Guillermo Prieto s/n
 Abasolo, Tamaulipas, C.P. 87760
 Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
 www.abasolo.gob.mx
 2018-2021
 Ayuntamiento de Abasolo Admón.



Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Laura Berenice Orta Muñillo.	Rehabilitación de Terracerías.	2º Vocal	EJ. Modelo	Laura B. Orta M.
Edmundo Felipe Medina Mendoza	" "	3º Vocal	-	Edmundo Felipe M.M.
Lucas Pérez	" "	4º Vocal	-	Lucas Pérez
Maria Silvia Alfaro Enriquez	" "	5º Vocal	-	Maria Silvia Alfaro Enriquez
Maria Elizabeth Sergio Zavala	" "	6º Vocal	-	Maria Elizabeth Sergio Zavala
Rigoberto Zavala Alfaro	" "	7º Vocal	-	Rigoberto Zavala Alfaro
Ildefonso	" "	8º Vocal	-	Ildefonso
Carolina Granados G.	" "	9º Vocal	-	Carolina Granados G.
Carolina G.	" "	10º Vocal	-	Carolina G.
Crescencio del León Valdez	" "	11º Vocal	-	Crescencio del León V
Violeta Almaraz Juárez	" "	12º Vocal	-	Violeta Almaraz J.
		13º Vocal	-	
		14º Vocal	-	

