



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

DATOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
META A CUMPLIR: 90.00 ML
UBICACION: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
RAMO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
IMPORTE: CON IVA TOTAL: \$ 316,788.23
ANTICIPO: NO HABRA ANTICIPO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION: 16 DE ENERO DEL 2019 AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
PERIODO (23 DIAS)
FECHA DE CONTRATO: 14 DE ENERO DEL 2019
LUGAR: MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM, REPRESENTADO POR: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO; EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ EL MISMO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS



CONTRATO DE OBRA

N.º:FM-01-19

ANTECEDENTES

El presente Contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de adjudicación directa en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su reglamento.

DECLARACIONES

1. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

1.1 Necesita ejecutar la obra de **REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM..** La cual beneficiará a esta comunidad.

1.2 Que para su correcta y oportuna realización desea emplear los servicios de una empresa constructora solvente que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con los requisitos de calidad óptima; aplicándose fielmente a las especificaciones requeridas por **"EL MUNICIPIO"**.


1.2 **"EL MUNICIPIO"** está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene personalidad jurídica para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.

1.4 **LA YESIKA YANET SELVERA GARZA, PRESIDENTA MUNICIPAL**, acredita su personalidad y facultades como Presidenta MUNICIPAL por constancia de mayoría y por licencia de la titular conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.5 **EL C. MARTIN CASTILLO TORRES** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO que acredita su personalidad en su carácter de secretario del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam

1.6 **EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS** EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Municipio de Abasolo, Tam, conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.7 **EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que acredita su personalidad en su carácter de contralor del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

1.8 Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Abasolo, Tam, situado en la C. Lázaro Cárdenas y Guillermo Prieto s/n en el Municipio de Abasolo, Tam. C.P. 87760.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Bajo formal protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcance de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Presente Contrato.

2.2 La empresa **CONTRATISTA** denominada **ING. ARMANDO D. VANOYE SÁNCHEZ**, cuenta con R.F.C. **VASA521020A12**

2.3 Tiene establecido su domicilio en Blvd. José López Portillo N° 760 Col. Guadalupe Mainero C.P. 87100, en Ciudad Victoria, Tam., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.4 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del Presente contrato.

2.5 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas y que ratifica su declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 43 de la mencionada Ley.

2.6 Conoce debidamente el sitio de la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.7 **"EL CONTRATISTA"** declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en: **REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019
Palacio Municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

Conforme al objeto del presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar la obra u objeto de este contrato hasta su total terminación. Acatando estrictamente la documentación referente al proyecto ejecutivo, catálogo de obra y programa, que firmados se anexan como parte integrante del presente contrato y como si se insertaran a la letra, así como todo lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Estado y Normas establecidas en los diversos ordenamientos de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal, por lo que es obligación de "EL CONTRATISTA" revisar acuciosamente todos los planos y especificaciones de la obra. En caso de detectar algún posible error, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas para que previa verificación, aprobación en su caso y firma de la supervisión que asigne la Dirección referida, se corrija.

"EL CONTRATISTA" deberá mostrar y explicar ampliamente a "EL MUNICIPIO" para su revisión y aprobación, los procedimientos y criterios técnicos que aplicará para resolver los trabajos objeto de éste contrato. "EL CONTRATISTA" estará sujeto a supervisiones por conducto del personal de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, fungiendo como órgano de vigilancia y control, otorgándole todas las facilidades técnicas y humanas para el buen cumplimiento y ejecución de la presente obra.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo del contratista.

"EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "EL CONTRATISTA" y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es por la cantidad de \$316,788.23 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) 23/100 M.N. Incluido el IVA., integrando en él, todos los conceptos, volúmenes y precios unitarios detallados sobre la base de los cargos directos e indirectos necesarios para entregar puntualmente la obra con la calidad requerida. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por este concepto. Si hubiere conceptos fuera de presupuesto, estos deberán presentarse para autorización previamente a su ejecución; acompañado de: presupuesto y análisis de Precios Unitarios, fotografías, notas de bitácora donde autorizan su ejecución, generadores con croquis y programa de ejecución de los mismos. Dicha suma sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional entre las partes. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO", sea necesario llevar a cabo dichas modificaciones o trabajos extraordinarios, se procederá de la siguiente forma:



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones o trabajos extraordinarios de que se trate, **"EL MUNICIPIO"** estará facultado para ordenarle su ejecución, a **"EL CONTRATISTA"** y éste se obliga a realizarlos conforme dichos precios.

B.- Si para estas modificaciones o trabajos extraordinarios, no existieren conceptos y precios en el contrato y **"EL MUNICIPIO"** considera factible determinarlos con base en los elementos contenidos en los análisis de precios establecidos para la formulación del presupuesto de contrato, procederá a determinarlos con la intervención de **"EL CONTRATISTA"**, y éste, estará obligado a ejecutarlos conforme a tales precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"EL MUNICIPIO"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabulares en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso, **"EL CONTRATISTA"**, estará obligado a ejecutarlos.

D.- Si, aun así, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos A), B) y C), **"EL CONTRATISTA"**, requerimiento de **"EL MUNICIPIO"** y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios, acompañados de sus respectivos análisis. En la inteligencia, de que para fijarlos, deberá aplicar el mismo criterio seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, conforme las especificaciones del proyecto y catálogo de conceptos; debiendo resolver **"EL MUNICIPIO"** en un plazo inmediato. Si ambas partes llegaron a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere éste inciso, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las modificaciones o trabajos extraordinarios conforme a dichos precios.

En el supuesto de que **"EL CONTRATISTA"** no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el párrafo anterior, o bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, **"EL MUNICIPIO"** podrá ordenarle la ejecución de las modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo equipo, personal, etc., que intervengan en estos trabajos.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el día DEL 16 DE ENERO DEL 2019 AL 7 DE FEBRERO DEL 2019 de conformidad con el Programa de la Obra convenido previamente. En un plazo de 23 días.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO.- "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, el sitio en el cual deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, con la salvedad de ocupación u oposición de terceros ajenos a este contrato, igualmente se obliga a expedir las autorizaciones que se requieran para su realización. El retraso en la entrega del sitio prorroga en igual plazo la entrega de la obra. La entrega deberá constar por escrito en la bitácora de obra.



CONTRATO DE OBRA

N.º:FM-01-19

QUINTA. - ANTICIPOS. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO SE OTORGARA ningún anticipo y QUE SE PAGARA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA MEDIANTE EL PAGO DE ESTIMACION UNICA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimación única; debidamente requisitadas con generadores, carátula de estimación y demás documentos de apoyo necesarios, obligatoriamente revisados y calificados por la supervisión de obra de la Dirección de Obras Públicas del Municipio; dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de corte para su validación y firmas. Estas serán pagadas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendario. El pago se realizará en la Tesorería Municipal.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para justificar atraso en los pagos o en la ejecución de la obra.

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y/o verificar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecución de las obras se realicen de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto de la obra realizada, y de comunicar a **"EL CONTRATISTA"**, por escrito, las instrucciones que estime pertinente.

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA", en acatamiento a lo que establecen los Artículos 39 y 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tamaulipas, se obliga a constituir las garantías siguientes:

A.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - Fianza a favor del Municipio de Abasolo, Tam., por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la obra contratada, y deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que **"EL CONTRATISTA"** hubiere recibido copia de la adjudicación. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos de los insumos pactados en este Contrato, cuando durante la vigencia del contrato y la ejecución de la obra dentro del programa correspondiente, ocurran circunstancias de orden económico no previstas dentro del contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción en un 5% (cinco por ciento) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

Con base a la solicitud que presente **"EL CONTRATISTA"** a **"EL MUNICIPIO"**, este llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha en

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019
Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 835 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:FM-01-19

que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido amortizado en su totalidad.

DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos será efectuada en forma total, salvo pacto en contrario que conste por escrito, por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra terminada con estándar de calidad de acuerdo al catálogo de contrato, así como de las modificaciones que durante el proceso de la obra "EL MUNICIPIO" solicite cumpliendo además con los términos comprometidos en programa contratado. "EL CONTRATISTA" avisará por escrito la terminación de la obra y "EL MUNICIPIO".

Realizará la inspección, constatando su conclusión en un plazo de 5 (cinco) días naturales posteriores al aviso. El acto de Entrega-Recepción de los trabajos se llevará a efecto dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, después de que "EL MUNICIPIO" verifique su terminación. Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega, serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Si aparecieren defectos o vicios ocultos dentro del año siguiente a la fecha de recepción por "EL MUNICIPIO", ésta ordenará su reparación o reposición inmediata y "EL CONTRATISTA" se obliga desde ahora a ejecutarla por su cuenta, sin derecho a retribución alguna.


"EL CONTRTISTA" se obliga a presentar el Finiquito del Contrato a más tardar 15 días después de terminada la obra, en la inteligencia, de que, de no cumplir con este requisito. "EL MUNICIPIO" resolverá con los documentos que obren en su poder, aún sin la intervención del "EL CONTRATISTA", y éste no podrá anteponer recurso alguno para nulificarlo.

Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A.- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" el valor de la obra recibida.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a "EL CONTRATISTA" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.

C.- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se recibe se liquidará en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

D.- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decimosexta, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "EL MUNICIPIO", el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer, permanentemente en el lugar de la obra a su representante profesional, que fungirá como su Residente de Construcción; el cual, deberá tener conocimiento y poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, deberá presentar Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que lo acredite como Arquitecto o Ingeniero Civil, al momento de la apertura de la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar o rechazar al Representante Profesional.

De acuerdo a la normatividad "EL CONTRATISTA" llevará una bitácora de obra, en hojas foliadas y selladas por "EL MUNICIPIO", la cual debe contener en el encabezado el registro de firmas autorizadas por ambos, para el asiento y autorización de las notas respectivas. La bitácora que en este acto presenta "EL CONTRATISTA", misma que permanecerá en residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos, debiendo las notas de precisar según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional la ubicación. Causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y la fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" se obligan a aceptar la bitácora de obra como un documento anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus asientos se consideran como un elemento contractual.

Esta bitácora registrará el cumplimiento de todas las obligaciones contratadas, constituirá el instrumento legal y técnico donde se asienten los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, y permitirá a los órganos de control y vigilancia el apoyo documental e informativo que requieran las revisiones de las obras.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos objeto de este contrato y que se refieran a los rubros antes citados, por lo que en este acto releva a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil o penal que pudiera derivar de la plantilla de trabajadores de "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan con las normas de calidad establecidas, y que, la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "

[Firmas manuscritas]

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasco, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasco.gob.mx

2019

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.

CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, y daños y perjuicios que por observancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyos caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL MUNICIPIO" tendrá facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa de Obras aprobado vigente. "EL MUNICIPIO" comparará el avance de las mismas conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieran efectuado varias comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal evento de común acuerdo, se hará al Programa las modificaciones que procedan, previa justificación. "EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general.

En caso de suspensión del Presente Contrato, dicho convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza no imputable a "EL CONTRATISTA", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que

[Firma manuscrita]



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurrieran tales eventos.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato o suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DECIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente; lo que deberá efectuarse durante los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de rescisión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de "EL CONTRATISTA" que pudiesen existir, además de lo anterior, la rescisión tendrá lugar en los siguientes casos y se tendrán que tomar las medidas que a continuación se establecen:

A.- "EL MUNICIPIO" procederá a la rescisión del Contrato por alguna de las siguientes causas: cuando "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada o lo suspenda injustificadamente; incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de "EL MUNICIPIO" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como cualquier otra casusa que implique contravención a los términos del Contrato.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión administrativa del Contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, dentro del término de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:FM-01-19

C.- Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".

D.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.


DÉCIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES.- Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL 2019.


**R. AYUNTAMIENTO
POR "EL MUNICIPIO"**




**SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021**


**C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL**




**C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL**


**C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO**




**SECRETARÍA DEL DIRECTOR DE
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021**


**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS
2018 - 2021**



LA CONTRATISTA


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

**REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL
EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

**OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 885 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 16 DE ENERO DEL 2019


ASUNTO: ASIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 ENTRE
CAMILO MANZO Y FELIPE DE LA GARZA
COL. GPE. MAINERO
CD. VICTORIA TAM.

PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA AMPARADA BAJO EL **CONTRATO FM-01-19** LA SUPERVISION POR ESTE DEPARTAMENTO ESTARA A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.


ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACION DE SUPERVISOR

ABASOLO TAM. A 16 DE ENERO DEL 2019

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA SE
INICIARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA FM-02-19 ;**

**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE
10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

**ASI MISMO LA SUPERVISION DE DICHOS TRABAJOS ESTARA A CARGO DE SU SERVIDOR.
ING. JESUS ARMANDO VANOYE SANCHEZ PARA CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACION Y PARA
CUMPLIR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TIEMPO Y FORMA.**

SIN OTRO DE MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
CONTRATISTA**



Haciendo realidad sus ideas



DISEÑOS
Obras Civiles

Redes de A. Potable y Alcantarillado

• Vivienda • Escuelas • Edificaciones • Centros de Salud

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

ABASOLO TAM. A 7 DE FEBRERO DEL 2019.

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA TERMINARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. DEL CONTRATO FH-01-19. PARA CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACION Y PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TIEMPO Y FORMA.

SIN OTRO DE MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ
CONTRATISTA





Liberty Fianzas

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.



POLIZA DE FIANZA

Lugar: CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS A 14 DE ENERO DE 2019

Fianza No. 2057447-0000

Fiado: VANOYE SANCHEZ ARMANDO DAVID *****

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Monto: \$31,678.82

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Treinta y Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 82/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 16 DE ENERO DE 2019

DOMICILIO DEL FIADO: BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760, COL. GUADALUPE MAINERO, C.P. 87100, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALLE LAZARO CARDENAS Y GUILLERMO PRIETO SIN NUMERO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS C.P. 87760

ANTE: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

POR ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760, COL. GUADALUPE MAINERO C.P. 87100, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VASA521020A12 EL CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS Y BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN MODALIDAD: DE ADJUDICACION DIRECTA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO FM-01-19 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, Y POR LA OTRA PARTE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, RELATIVO A: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. CON UN IMPORTE DE \$316,788.23 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARA CUANDO ASI LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO. LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA DE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.-FIN DE TEXTO.-

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14X8NdNcM

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte



ARMANDO DAVID**Vanoye Sanchez****INGENIERIA CIVIL**

Haciendo realidad sus ideas

I - Factura - VERSIÓN 3.3**A1 299****No. de serie del CSD del emisor**

0000100000409115676

Fecha y Hora de emisión

2019-02-07T15:40:05

Folio Fiscal

EF1EED29-2B20-11E9-899C-00155D014009

Emisor

RFC: VASA521020A12

Razón Social: ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

2019-02-07T15:40:06

No. de serie del CSD del SAT

0000100000403557578

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90.00	LM - Metro lineal	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$315,149.67 (TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM-01-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE FC=150KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 AL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM ClaveProdServ - 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	3,034.37	273,093.30

TOTAL EN LETRA:**TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN**

Subtotal	273,093.30 MXN
IVAT 0.160000	43,694.93 MXN
RET. CONTRALORIA MPAL.	1,365.47 MXN
0.50	
RETENCION 0.10	273.09 MXN
Total	315,149.67 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EF1EED29-2B20-11E9-899C-00155D014009|2019-02-07T15:40:06|TBN040609RKA|RhrCYrgT7pZzsPB88IXp1JLVGfx2b7UsVpnnvGNHbEQyy4z3yHJpNq2ufQGulDgFaQwim7xJmDXsse2Jb0cCYa4PDHqR6NW5EKY+ac5iIC5yWaD/Ex2i0j+6mTdmGMOw1JUvsmUXXyLJSL7Z8FTp9ORUSYznBLIXShCg/2LstDeA78CDcae0AldphDTIBo2Vh3DJB6N6K1rYskmO5eThnxgQRKQoYkPnC31zf39yEiibIWrtDKBQI035k5+j38D++1r+URD37dyT0Z+uYNgZKhCYFZowTWCer9MymOJnouW917EZlplkwP63xb0bktMTBSDIXWBfmlXsDP+VJ0A==|0000100000403557578||

Sello digital del emisor

RhrCYrgT7pZzsPB88IXp1JLVGfx2b7UsVpnnvGNHbEQyy4z3yHJpNq2ufQGulDgFaQwim7xJmDXsse2Jb0cCYa4PDHqR6NW5EKY+ac5iIC5yWaD/Ex2i0j+6mTdmGMOw1JUvsmUXXyLJSL7Z8FTp9ORUSYznBLIXShCg/2LstDeA78CDcae0AldphDTIBo2Vh3DJB6N6K1rYskmO5eThnxgQRKQoYkPnC31zf39yEiibIWrtDKBQI035k5+j38D++1r+URD37dyT0Z+uYNgZKhCYFZowTWCer9MymOJnouW917EZlplkwP63xb0bktMTBSDIXWBfmlXsDP+VJ0A==

Sello digital del SAT

Y1562rkinSGzF97Lt+SqMbQlQWA52zTxJw4uoRlx13xpZ1kMH/M2LmnyUO068FN2CaPdWuj2IR4oW8hEc6lbeOht2HJ8BMcCpMEXCRIM47MC8J8/qg+i70491oOS+ALmVNBGwviCD+JH83FnAUoPTBIFhIaxHrW1+5TmY/HPUYMdGylfQWrlGxOup0bzFe185ISQvn0XEr5Wg+s2yGJNmGFISDj2YxuyVZlR0IUTB0CkmlGsydkk7yUfG1GFxLaU4zVrrw0K/rKncPm46AC87xGfpy4JaOr9+ruKTeInmNmSSppZU+7UfxQ7kU8jym/lyxCP08ORCQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.facturax.com>

Página 1 de 1



Pagos SPEI enviados

Fecha: 12/02/2019

Hora: 07:50:19

Página: 1

Fecha Valor: 12/02/2019 Clave de Rastreo: HSBC049223
Fecha de proceso de la instrucción: 12/02/2019 Hora de proceso de la instrucción: 13:33:49 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4062214390
Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante: FM0119
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 315,149.67

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072810002156902634 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
Banco Beneficiario: BANORTE/IXE
Concepto de Pago:



*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

Informe procesado por: GARZA, YESIKA (MUNICIPIO21)

Autorización del pago > Detalles > Acuse de recibo - Pago preferente (autorizar)

Fecha valor (dd/mm/aaaa)	12/02/2019
Referencia de la instrucción	24745ED00J2A
Referencia del cliente	FM0119
Cuenta de débito	MXHBMICA4062214390
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	315,149.67
Nombre del beneficiario	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
Banco beneficiario	BANORTE/IXE
Cuenta de crédito o beneficiario	072810002156902634
Estado	En proceso por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe 2 Feb 2019 07:29:13 GMT

-Fin del informe-

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



RECEIVED

R E C I B O					
OBRA:REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.					
LOCALIDAD: E.J. GUIA DEL PORVENIR		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	RAMO: FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		Nº DE CONTRATO: FM-01-19
CONTRATISTA:		ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ			ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
DOMICILIO: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760 COL. G.P.E. MAINERO CD. VICTORIA, TAM.					
		R.F.C.	IMP. DEL CONTRATO		7 DE FEBRERO DEL 2019
		VASA521020A12	\$ 316,788.23		
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		\$	\$ 315,149.66		BUENO POR: \$ 316,788.23
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)					FECHAS DE EJECUCION
					DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.:		TRABAJOS DE:		OBRA:REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	
1 (UNICA)		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:			
ANTIPOPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	MONTO ASIGNADO \$ 316,788.23	
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PAGOS ANTERIORES	
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SUB-TOTAL \$ 316,788.23	
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 273,093.30	
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AMORTIZACION DE ANTICIPO	
D E D U C C I O N E S			SUB-TOTAL \$ 273,093.30		
0.10% RETENCION	\$ 273.09		I.V.A. \$ 43,694.93		
0.50% SECODAM:	\$ 1,365.47		TOTAL \$ 316,788.23	\$ 316,788.23	
TOTAL DE DEDUCCIONES			\$ 1,638.57		
AVANCES			PENA CONVENCIONAL	0.50 % DE SECODAM: \$ 1,638.57	
FISCO	100%	FINANCIERO	ACUM. ANTERIOR	NETO A PAGARMENTO \$ 315,149.66	
PROGRAMADO %	100%		ACTUALIZACION	SALDO DE ASIGNACION \$ 0.00	
ESTIMADO %	100%		DEVALUACION		
			POB. AFECTADA		
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		C. HOMERO COMEA REYES	LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCOBILLA		
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SECRETARIA MUNICIPAL		
		OBRAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		
			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
			2018 - 2021		

ESTIMACION

REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		Nº DE CONTRATO: FM-01-19					
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019							
META: 540.00 M2				FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE (\$)		
1	EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	M3	\$ 107.79	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	\$	8,730.90	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	\$ 489.56	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	\$	264,362.40	
								SUBTOTAL	\$	273,093.30	
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA							
CONTRATISTA				SUPERVISOR							

OTPRADO
PORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 1 DE 11
GENERADOR N°: 1 (UNICO)

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM				Nº DE CONTRATO: FM-01-19		PERIODO DE EJECUCION:DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019				
META:: 540.00 M2						FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019						
		PROF		LARGO	ANCHO	UNIDAD	TOTAL	ANT	PRESENTE	ACUM	EXED	POR EFEC
1	EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	81	0.15	90.00	6.00	M3	81.00	0	81.00	81.00	0.00	0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	540	1	90.00	6.00	M2	540.00	0	540.00	540.00	0.00	0.00

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

CONTRATISTA

Lorenzo A. Alvarez Z.

SUPERVISOR

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 1 DE 11

CROQUIS

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACIÓN DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUJA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: EJ. GUJA DEL PORVENIR	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-01-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
META 540.00 M2		7 DE FEBRERO DEL 2019	

90.00 M.L.
7W 00'9

TERMINADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

ING. ARMANDO DAVID YANUZE SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

Lorenzo A. Alvarez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR Nº: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR





MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

Nº DE CONTRATO: FM-01-19

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO
AL 7 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019

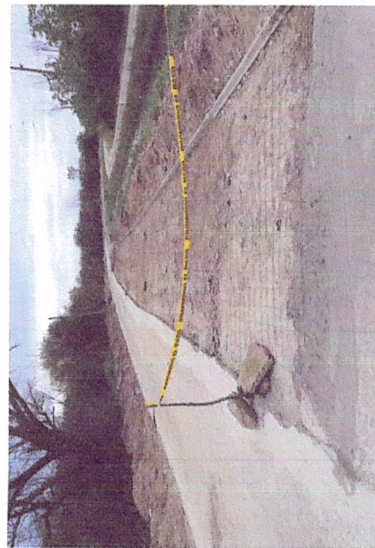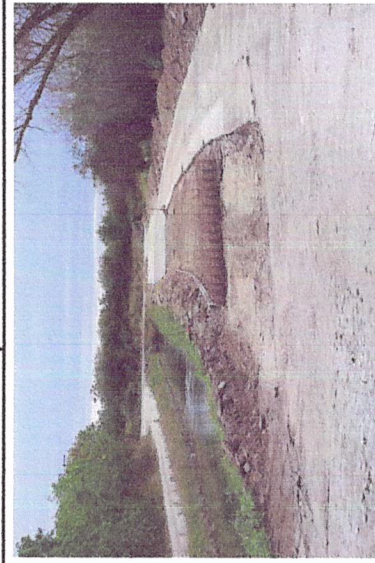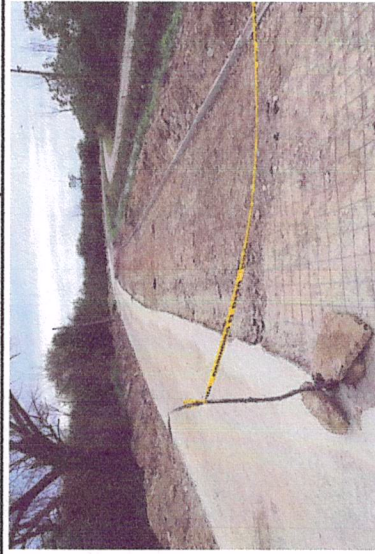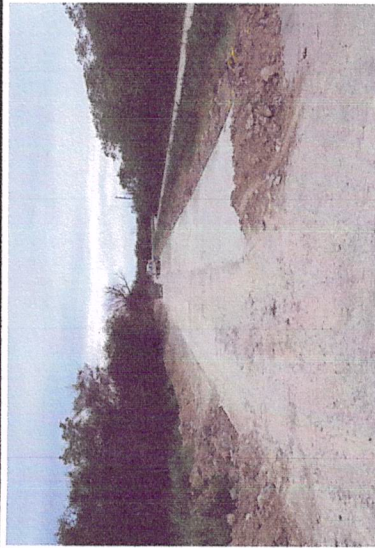

OPERADO

ING. ARMANDO DAVID MANRIQUE SANCHEZ

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Lorenzo A. Alvarez

CONTRATISTA

SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.





LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

N° DE CONTRATO: FM-01-19

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO
AL 7 DE FEBRERO DEL 2019

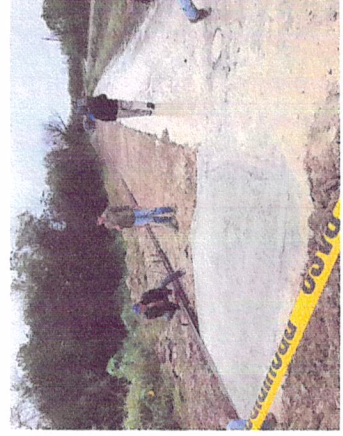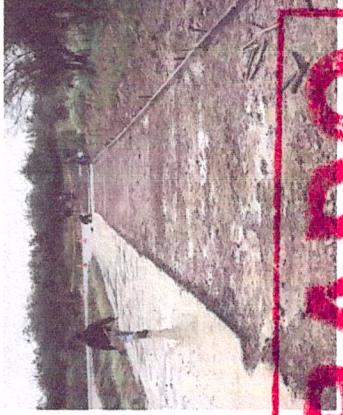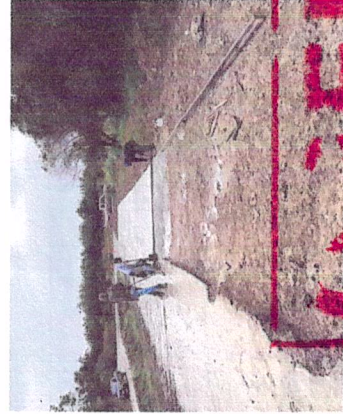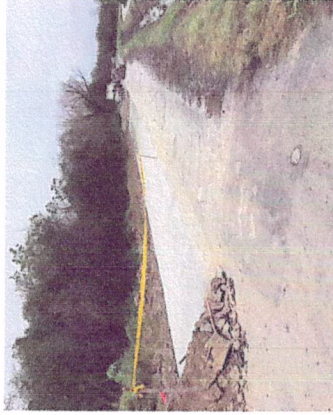

ING. ARMANDO DAMIAN VILLALBA SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

OT-E-RADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: FM-01-19

FECHA: 8 DE FEBRERO DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DE 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO #760. COL. MAINERO C.P. 87100

R.F.C.: VASA521020A12

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 8 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO Y EL **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021


ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Trabajando por el progreso

**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-2018**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **7** DEL MES DE **FEBRERO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL LIC **EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, LIC. **LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONFERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-2018**



EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	M3	81.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	540.00

III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. FM-01-2019**. DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 316,788.23 (TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.





**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-2018**



IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 23 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2019 AL 7 DE FEBRERO DEL 2019.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **7 DE FEBRERO DEL 2019**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **23 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	16 DE ENERO DE 2019 AL 7 DE FEBRERO DEL 2019	\$373,093.30	0.00	0.00	\$1,638.57	A1 299

RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 316,788.23	0.00	0.00





**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-2018**



VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA"** **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 7 DE **FEBRERO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.





**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-2018**



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS



LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIN DEL ACTA





ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FM/01/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA FM-01-19.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA 7 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:


POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM., LA **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

OBLIGACIONES CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 16 DE ENERO DEL 2019 AL 7 DE FEBRERO DEL 2019.





EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	M3	81.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	540.00

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 23 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019.

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipo: NO HUBO ANTICIPO

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.





Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
UNICA				

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente al **ING.ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** mediante oficio sin número de fecha **14 DE ENERO DEL 2019.**

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. **FM-01-2019**

REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.






ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FM-01-19



FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-----**FIN DEL ACTA**-----

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM


CONTRATO DE OBRA N.º : FM/01/19

PLAZO DE EJECUCION: 16 DE ENERO DEL 2019 AL 7 DE FEBRERO DEL 2019.

PLAZO REAL	DEL	DE	AL
------------	-----	----	----

BITACORA DE OBRA

16/Enero	HOY Iniciamos Con Equipo de Trabajo Arqueo de Material Limpieza, Trazo y Nivelación.
21/Enero	Excavación Con la Retra. en el Terreno.
26/Enero	Traslado de Material Graba y Arena, Malla ElectroSoldada, Cemento y Todo lo Necesario para su buen funcionamiento.
29/Enero	Colocación de Malla ElectroSoldada.
7/Febrero	Instalacion de Concreto Hidráulico para su buen funcionamiento Asi termina la Obra.



OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

IC: LUIS DAVID GARZA RAMIREZ
OBRAS PUBLICAS:

ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ:
CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE
ABASOLO



Tam
TAMAULIPAS



Fecha de instalación: (5/01/19)

Nombre del funcionario municipal

Cargo del funcionario municipal


P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, de igual forma me permito invitarle el día 5 del mes de Enero del año en curso, a la instalación del Comité de Participación Social FISMDF, el cual fungirá como un espacio para recibir y atender las demandas de los ciudadanos respecto de las obras de infraestructura social básica que requiera el municipio y que estén contenidas en el Catálogo de obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal conforme a la normativa vigente.

Nota: Se anexa calendario de programación de Formación de Comité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


Yesika Yanet Selvera Garza

Presidente municipal


HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Director de Obras Públicas



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021





ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Siendo las 16:00 hrs. del día 5 del mes de Enero del 2019, reunidos en la localidad de Guadalupe, del Municipio de Abasolo del Estado de Tamps., los CC. _____, Representante de la Delegación de la SEDESOL, el _____, Representante de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), y _____, Representante del Comité de Participación Social FISMDF, e integrantes de los Comités de Participación Social FISMDF, procediendo a la Capacitación en Materia de Participación Social, bajo el siguiente: Temario

1) Definición, objetivo y acciones de la Participación Social FISMDF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISMDF y sus funciones; 3) Características del Programa; 4) Funciones y Responsabilidades del Comité de Participación Social FISMDF; 5) Medios institucionales para presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigilancia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alvarez Adriana Maximo	Presidente	Maximo Alvarez
Sanchez Avalos Manuel	Tesorero	Manuel Sanchez
Garcia Garcia Gilberto	Secretario	X
Arreola Cuatrecasas Santo	1º Vocal	X
Ramos Cardenas Juan	2º Vocal	X
Moriz Rodriguez Guillermo	3º Vocal	El Duro B

✓ Mujeres Capacitadas: () Hombres Capacitados: () Sub Total: ()
Otras Beneficiarias Capacitadas: () Otros Beneficiarios Capacitados: () Sub Total: ()
TOTAL: ()

Ramo: 33 Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Sub Programa: (S12. PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES)
() Obra () Servicio () Acción: Rehabilitación de 90.00 m² de Acero.
Con concreto Hidráulico de 10 cm. de Espesor.
en el Ej. Gra. del pavimento en el municipio de
Abasolo Tam.
Ubicación:
Localidad: Gra. del pavimento.
Monto: \$ 316,788.23
Tipos de Apoyo: () Federal () Municipal () Beneficiarios

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

C. HOMERO CONDE BRASIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRALOR MUNICIPAL
Municipio de Abasolo Admón.
2018 - 2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx





Anexo 2.2. Formato de invitación a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: 5 de Enero 2019

(C.


Vecinos del Municipio de Abasolo

Presentes

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, en referencia a las obras que se financiaran con los recursos del FISMDF, para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a la Capacitación en Materia de Participación Social FISMDF, para el seguimiento de Obras programadas para el ejercicio fiscal 2019; la cita es el próximo 5 de Enero) del año en curso, a las 10:00, en las instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal de Abasolo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Yesika Yanet Selvera Garza

Presidente municipal


HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Director de Obras Públicas

OPERADO
FORTALECIMIE ITC MUNICIPAL 2019

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021





Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

[illegible]

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx






Anexo 3. Formato para registrar las actividades desarrolladas por los Comités de Participación Social FISMDF

Actividades desarrolladas por el Comité de Participación Social FISMDF del Municipio de _____	
No. de obras revisadas:	Rehabilitación de 90.00 u.c. de Acceso de Concreto
No. obras directas:	Rehabilitación
No. obras complementarias:	Rehabilitación
Monto FISMDF revisado:	#316,788.23
Monto FISMDF en proyectos directos:	#316,788.23
Monto FISMDF en proyectos complementarios:	#6
No. de integrantes del comité:	
Actividades desarrolladas por los integrantes del Comité:	



Yesika Yanet Selvera Garza
Presidente Municipal



HOMERO CONDE RODRIGUEZ.
Director de obras





Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los Comités de participación social FISMDF

Fecha de la Interposición:			Ejercicio:	
QUEJA	DENUNCIA	SUGERENCIA	NO. REGISTRO:	
X			01	

NOMBRE DE LA QUEJA, DENUNCIA Y/O SUGERENCIA

--

DATOS DE LA OBRA

Ubicación o dirección:		
Localidad: <u>Gua del panch</u>	Municipio: <u>Abasolo</u>	Estado: <u>Tamaulipas</u>

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROMOVENTE

Anónimo: _____	
Nombre Completo: _____	
Sexo: _____	Edad: _____
Ocupación: _____	Escolaridad: _____
Teléfono: _____	
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.	
Si la queja, denuncia y/o sugerencia es de un Servidor Público, anotar nombre, dependencia, cargo	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
Fecha	Nombre y Firma de quien recibe la queja, denuncia y/o sugerencia
Acuse de recibo	
Fecha	Nombre y Firma



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 335 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



