



CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

DATOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.
META A CUMPLIR: 54.00 M2
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
RAMO: GASTO CORRIENTE
IMPORTE: CON IVA TOTAL: \$ 44,028.00
ANTICIPO: NO HABRA ANTICIPO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION: DEL 12 DE MARZO AL 26 DE MARZO DEL 2019
PERIODO (15 DIAS)
FECHA DE CONTRATO: 11 DE MARZO DEL 2019
LUGAR: MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM, REPRESENTADO POR: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO; EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ EL MISMO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

[Firma]

[Firma]

[Firma]

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

ANTECEDENTES

El presente Contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de adjudicación directa en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su reglamento.

DECLARACIONES

1. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- 1.1 Necesita ejecutar la obra de **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.** La cual beneficiara a esta comunidad.
- 1.2 Que para su correcta y oportuna realización desea emplear los servicios de una empresa constructora solvente que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con los requisitos de calidad óptima; aplicándose fielmente a las especificaciones requeridas por **"EL MUNICIPIO"**.
- 1.2 **"EL MUNICIPIO"** está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene personalidad jurídica para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.
- 1.4 **LA YESIKA YANET SELVERA GARZA, PRESIDENTA MUNICIPAL**, acredita su personalidad y facultades como Presidenta MUNICIPAL por constancia de mayoría y por licencia de la titular conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
- 1.5 **EL C. MARTIN CASTILLO TORRES** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO que acredita su personalidad en su carácter de secretario del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.
- 1.6 **EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS** EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Municipio de Abasolo, Tam, conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
- 1.7 **EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que acredita su personalidad en su carácter de contralor del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

1.8 Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Abasolo, Tam, situado en la C. Lázaro Cárdenas y Guillermo Prieto s/n en el Municipio de Abasolo, Tam. C.P. 87760.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Bajo formal protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcance de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Presente Contrato.

2.2 La empresa **CONTRATISTA** denominada **ING. ARMANDO D. VANOYE SÁNCHEZ**, cuenta con R.F.C. **VASA521020A12**

2.3 Tiene establecido su domicilio en Blvd. José López Portillo N° 760 Col. Guadalupe Mainero C.P. 87100, en Ciudad Victoria, Tam., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.4 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del Presente contrato.

2.5 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas y que ratifica su declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 43 de la mencionada Ley.

2.6 Conoce debidamente el sitio de la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.7 "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en: **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

Conforme al objeto del presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar la obra u objeto de este contrato hasta su total terminación. Acatando estrictamente la documentación referente al proyecto ejecutivo, catálogo de obra y programa, que firmados se anexan como parte integrante del presente contrato y como si se insertaran a la letra, así como todo lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Estado y Normas establecidas en los diversos ordenamientos de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal, por lo que es obligación de "EL CONTRATISTA" revisar acuciosamente todos los planos y especificaciones de la obra. En caso de detectar algún posible error, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas para que previa verificación, aprobación en su caso y firma de la supervisión que asigne la Dirección referida, se corrija.

"EL CONTRATISTA" deberá mostrar y explicar ampliamente a "EL MUNICIPIO" para su revisión y aprobación, los procedimientos y criterios técnicos que aplicará para resolver los trabajos objeto de éste contrato. "EL CONTRATISTA" estará sujeto a supervisiones por conducto del personal de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, fungiendo como órgano de vigilancia y control, otorgándole todas las facilidades técnicas y humanas para el buen cumplimiento y ejecución de la presente obra.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo del contratista.

"EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "EL CONTRATISTA" y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es por la cantidad de \$ **44,028.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICHO PESOS 00/100 M.N.)**. Incluido el IVA., integrando en él, todos los conceptos, volúmenes y precios unitarios detallados sobre la base de los cargos directos e indirectos necesarios para entregar puntualmente la obra con la calidad requerida. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por este concepto. Si hubiere conceptos fuera de presupuesto, estos deberán presentarse para autorización previamente a su ejecución; acompañado de: presupuesto y análisis de Precios Unitarios, fotografías, notas de bitácora donde autorizan su ejecución, generadores con croquis y programa de ejecución de los mismos. Dicha suma sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional entre las partes. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO", sea necesario llevar a cabo dichas modificaciones o trabajos extraordinarios, se procederá de la siguiente forma:



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones o trabajos extraordinarios de que se trate, **"EL MUNICIPIO"** estará facultado para ordenarle su ejecución, a **"EL CONTRATISTA"** y éste se obliga a realizarlos conforme dichos precios.

B.- Si para estas modificaciones o trabajos extraordinarios, no existieren conceptos y precios en el contrato y **"EL MUNICIPIO"** considera factible determinarlos con base en los elementos contenidos en los análisis de precios establecidos para la formulación del presupuesto de contrato, procederá a determinarlos con la intervención de **"EL CONTRATISTA"**, y éste, estará obligado a ejecutarlos conforme a tales precios.


C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"EL MUNICIPIO"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabulares en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso, **"EL CONTRATISTA"**, estará obligado a ejecutarlos.

D.- Si, aun así, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos A), B) y C), **"EL CONTRATISTA"**, requerimiento de **"EL MUNICIPIO"** y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios, acompañados de sus respectivos análisis. En la inteligencia, de que para fijarlos, deberá aplicar el mismo criterio seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, conforme las especificaciones del proyecto y catálogo de conceptos; debiendo resolver **"EL MUNICIPIO"** en un plazo inmediato. Si ambas partes llegaron a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere éste inciso, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las modificaciones o trabajos extraordinarios conforme a dichos precios.

En el supuesto de que **"EL CONTRATISTA"** no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el párrafo anterior, o bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, **"EL MUNICIPIO"** podrá ordenarle la ejecución de las modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo equipo, personal, etc., que intervengan en estos trabajos.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - **"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el día DEL 12 DE MARZO AL 26 DE MARZO DEL 2019 de conformidad con el Programa de la Obra convenido previamente. En un plazo de 15 días.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO.- **"EL MUNICIPIO"** se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, el sitio en el cual deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, con la salvedad de ocupación u oposición de terceros ajenos a este contrato, igualmente se obliga a expedir las autorizaciones que se requieran para su realización. El retraso en la entrega del sitio prorroga en igual plazo la entrega de la obra. La entrega deberá constar por escrito en la bitácora de obra.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

QUINTA. - ANTICIPOS. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO SE OTORGARA ningún anticipo y QUE SE PAGARA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA MEDIANTE EL PAGO DE ESTIMACION UNICA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimación única; debidamente requisitadas con generadores, carátula de estimación y demás documentos de apoyo necesarios, obligatoriamente revisados y calificados por la supervisión de obra de la Dirección de Obras Públicas del Municipio; dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de corte para su validación y firmas. Estas serán pagadas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendario. El pago se realizará en la Tesorería Municipal.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para justificar atraso en los pagos o en la ejecución de la obra.


SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y/o verificar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecución de las obras se realicen de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto de la obra realizada, y de comunicar a **“EL CONTRATISTA”**, por escrito, las instrucciones que estime pertinente.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”, en acatamiento a lo que establecen los Artículos 39 y 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tamaulipas, se obliga a constituir las garantías siguientes:

A.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - Fianza a favor del Municipio de Abasolo, Tam., por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la obra contratada, y deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que **“EL CONTRATISTA”** hubiere recibido copia de la adjudicación. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos de los insumos pactados en este Contrato, cuando durante la vigencia del contrato y la ejecución de la obra dentro del programa correspondiente, ocurran circunstancias de orden económico no previstas dentro del contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción en un 5% (cinco por ciento) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

Con base a la solicitud que presente **“EL CONTRATISTA”** a **“EL MUNICIPIO”**, este llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha en



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido amortizado en su totalidad.

DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos será efectuada en forma total, salvo pacto en contrario que conste por escrito, por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra terminada con estándar de calidad de acuerdo al catálogo de contrato, así como de las modificaciones que durante el proceso de la obra "EL MUNICIPIO" solicite cumpliendo además con los términos comprometidos en programa contratado. "EL CONTRATISTA" avisará por escrito la terminación de la obra y "EL MUNICIPIO".

Realizará la inspección, constatando su conclusión en un plazo de 5 (cinco) días naturales posteriores al aviso. El acto de Entrega-Recepción de los trabajos se llevará a efecto dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, después de que "EL MUNICIPIO" verifique su terminación. Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega, serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Si aparecieren defectos o vicios ocultos dentro del año siguiente a la fecha de recepción por "EL MUNICIPIO", ésta ordenará su reparación o reposición inmediata y "EL CONTRATISTA" se obliga desde ahora a ejecutarla por su cuenta, sin derecho a retribución alguna.


"EL CONTRTISTA" se obliga a presentar el Finiquito del Contrato a más tardar 15 días después de terminada la obra, en la inteligencia, de que, de no cumplir con este requisito. "EL MUNICIPIO" resolverá con los documentos que obren en su poder, aún sin la intervención del "EL CONTRATISTA", y éste no podrá anteponer recurso alguno para nulificarlo.

Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A.- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" el valor de la obra recibida.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a "EL CONTRATISTA" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.

C.- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba se liquidará en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

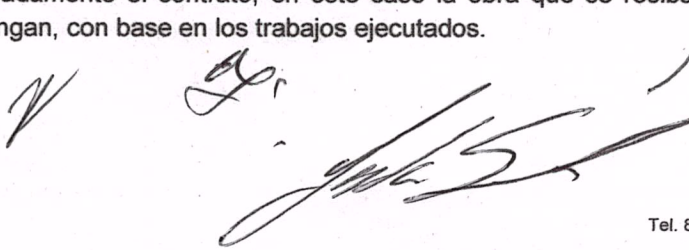

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

D.- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decimosexta, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "EL MUNICIPIO", el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer, permanentemente en el lugar de la obra a su representante profesional, que fungirá como su Residente de Construcción; el cual, deberá tener conocimiento y poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, deberá presentar Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que lo acredite como Arquitecto o Ingeniero Civil, al momento de la apertura de la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar o rechazar al Representante Profesional.


De acuerdo a la normatividad "EL CONTRATISTA" llevará una bitácora de obra, en hojas foliadas y selladas por "EL MUNICIPIO", la cual debe contener en el encabezado el registro de firmas autorizadas por ambos, para el asiento y autorización de las notas respectivas. La bitácora que en este acto presenta "EL CONTRATISTA", misma que permanecerá en residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos, debiendo las notas de precisar según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional la ubicación. Causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y la fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" se obligan a aceptar la bitácora de obra como un documento anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus asientos se consideran como un elemento contractual.

Esta bitácora registrará el cumplimiento de todas las obligaciones contratadas, constituirá el instrumento legal y técnico donde se asienten los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, y permitirá a los órganos de control y vigilancia el apoyo documental e informativo que requieran las revisiones de las obras.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos objeto de este contrato y que se refieran a los rubros antes citados, por lo que en este acto releva a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil o penal que pudiera derivar de la plantilla de trabajadores de "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan con las normas de calidad establecidas y que, la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, y daños y perjuicios que por observancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyos caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL MUNICIPIO" tendrá facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa de Obras aprobado vigente. "EL MUNICIPIO" comparará el avance de las mismas conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.


Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieran efectuado varias comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal evento de común acuerdo, se hará al Programa las modificaciones que procedan, previa justificación. "EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general.

En caso de suspensión del Presente Contrato, dicho convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza no imputable a "EL CONTRATISTA", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que



CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurrieran tales eventos.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato o suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.


Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DECIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente; lo que deberá efectuarse durante los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de rescisión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de "EL CONTRATISTA" que pudiesen existir, además de lo anterior, la rescisión tendrá lugar en los siguientes casos y se tendrán que tomar las medidas que a continuación se establecen:

A.- "EL MUNICIPIO" procederá a la rescisión del Contrato por alguna de las siguientes causas: cuando "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada o lo suspenda injustificadamente; incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de "EL MUNICIPIO" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como cualquier otra casusa que implique contravención a los términos del Contrato.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión administrativa del Contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, dentro del término de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga.



CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

C.- Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".

D.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.


DÉCIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES.- Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º:GC-03-19

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2018.

POR "EL MUNICIPIO"
R. AYUNTAMIENTO



**SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021**



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL



**OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021**


C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
**DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PUBLICOS**

LA CONTRATISTA


ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 6 DE MARZO DEL 2019

ASUNTO: ADJUDICACION DIRECTA

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760

COL. MAINERO

C.P. 87100

VICTORIA TAM.

PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**

LA PRESENTACION ANEXO AL PRESENTE PRESUPUESTO BASE EL CUAL DEBERA PRESENTARLO EN HOJA MEMBRETADA CON SU RAZON SOCIAL PARA FIRMA DEL CONTRATO. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE MUNICIPIO. DEBIDAMENTE FIRMADA.

LA FIRMA DEL CONTRATO SERA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 A LAS 11:00HRS. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA SERA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019

LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA SERA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARÁ A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



**MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 12 DE MARZO DEL 2019
ASUNTO: ASIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA**


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760
COL. MAINERO
C.P. 87100
VICTORIA TAM.

PRESENTE:

**POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE
LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO GC-03-19 LA SUPERVISION POR ESTE
DEPARTAMENTO ESTARA A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.**

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Haciendo realidad sus ideas



DISEÑOS

Obras Civiles

Redes de A. Potable y Alcantarillado

• Vivienda • Escuelas • Edificaciones • Centros de Salud

SUPERVISOR

AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACION DE

2019.

ABASOLO TAM. A 12 DE MARZO DEL

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

Por medio del presente le informo que con esta fecha se iniciaron los trabajos correspondientes a la:

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN
UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**

Amparados con el contrato GC-03-19, y a lo cual su servidor Ing. Armando David Vanoye Sánchez supervisara los trabajos para atender cualquier observación o sugerencia de parte de la supervisión del municipio y así cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
CONTRATISTA**



obra

Aviso de terminación de

Abasolo Tam. A 26 DE MARZO DEL 2019.

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

Por medio del presente le informo que con esta fecha terminaron los trabajos correspondientes a la:


**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN
UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**

Del contrato GC-03-19. Para cualquier sugerencia u observación y para cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ
Contratista**



ARMANDO DAVID
Vanoye Sanchez

INGENIERIA CIVIL
Haciendo realidad sus ideas

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A1 311

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409115676

Fecha y Hora de emisión

2019-03-26T14:07:48

Folio Fiscal

D4348921-5002-11E9-BBD8-00155D014009

Emisor

RFC: VASA521020A12

Razón Social: ARMANDO DAVID VANOEY SANCHEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-03-26T14:07:49

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
54.00	MTK - Metro cuadrado	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$43,800.26 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA (CC-03-19) REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. ClaveProdServ - 30103600 - Productos estructurales	702.87	37,955.17

TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 26/100 MXN

Subtotal

37,955.17 MXN

IVAT 0.160000

RET. CONTRALORIA MPAL.

0.50

RETENCION 0.10

Total

6,072.83 MXN

189.78 MXN

37.96 MXN

43,800.26 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D4348921-5002-11E9-BBD8-00155D014009|2019-03-26T14:07:49|TBN040609RKA|SQarIGqbmMthlZg0zF8yQFAyfpC0gP6UySwMNOS8nEaxV1c|BEyGGGU+RakRpJjah5eIQrSWy+2o9Z|pwo1tJMIzmeXSEy/r24pUQIOHfUaYpRbab2fWBgudZsDrBYBIEYb8LdE7LC|I7o8BQWUMAHacgvovAyzhRo2r7AjrEhVJoB8H0JhyJur1JLbD74Z18LIZKN6FnLv+gptOKQ+L33YkCdGGJIKqXrfrdnlu7qBvRw1HFwt3y9nt84onbzC9sChMF2cYdlAmOrZAIi0NugU/Ht6X018HhKNjwXbbEQnY1wE1OhaKQtPd hZqCaydLoDxnxy49SZAnLsWldw==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

sqarIGqbmMthlZg0zF8yQFAyfpC0gP6UySwMNOS8nEaxV1c|BEyGGGU+RakRpJjah5eIQrSWy+2o9Z|pwo1tJMIzmeXSEy/r24pUQIOHfUaYpRbab2fWBgudZsDrBYBIEYb8LdE7LC|I7o8BQWUMAHacgvovAyzhRo2r7AjrEhVJoB8H0JhyJur1JLbD74Z18LIZKN6FnLv+gptOKQ+L33YkCdGGJIKqXrfrdnlu7qBvRw1HFwt3y9nt84onbzC9sChMF2cYdlAmOrZAIi0NugU/Ht6X018HhKNjwXbbEQnY1wE1OhaKQtPd hZqCaydLoDxnxy49SZAnLsWldw==

Sello digital del SAT

FLymHSCIFVvzKqSJkqWYwAzREO+J9GBYj+V8Oqmo+30/DdXh6U4xpu7QzOVvouTUd/zrwVGJjriydn9ZgPlqBCYBRlw9sKdvAk7A9PqafB FhxsMcmuwUX5rZvV/cE5XW2HjBsJWAIYVhQ5Kx8chn5iuMp7tazm37LkiELE7UXMpVJCgI9rPHSM0IBXIV0IXRMGOPrJ+2aeBMFN9drZroovS g89YV5to5LHU2M4Ug/OZBZBsUwSa/4FaJXWP0cUBkSLbF4uVWlZqWJCRGduwApDngF576d6sE6JooAopKexMox5Wnsg2D342qTctzLAEJ gxnKyvWrqM4A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.facturax.com>

ARMANDO DAVID
Vanoye Sanchez

INGENIERIA CIVIL
CALLE 130 # 400 000 000 000 000

I - Factura - VERSION 3.3

A1 311

No. de serie del CSD del emisor
00001000000409115676

Fecha y Hora de emisión
2019-03-26T14:07:48

Folio Fiscal
D4348921-5002-11E9-BBD8-00155D014009

Emisor

RFC: VASA521020A12

Razón Social: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-03-26T14:07:49

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
54.00	MTK - Metro cuadrado	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$43,800.26 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA GC-03-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. ClaveProdServ - 30103600 - Productos estructurales	702.87	37,955.17

TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 26/100 MXN

Subtotal	37,955.17 MXN
IVAT 0.160000	6,072.83 MXN
RET. CONTRALORIA MPAL. 0.50	189.78 MXN
RETENCION 0.10	37.96 MXN
Total	43,800.26 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1D4348921-5002-11E9-BBD8-00155D014009|2019-03-26T14:07:49|TBN040609RKA|SQarIGqbmMthiZg0zF8yQFAyfp0gP6UySwMNOS8nEaxV1c|BEyGGGU+RakRpJjah5eiQLrSWy+2o8Z/pwo1JMIzmeXSEyir24pUQIOH|UaYpRbab2fWBgudZsDrBYBIEYb8LdE7LC|7o8BQWUMAhacgvozAyzhRo2r7AjrEVJoB8H0Jhyjur1JLbD74Z18LIZKN6FnLv+gptoKQ+L33YkCdGQJIKqXrIndniu7qBvRw1HFvt3y9nt84onbzC9sChMF2cYdIAmOrZAIff0NugU/Ht6X018HhKNjwXbbEQnY1wE1DhaKQIPd hZqCaydLoDxmxy49SZAnLeWldw==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

SQarIGqbmMthiZg0zF8yQFAyfp0gP6UySwMNOS8nEaxV1c|BEyGGGU+RakRpJjah5eiQLrSWy+2o8Z/pwo1JMIzmeXSEyir24pUQIOH|UaYpRbab2fWBgudZsDrBYBIEYb8LdE7LC|7o8BQWUMAhacgvozAyzhRo2r7AjrEVJoB8H0Jhyjur1JLbD74Z18LIZKN6FnLv+gptoKQ+L33YkCdGQJIKqXrIndniu7qBvRw1HFvt3y9nt84onbzC9sChMF2cYdIAmOrZAIff0NugU/Ht6X018HhKNjwXbbEQnY1wE1DhaKQIPd hZqCaydLoDxmxy49SZAnLeWldw==

Sello digital del SAT

HSCFVvtzkSJkqWYwA2REO+J8GBYJ+V86Oame+30DdXh6U4xpu7QzOVvouTUDzrzvVGJrIuydn9ZgPiqBCYBRlw9sKdvAk7A9PqafB .muwUX5rZvV/cE5XW2HJBsUWAIVVhQ5Kx8chn5iuMp7Iazm37LkHELE7UXMpVJcgl9rPHSM0IBXV0IXRMG0PrJ+2aeBMMFN9drZroovS geu1VStoSLH2M4UG/OZB2BsUWsa/4FajCXWP9cUBkSL8B4uVWlqWJCRGuDwApDNqFS76d6sE6JooAoPkeXmox5Wnsq2D342qTCzLAEJ gxmKyvWrgM4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura electrónica en <http://www.facturax.com>

HSBC | **Pago Prioritario****Usted ha autorizado este pago**

El estatus de este pago 80015FK00BP9 es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Referencia numérica	80015FK00BP9
Tipo de Transacción	Pago Prioritario
Impreso en	27 Marzo 2019 13:08

Pagar desde

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
MX MXHBMICA4062214382 MXN

Beneficiario

ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
MX 072810002156902634

Importe

MXN 43,800.26

Fecha valor (dd/mm/aaaa) 27 Marzo 2019

Su Referencia GC0319

Ubicación del banco beneficiario México

Identificador del Banco beneficiario Código del Banco 072

Banco Beneficiario BANORTE/IXE



Pagos SPEI enviados

Fecha: 27/03/2019

Hora: 07:08:51

Página: 1

Fecha Valor:	27/03/2019	Clave de Rastreo:	HSBC053778
Fecha de proceso de la instrucción:	27/03/2019	Hora de proceso de la instrucción:	13:08:32 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4062214382
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante:	GC0319
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	43,800.26

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072810002156902634	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	
Banco Beneficiario:	BANORTE/IXE	
Concepto de Pago:		

*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

6104 6160 440280

Datos de la Fianza
FOLIO 1101380

Movimiento : POLIZA
Fianza : 19A17215
Ramo : ADMINISTRATIVO
Subramo : OBRA
Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD
Moneda : PESOS
Agente : 855155
Nombre : FIDEL BALDERAS RODRIGUEZ
División : FORANEA
Monto Total de la Fianza: \$4,402.80

R.F.C. Fiado : VASA521020A12
Endoso : 19A17215
Monto Afianzado del Movimiento \$4,402.80

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

ANTE: EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

PARA GARANTIZAR POR: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, CON DOMICILIO EN: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO, No.760 A, COL. GUADALUPE MAINERO, C.P.87100, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VASA521020A12, EL CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO NUMERO GC-03-19, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y POR LA OTRA PARTE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, RELATIVO A: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMÚN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM", CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$44,028.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO.

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARÁ CUANDO ASÍ LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE CONSTITUYE FIADORA DE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.*** FIN DE TEXTO ***


MIGUEL ÁNGEL ROBLES SAN MARTIN
JEFE DE OFICINA

TAMPICO, TAMAULIPAS A 11 DE MARZO DE 2019

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
 Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
 Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
 a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
 b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Fianzas Dorama, S.A.
 Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
 Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
 Del. Benito Juárez, Ciudad de México
 Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
 R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 019A 1721 5110 1380

M11C86/Z3T+Dvc2NQB+w-jqyNSFAxGxFRIMtug+L7Ukdd50U8FUVOKWxHfHmuOqHVvEYKSLuGwWjgic
 M7/8mFHTobv9EPFwvSKPl+H0EusadDagAbfCQ3HqS-8mkkmChbTgnY4g8IS+uCEZ5hs8mDbel3M=


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE
ABASOLO



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE		Nº DE CONTRATO: GC-03-19	
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	RAMO: RECURSO DEL GASTO CORRIENTE	ESTIMACION: No. 1 (UNICA)	
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		26 DE MARZO DEL 2019	
DOMICILIO: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760 COL. GPE. MAINERO CD. VICTORIA, TAM.		BUENO POR: \$ 44,028.00	
R.F.C. VASA521020A12		FECHAS DE EJECUCION	
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO: (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 126/100 M.N.)		DEL 12 AL 26 DE MARZO DEL 2019	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.:		NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.	
1 (UNICA)		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	
ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D E D U C C I O N E S			
0.10% RETENCION	\$	37.96	
0.50% SECODAM:	\$	189.78	
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	227.74	
AVANCES		PENA CONVENCIONAL	
FISICO	100%	FINANCIERO	ACUM. ANTERIOR
PROGRAMADO %	100%		ACTUAL
ESTIMADO %	100%		DEVOLUCION
POR APLICAR		POR APLICAR	
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		C. HOMERO CONDÉ	
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES \$ 227.74	
NETO A PAGAR		NETO A PAGAR \$ 43,800.26	
SALDO DE ASIGNACION		SALDO DE ASIGNACION \$0.00	
C. MARTIN GARCIA TORRES		C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA	
SECRETARIO MUNICIPAL		CONTRATISTA MUNICIPAL	
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021		MUNICIPAL 2018 - 2021	

ESTIMACION

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: RECURSO DEL GASTO CORRIENTE		Nº DE CONTRATO: GC-03-19					
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				PLAZO DE EJECUCION DEL 12 AL 26 DE MARZO DEL 2019							
META: 54.00 M2										26 DE MARZO DEL 2019	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE (\$)		
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 9.00 X 6.00	m2	\$ 8.67	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	\$	468.20	
2	CONSTRUCCION DE CIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BASE DE 70 X 70 X 70 CMS. CON DADO DE 35 X 40 CMS. DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE MONTE DE 5" X 6", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	pza	\$859.90	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	\$	2,579.70	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 COLUMNAS DE MONTE DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CALIBRE 14 , INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	€ 459.00	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	\$	3,993.30	
4	ESTRUCTURA METALICA CON POLIN DE 4"X3" CAL 14 ,INCLUYE , PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	\$ 228.00	46.50	0.00	46.50	46.50	0.00	\$	10,602.00	
5	POLIN METALICO CON POLIN DE 4"X3" DOBLE EN EXTREMO INFERIOR CAL 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	\$ 409.00	18.60	0.00	18.60	18.60	0.00	\$	7,607.40	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 20" CAL. 26 MONTADA EN POLIN DE 4"X3" ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m2	\$ 235.27	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	\$	12,704.58	
SUBTOTAL									\$	37,955.18	
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA							
											
CONTRATISTA				SUPERVISOR							

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: RECURSO DEL GASTO CORRIENTE		Nº DE CONTRATO: GC-03-19					
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				PLAZO DE EJECUCION DEL 12 AL 26 DE MARZO DEL 2019							
META: 54.00 M2										26 DE MARZO DEL 2019	
CLAVE	CONCEPTO	ANCHO	LARGO	ALTURA	PZAS	TOTAL	PRESUPUESTO	EXEDENTE	PRESENTE		
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 9.00 X 6.00	9.00	6.00			54.00	54.00	0.00	54.00		
2	CONSTRUCCION DE CIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BASE DE 70 X 70 X 70 CMS. CON DADO DE 35 X 40 CMS. DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION				3.00	3.00	3.00	0.00	3.00		
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CALIBRE 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			2.90	3.00	8.70	8.70	0.00	8.70		
4	ESTRUCTURA METALICA CON POLIN DE 4"x3" CAL 14 ,INCLUYE , PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.		9.30		5.00	46.50	46.50	0.00	46.50		
5	POLIN METALICO CON POLIN DE 4"x3" DOBLE EN EXTREMO INFERIOR CAL 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.		9.30		2.00	18.60	18.60	0.00	18.60		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 20" CAL. 26 MONTADA EN POLIN DE 4"x3", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	9.00	6.00			54.00	54.00	0.00	54.00		
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ CONTRATISTA										ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA Notario A. Alvarez Z. SUPERVISOR	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 1 DE 11
GENERADOR N°: 1 (UNICO)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

#|REF|


MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

N° DE CONTRATO: GC-03-19

PLAZO DE EJECUCION DEL 12
AL 26 DE MARZO DEL 2019

META: 54.00 M2

26 DE MARZO DEL 2019

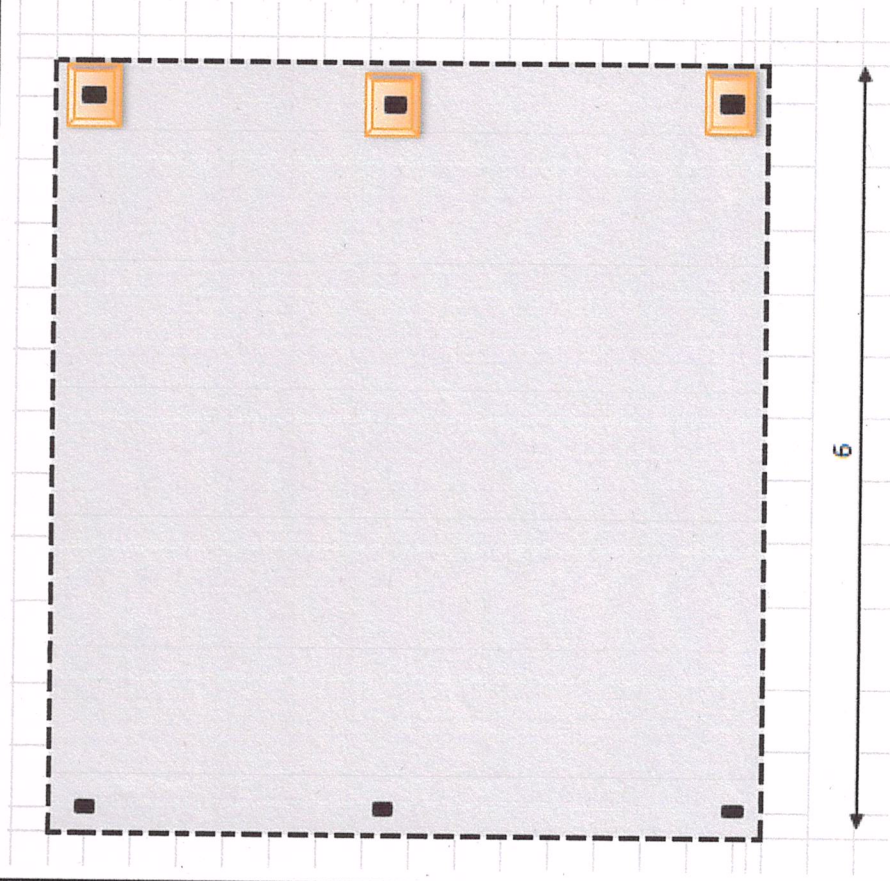

ALTURA 3.55 ML.

ALTURA 2.95 ML.

ING. ARMANDO D. MOYER SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

Lorenzo A. Alvarez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 1 DE 11

FOTOGRAFIA

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

#|REF|


MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

N° DE CONTRATO: GC-03-19

PLAZO DE EJECUCION DEL 12
AL 26 DE MARZO DEL 2019

META: 54.00 M2

26 DE MARZO DEL 2019

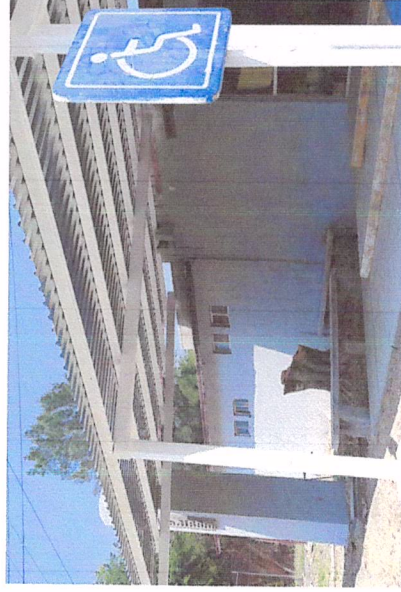

ING. ARMANDO DAVID YANUZE SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

Lorenzo A. Alvarez

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: GC-03-19

FECHA: 27 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES:

**OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN
UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ RN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**

PLAZO DE EJECUCIÓN: DE 12 DE MARZO AL 26 DE MARZO DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO #760. COL. MAINERO C.P. 87100


R.F.C.: VASA521020A12

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO Y EL **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:



ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO

**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-03-19**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **26** DEL MES DE **FEBRERO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALES ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING.ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-03-19**



TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 9.00 X 6.00	m2	54.00
CONSTRUCCION DE CIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BASE DE 70 X 70 X 70 CMS. CON DADO DE 35 X 40 CMS. DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6",INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	pza	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CALIBRE 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	8.70
ESTRUCTURA METALICA CON POLIN DE 4"X3" CAL 14 ,INCLUYE , PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	46.50
POLIN METALICO CON POLIN DE 4"X3"DOBLE EN EXTREMO INFERIOR CAL 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	18.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 20" CAL. 26 MONTADA EN POLIN DE 4"X3",INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m2	54.00



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-03-19**



III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. GC-03-2019**, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 44,028.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **23 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2019 AL 26 DE MARZO DEL 2019.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **26 DE MARZO DEL 2019**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **23 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$ S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	12 DE MARZO DEL 2019 AL 26 DE MARZO DEL 2019	\$37,955.18	0.00	0.00	\$227.74	A1 311



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-03-19**



RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 44,028.00	0.00	0.00

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ.** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 26 DE **MARZO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-03-19**



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS

LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

-----**FIN DEL ACTA**-----



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **GC/03/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA GC-03-19.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **26 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID RAMIREZ GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** SUBDIRECTOR DE **INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DIVID VANOYE SANCHEZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

OBLIGACIONES CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 12 DE MARZO DEL 2019 AL 26 DE MARZO DEL 2019



TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 9.00 X 6.00	m2	54.00
CONSTRUCCION DE CIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BASE DE 70 X 70 X 70 CMS. CON DADO DE 35 X 40 CMS. DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6",INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	pza	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CALIBRE 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	8.70
ESTRUCTURA METALICA CON POLIN DE 4"X3" CAL 14 ,INCLUYE , PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	46.50
POLIN METALICO CON POLIN DE 4"X3"DOBLE EN EXTREMO INFERIOR CAL 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	18.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 20" CAL. 26 MONTADA EN POLIN DE 4"X3",INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m2	54.00

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 12 DE MARZO AL 26 DE MARZO DEL 2019.

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPOS.

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.

Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS				

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente al ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ mediante oficio sin número de fecha 11 DE MARZO DEL 2019.

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. GC-03-2019

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.



FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS

LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-----**FIN DEL ACTA**-----

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

CONTRATO DE OBRA N.º : GC/03/19

PLAZO DE EJECUCION: 12 DE MARZO DEL 2019 AL 26 DE MARZO DEL 2019.

BITACORA DE OBRA

[illegible]

LIC: LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

OBRAS PUBLICAS:

ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

CONTRATIST

MUNICIPIO DE
ABASOLO



Tam
TAMAULIPAS



Fecha de instalación: (1/Marzo)

Nombre del funcionario municipal

Cargo del funcionario municipal


P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, de igual forma me permito invitarle el día 1 del mes de Marzo del año en curso, a la instalación del Comité de Participación Social FISMDF, el cual fungirá como un espacio para recibir y atender las demandas de los ciudadanos respecto de las obras de infraestructura social básica que requiera el municipio y que estén contenidas en el Catálogo de obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal conforme a la normativa vigente.

Nota: Se anexa calendario de programación de Formación de Comité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


Yesika Yanet Selvera Garza

Presidente municipal


HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Director de Obras Públicas



ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Siendo las 6:00 hrs. del día 1 del mes de Marzo del 2019, reunidos en la localidad de Cabeza de Vaca del Municipio de Abasolo del Estado de Tamps, los CC. _____, Representante de la Delegación de la SEDESOL, el _____, Representante de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), y _____, Representante del Comité de Participación Social FISDMF, e integrantes de los Comités de Participación Social FISDMF, procediendo a la Capacitación en Materia de Participación Social, bajo el siguiente: Temario

1) Definición, objetivo y acciones de la Participación Social FISDMF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISDMF y sus funciones; 3) Características del Programa; 4) Funciones y Responsabilidades del Comité de Participación Social FISDMF; 5) Medios institucionales para presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigilancia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

NOMBRE	CARGO	FIRMA

Mujeres Capacitadas: () Hombres Capacitados: () Sub Total: ()
 Otras Beneficiarias Capacitadas: () Otros Beneficiarios Capacitados: () Sub Total: ()
 TOTAL: ()

Ramo: 33 Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Sub Programa: (S12. PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES)
 () Obra () Servicio () Acción: Construcción de Techumbre Metálica
9.00 x 6.00 mts. En Ancha Comon Ubicada en la
Calle Hidalgo entre Calle ENDAI y Calle Mendez en
la Cabecera municipal de Abasolo Tamps.
 Ubicación:
 Localidad: Cabeza municipal. Municipio: Abasolo.
 Monto: # 44,800.00
 Tipos de Apoyo: () Federal () Estatal () Municipal () Beneficiarios

C. MARTIN CASTILLO TORRES
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Municipio de Abasolo Admón.
 2018-2021



Anexo 2.2. Formato de invitación a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: 1 Marzo

(C.


Vecinos del Municipio de E. Dolores

Presentes

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, en referencia a las obras que se financiarán con los recursos del FISMDF, para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a la Capacitación en Materia de Participación Social FISMDF, para el seguimiento de Obras programadas para el ejercicio fiscal 2019; la cita es el próximo 1 de Marzo del año en curso, a las 6:00 en las instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal de Abasolo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Yesika Yanet Selvera Garza

Presidente municipal


HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Director de Obras Públicas




Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

[illegible]



Anexo 3. Formato para registrar las actividades desarrolladas por los Comités de Participación Social FISMDF

Actividades desarrolladas por el Comité de Participación Social FISMDF del Municipio de _____	
No. de obras revisadas:	Construccion de Techumbre Metalica.
No. obras directas:	Construccion de Techumbre Metalica.
No. obras complementarias:	Construccion de Techumbre Metalica.
Monto FISMDF revisado:	#44,815.49
Monto FISMDF en proyectos directos:	# 44,815.49
Monto FISMDF en proyectos complementarios:	
No. de integrantes del comité:	
Actividades desarrolladas por los integrantes del Comité:	
 Yesika Yanet Selvera Garza Presidente Municipal  HOMERO CONDE RODRIGUEZ Director de obras	



Fecha de la Interposición:			Ejercicio:	
QUEJA	DENUNCIA	SUGERENCIA	NO. REGISTRO:	
X			01	

NOMBRE DE LA QUEJA, DENUNCIA Y/O SUGERENCIA

--

DATOS DE LA OBRA

Ubicación o dirección:		
Localidad: <i>Cabecera m.</i>	Municipio: <i>Abasolo</i>	Estado: <i>Tamaulipas</i>

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROMOVENTE

Anónimo:	
Nombre Completo:	
Sexo:	Edad:
Ocupación:	Escolaridad:
	Teléfono:
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.	
Si la queja, denuncia y/o sugerencia es de un Servidor Público, anotar nombre, dependencia, cargo	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
Fecha	Nombre y Firma de quien recibe la queja, denuncia y/o sugerencia
Acuse de recibo	
Fecha	Nombre y Firma

Municipio de Abasolo Admón.

2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2019.

ANEXO PLAN DE OBRA 2019									
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019									
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	CANT.	Monto Presupuesto Aprobado				
1	CUARTOS DOMINATORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO		3.00	\$23,715.00				
2	CUARTOS DOMINATORIO	CARECERA MUNICIPAL		3.00	\$347,572.50				
3	CUARTOS DOMINATORIO	DOLORES		2.00	\$31,716.00				
4	CUARTOS DOMINATORIO	EL PARRAS DE LA FUENTE		5.00	\$59,807.50				
5	CUARTOS DOMINATORIO	COL. BEATRIZ ANAYA		5.00	\$59,807.50				
6	CUARTOS DOMINATORIO	DOLORES		5.00	\$59,807.50				
7	CUARTOS DOMINATORIO	CARECERA MUNICIPAL		1.00	\$15,857.50				
8	CUARTOS DOMINATORIO	CARECERA MUNICIPAL		1.00	\$15,857.50				
9	CUARTOS DOMINATORIO	CARECERA MUNICIPAL		5.00	\$59,807.50				
10	CUARTOS DOMINATORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO		5.00	\$59,807.50				
11	CUARTOS DOMINATORIO	EL EL MODELO		2.00	\$23,716.00				
12	CONSTRUCCION DE 12.71 MZ DE LOZAS MONOLITICAS	EL JESUS RAMIREZ		3.00	\$347,572.50				
13	CONSTRUCCION DE 12.71 MZ DE LOZAS MONOLITICAS	CARECERA MUNICIPAL		1.00	\$15,857.50				
14	CONSTRUCCION DE 12.71 MZ DE LOZAS MONOLITICAS	EL EL MODELO Y J. RAMIREZ		1.00	\$15,857.50				
15	CUARTOS DOMINATORIO	EL EL MODELO		126.71	\$1,621,005.42				
16	CUARTOS DOMINATORIO	DOLORES		126.71	\$1,621,005.42				
17	CUARTOS DOMINATORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO		1.00	\$15,857.50				
18	CUARTOS DOMINATORIO	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		1.00	\$15,857.50				
19	CUARTOS DOMINATORIO	DOLORES		8.00	\$95,739.50				
20	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 1.10 X 1.10	EL EL MODELO		14.00	\$182,000.00				
21	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 1.10 X 1.10	EL EL MODELO		5.00	\$64,643.75				
22	AMPLIACION DE BUREAU SANITARIO CON 7 DESCARGAS	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		10.00	\$128,000.00				
23	AMPLIACION DE BUREAU SANITARIO CON 9 DESCARGAS	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		5.00	\$64,643.75				
24	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. NICOLAS BRAVO		155.70	\$1,983,750.00				
25	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		100	\$1,280,000.00				
26	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		100	\$1,280,000.00				
27	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		100	\$1,280,000.00				
28	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		100	\$1,280,000.00				
29	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		100	\$1,280,000.00				
30	CONSTRUCCION DE 470 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	COL. CANJONES LERMA		120	\$1,536,000.00				
31	CONSTRUCCION DE 470 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		120	\$1,536,000.00				
32	CONSTRUCCION DE 470 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		120	\$1,536,000.00				
33	CONSTRUCCION DE 470 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA		120	\$1,536,000.00				
34	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
35	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
36	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
37	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
38	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
39	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
40	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
41	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
42	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
43	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
44	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
45	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
46	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
47	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
48	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
49	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
50	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
51	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
52	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
53	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
54	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
55	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
56	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
57	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
58	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
59	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
60	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
61	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
62	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
63	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
64	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
65	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
66	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
67	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
68	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
69	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
70	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
71	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
72	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
73	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
74	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
75	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
76	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
77	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
78	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
79	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
80	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
81	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
82	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
83	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
84	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
85	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
86	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
87	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
88	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
89	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
90	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
91	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
92	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
93	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
94	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
95	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
96	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
97	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
98	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
99	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				
100	REHABILITACION DE ACERVO	EL PARRAS DE LA FUENTE		240.00	\$3,072,000.00				

PLAN DE OBRA PUBLICA 2019

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS RECURSOS MARTINOS 2019					
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	CANT.	Monto Presupuesto Aprobado
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	NCP. GUADALUPE VICTORIA	CALLE RIO SAN LORENZO ENTRE RIO PIAXTLA Y CALLE SIN NOMBRE	1.00	\$ 30,536.52
TOTAL					\$ 30,536.52
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE 2019					
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	CANT.	Monto Presupuesto Aprobado
1	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO	NCP. DOLORES		1.00	\$ 87,778.16
2	REHABILITACION DE TIRADERO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL		1.00	\$ 55,720.53
3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA COMUN	CALLE HIDALGO ENTRE EJIDAL Y MENDEZ		1.00	\$ 44,815.49
4	CONSTRUCCION AMPLIACION DE TECHUMBRE	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAYERS		1.00	\$ 55,344.50
5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4x6x6	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTOS VALDEZ		1.00	\$ 58,574.09
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	PLAZA PRINCIPAL		1.00	\$ 1,389,250.80
TOTAL					\$ 1,731,173.07
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2019					
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE 30.00 ML. DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	EL GUIA DEL PORVENIR		1.00	\$ 316,788.23
2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE	EL GUIA DEL PORVENIR		1.00	\$ 187,524.57
3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	NCP. DOLORES		1.00	\$ 98,972.81
4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	NCP. DOLORES		1.00	\$ 692,042.31
5	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 150.00 ML. DE GUARNICIONES Y 450.00	NCP. GUADALUPE VICTORIA		1.00	\$ 145,027.22
6	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TECHUMBRE	EN LA CALLE M. ALEMAN ENTRE RIO 1 Y RIO 2		1.00	\$ 206,118.93
TOTAL					\$ 1,645,475.07
