

MUNICIPIO DE
ABASOLO



MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Tam
TAMAULIPAS



EXPEDIENTE TECNICO

OBRA No.

FM6315-20

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

MUNICIPIO: ABASOLO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL.

SUB PROGRAMA: AMPLIACION

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO.

II.- TIPO DE OBRA:

NUEVA ()

EN PROCESO ()

AMPLIACION (X)

REHABILITACION ()

COMPLEMENTARIA ()

III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

AMPLACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

IV.- COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION:

\$105,315.83

(PESOS)

V.- ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS):

FEDERAL	\$	
ESTATAL	\$	
MUNICIPAL	\$	\$105,315.83
BENEFICIARIOS	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
SUMA	\$	\$105,315.83

VI.- RECURSOS LIBERADOS:

1a MINISTRACION	\$		FECHA	
2a MINISTRACION	\$		FECHA	
3a MINISTRACION	\$		FECHA	
TOTAL	\$	\$105,315.83		

VII.- NUMERO DE BENEFICIARIOS:

43

VIII.- UNIDAD DE MEDIDA:

ML

TOTALES DEL PROYECTO:

18.00

IX.- FECHA DE INICIO:

01 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA DE TERMINACION:

15 DE AGOSTO DEL 2020

X.- AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 15 DE AGOSTO DEL 2020:

100%

XI.- NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2020:

45

XII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA:

POR CONTRATO

M A C R O L O C A L I Z A C I O N
CROQUIS DE UBICACION DE LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA

AMPLIACION DE 18.00 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COLLA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.



MICROLOCALIZACION
CROQUIS DE UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COLLA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

NORTE



UBICACION DE CUARTOS

NORTE

NOMBRE DE LA
OBRA:

AMPLACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COLLA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.



DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA
OBRA

AMPLACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5
DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL.LA
AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
EQUILIBRIO ECOLOGICO EN LA SECCION V
ARTICULO 28 , ESTA OBRA
NO REQUIERE DE DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL POR SU NATURALEZA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA 2018 - 2021

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

AMPLACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

R. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

NOMBRE Y FIRMA
2018 - 2021

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARTIN CASTILLO TORRES

NOMBRE Y FIRMA
2018 - 2021

CONTRALOR

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

NOMBRE Y FIRMA
2018 - 2021

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA
2018 - 2021





AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

PRESUPUESTO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TRAZO Y NIVELACION (UN TRAZO SOLAMENTE) INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO	ML.	18.00	\$19.50	\$351.00
2	EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 ML. ,INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM. DE DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	16.38	\$332.00	\$5,438.16
3	PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO APISONADA CON EQUIPO Y NIVELADA PARA RECIBIR TUBERIA DE DRENAJE ,INCLUYE MATERIALES ,EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	1.26	\$392.00	\$493.92
4	RELLENO DE COSTILLO DE 60 CMS. DE TUBO PARA PROTECCION CON MATERIAL INERTE FINO DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	6.98	\$388.50	\$2,711.26
5	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO HASTA NIVEL DE RASANTE DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	7.56	\$387.20	\$2,927.23
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PVC DE 8" SERIE 20 INCLUYE:MATERIALES,ENSAMBLE,NIVELACION,PRUEBA DE HERMITICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	18.00	\$996.10	\$17,929.80
7	DEMOLICION DE BANQUETA PARA INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	5.00	\$457.00	\$2,285.00
8	TOMAS CON MANGUERA FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA ;INCLUYE CORTES, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00	\$987.50	\$4,937.50
9	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO PVC 8" ;INCLUYE CORTES, EXCAVACION , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00	\$3,450.80	\$17,254.00
10	DESENSOLVE DE POZOS DE VISITA MANUAL ,INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y ENSOLVE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 500 ML.	PZA.	2.00	\$3,960.00	\$7,920.00
11	INTERCONEXION DE LINEA DE DRENAJE ,INCLUYE DEMOLICION DE POZO DE VISITA COLOCACION Y ENSAMBLE CON CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ,HERRAMIENTAS,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	1.00	\$894.15	\$894.15
12	REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCONFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO.(85.86X7.90/8.16).	M2	689.46	\$32.30	\$22,269.56
13	MOTOCONFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA ,INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.(7.99X35.00)	M2	276.50	\$19.45	\$5,377.93
				SUB TOTAL	\$90,789.51
				16% iva	\$14,526.32
				TOTAL OBRA	\$105,315.83

ELABORO

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO

15 DE JULIO DEL 2020

OPERADO
157 ALCALDIA MUNICIPAL 2020

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	TRAZO Y NIVELACION (UN TRAZO SOLAMENTE) INCLUYE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO				ML
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Materiales				
ESTACA MAD	Estaca de madera de pino	kg	0.02200	\$ 4.50	\$ 0.10
CLAVO	Clavo de 2 1/2"	kg	0.00800	\$ 30.00	\$ 0.24
CAL HIDRA	Cal hidra	kg	0.00400	\$ 20.00	\$ 0.08
PINTURA	Pintura Acrilica	lto	0.02000	\$ 40.00	\$ 0.80
	Suma de Materiales				\$ 1.22
	Mano de Obra				
OP. TOPOGRAFO	1 Op. Topografo	jor	0.00560	\$ 770.00	\$ 4.31
AY. GENERAL	2 Ay. General	jor	0.00350	\$ 1,160.00	\$ 4.06
	Suma de Mano de Obra				\$ 8.37
	Equipo				
EQ. TOPO	Equipo Topografia	hra	0.00850	\$ 25.00	\$ 0.21
	Suma de Equipo				\$ 0.21
	Herramientas				
CONOS	Conos de señalamiento 70 cm	pza	0.01500	\$250.00	\$ 3.75
CINTA	Cinta de advertencia 305 mts	rollo	0.01300	\$68.00	\$ 0.88
BANDERIN	Banderin	pza	0.00420	\$89.90	\$0.38
CARRETE DE HILO	Carrete de hilo de nylon 100 m	pza	0.00350	\$45.00	\$0.16
PICO	Pico	pza	0.00100	\$120.00	\$0.12
PALA	Pala	pza	0.00100	\$120.00	\$0.12
SEÑALAMIENTO	Señalamiento prec. Hombre trabajando	pza	0.00150	\$45.00	\$0.07
	Suma de Herramientas				\$5.48
	Costo Directo				\$ 15.28
	Indirectos			% 8.00	\$ 1.22
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 1.22
	Subtotal				\$ 17.72
	Utilidad			% 10.00	\$ 1.77
	Subtotal				\$ 19.50
					\$ 19.50

**PRECIO UNITARIO
DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.**

15 DE JULIO DEL 2020

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2	EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA PROFUNDIDAD DE 1.30 ML. INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM. DE DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SI EJECUCION.				M3
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
OP. EQ. MAYOR AY. GENERAL	Mano de Obra				
	Op. Eq. Mayor	jor	0.08000	\$ 741.00	\$ 59.28
	2 Ay. General	jor	0.06259	\$ 962.00	\$ 60.21
	Suma de Mano de Obra				\$ 119.49
PALA PICO	Herramientas				
	Pala	pza	0.06550	\$ 120.00	\$ 7.86
	Pico	pza	0.04800	\$ 120.00	\$ 5.76
	Suma de Herramientas				\$ 13.62
CAMION VOLTEO RETROEXCAVADORA	Equipo				
	Camion volteo	jor	0.05340	\$ 1,200.00	\$ 64.08
	Retroexcavadora	jor	0.04500	\$ 1,400.00	\$ 63.00
	Suma de Equipo				\$ 127.08
	Costo Directo				\$ 260.19
	Indirectos			% 8.00	\$ 20.82
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 20.82
	Subtotal				\$ 301.82
	Utilidad			% 10.00	\$ 30.18
	Subtotal				\$ 332.00

PRECIO UNITARIO

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

15 DE JULIO DEL 2020




AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3	PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO APISONADA CON EQUIPO Y NIVELADA PARA RECIBIR TUBERIA DE DRENAJE, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				M3
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Materiales				
MATERIAL AGUA	Material Inerte	m3	0.50000	\$ 220.00	\$ 110.00
	Agua	m3	0.30000	\$ 11.50	\$ 3.45
	Suma de Materiales				\$ 113.45
	Mano de Obra				
AY. GENERAL	2 Ay. General	jor	0.13320	\$ 962.00	\$ 128.14
	Suma de Mano de Obra				\$ 128.14
	Equipo				
BAILARINA	Bailarina	hra	0.15500	\$ 120.00	\$ 18.60
	Suma de Equipo				\$ 18.60
	Costo Directo				\$ 260.19
	Indirectos			% 8.00	\$ 20.82
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 20.82
	Subtotal				\$ 301.82
	Utilidad			% 10.00	\$ 30.18
	Subtotal				\$ 332.00
PRECIO UNITARIO					
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.					

15 DE JULIO DEL 2020

[Handwritten signature]


OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4	RELLENO DE COSTILLO DE 60 CMS. DE TUBO PARA PROTECCION CON MATERIAL INERTE FINO DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD, INCLUYE EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Materiales				
MATERIAL	Material Inerte	m3	0.53000	\$ 220.00	\$ 116.60
AGUA	Agua	m3	0.35000	\$ 11.50	\$ 4.03
	Suma de Materiales				\$ 120.63
	Mano de Obra				
AY. GENERAL	2 Ay. General	jor	0.17416	\$ 962.00	\$ 167.54
	Suma de Mano de Obra				\$ 167.54
	Equipo				
BAILARINA	Bailarina	hra	0.13585	\$ 120.00	\$ 16.30
	Suma de Equipo				\$ 16.30
	Costo Directo				\$ 304.47
	Indirectos			% 8.00	\$ 24.36
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 24.36
	Subtotal				\$ 353.18
	Utilidad			% 10.00	\$ 35.32
	Subtotal				\$ 388.50
					\$ 388.50
PRECIO UNITARIO					
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.					

15 DE JULIO DEL 2020





AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.


ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO HASTA NIVEL DE RASANTE DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD, INCLUYE EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.				M3
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MATERIAL AGUA	Materiales				
	Material Inerte	m3	0.53000	\$ 220.00	\$ 116.60
	Agua	m3	0.35000	\$ 11.50	\$ 4.03
	Suma de Materiales				\$ 120.63
AY. GENERAL	Mano de Obra				
	2 Ay. General	jor	0.17100	\$ 962.00	\$ 164.50
	Suma de Mano de Obra				\$ 164.50
BAILARINA	Equipo				
	Bailarina	hra	0.16115	\$ 120.00	\$ 19.34
	Suma de Equipo				\$ 19.34
	Costo Directo				\$ 304.47
	Indirectos			% 8.00	\$ 24.36
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 24.36
	Subtotal				\$ 353.18
	Utilidad			% 10.00	\$ 35.32
	Subtotal				\$ 388.50
					\$ 388.50

PRECIO UNITARIO

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

15 DE JULIO DEL 2020





AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PVC DE 8" SERIE 20 INCLUYE: MATERIALES, ENSAMBLE, NIVELACION, PRUEBA DE HERMITICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				ML
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TUBO 8"	Tubo 8" y accesorios	ml	0.17000	\$ 110.00	\$ 18.70
LIGA	Liga	pza	2.00000	\$ 25.00	\$ 50.00
	Suma de Materiales				\$ 68.70
Mano de Obra					
OF. PLOMERO	Of. Plomero	jor	0.53438	\$ 741.00	\$ 395.98
AY. GENERAL	2 Ay. General	jor	0.32100	\$ 481.00	\$ 154.40
	Suma de Mano de Obra				\$ 550.38
Herramientas					
PALA	Pala	pza	0.25000	\$ 120.00	\$ 30.00
PICO	Pico	pza	0.45000	\$ 120.00	\$ 54.00
PERICA	Perica	pza	0.25600	\$ 220.00	\$ 56.32
MARTILLO	Martillo	pza	0.23610	\$ 90.00	\$ 21.25
	Suma de Herramientas				\$ 161.57
	Costo Directo				\$ 780.65
	Indirectos			% 8.00	\$ 62.45
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 62.45
	Subtotal				\$ 905.55
	Utilidad			% 10.00	\$ 90.55
	Subtotal				\$ 996.10
					\$ 996.10

PRECIO UNITARIO

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

15 DE JULIO DEL 2020

[Firma]



AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

7	DEMOLICION DE BANQUETAS PARA INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA				PZA
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Mano de Obra				
OP. VEHICULO	Op. Vehiculo	jor	0.05150	\$ 741.00	\$ 38.16
AY. GENERAL	2 ay. General	jor	0.01088	\$ 962.00	\$ 10.47
	Suma de Mano de Obra				\$ 48.63
	Herramientas				
PALA	Pala	pza	0.23505	\$ 120.00	\$ 28.21
PERICA	Perica	pza	0.25600	\$ 220.00	\$ 56.32
MARTILLO	Martillo	pza	0.25000	\$ 90.00	\$ 22.50
MARRO	Marro	pza	0.45000	\$ 350.00	\$ 157.50
	Suma de Herramientas				\$ 264.53
	Mano de Obra				
VEHICULO	Vehiculo de transporte	hra	0.06000	\$ 750.00	\$ 45.00
	Suma de Mano de Obra				\$ 45.00
	Costo Directo				\$ 358.15
	Indirectos			% 8.00	\$ 28.65
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 28.65
	Subtotal				\$ 415.46
	Utilidad			% 10.00	\$ 41.55
	Subtotal				\$ 457.00
					\$ 457.00

PRECIO UNITARIO

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

15 DE JULIO DEL 2020

[Firma]



AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

8	TOMAS CON MANGUERA FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA; INCLUYE CORTES, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA				PZA
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MANGUERA	Materiales				
	Manguera flexible	rollo	0.41000	\$ 640.00	\$ 262.40
	Suma de Materiales				\$ 262.40
OF. PLOMERO AY. GENERAL	Mano de Obra				
	Of. Plomero	jor	0.45774	\$ 755.00	\$ 345.59
	Ay. General	jor	0.26655	\$ 481.00	\$ 128.21
	Suma de Mano de Obra				\$ 473.80
PALA PICO PERICA MARTILLO MARRO	Herramientas				
	pala	pza	0.05000	\$ 120.00	\$ 6.00
	pico	pza	0.03000	\$ 120.00	\$ 3.60
	Perica	pza	0.05000	\$ 220.00	\$ 11.00
	Martillo	pza	0.05000	\$ 90.00	\$ 4.50
	Marro	pza	0.03600	\$ 350.00	\$ 12.60
	Suma de Herramientas				\$ 37.70
	Costo Directo				\$ 773.90
	Indirectos			% 8.00	\$ 61.91
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 61.91
	Subtotal				\$ 897.73
	Utilidad			% 10.00	\$ 89.77
	Subtotal				\$ 987.50
					\$ 987.50
PRECIO UNITARIO					
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.					
15 DE JULIO DEL 2020					

[Handwritten signature]



AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

9	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO PVC 8"; INCLUYE CORTES EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.				PZA
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Materiales				
TUBO PVC	Tubo PVC 8" con accesorios	ml	2.50000	\$ 110.00	\$ 275.00
MAT. INERTE	Material Inerte	ml	1.50000	\$ 140.00	\$ 210.00
	Suma de Materiales				\$ 210.00
	Mano de Obra				
OF. PLOMERO	Of. Plomero	jor	2.25070	\$ 755.00	\$ 1,699.28
AY. GENERAL	Ay. Albañil	jor	1.43630	\$ 481.00	\$ 690.86
	Suma de Mano de Obra				\$ 2,390.14
	Herramientas				
PALA	pala	pza	0.21400	\$ 120.00	\$ 25.68
PICO	pico	pza	0.11310	\$ 120.00	\$ 13.57
	Suma de Herramientas				\$ 39.25
	Equipo				
RETRO	Restroexcavadoras	jor	0.10000	\$ 650.00	\$ 65.00
	Suma de Equipo				\$ 65.00
	Costo Directo				\$ 2,704.39
	Indirectos			% 8.00	\$ 216.35
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 216.35
	Subtotal				\$ 3,137.09
	Utilidad			% 10.00	\$ 313.71
	Subtotal				\$ 3,450.80
					\$ 3,450.80

PRECIO UNITARIO

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.

15 DE JULIO DEL 2020

[Handwritten signature]



**AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS
SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

10	DESENSOLVE DE POZOS DE VISITA MANUAL, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y ENSOLVE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 500 ML.				pza
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Mano de Obra				
AY. GENERAL	3 Ay. General	jor	1.80000	\$ 1,443.00	\$ 2,597.40
	Suma de Mano de Obra				\$ 2,597.40
	Herramientas				
CARRETILLA	Carretilla	pza	0.35271	\$ 750.00	\$ 264.53
PALA	pala	pza	0.25570	\$ 120.00	\$ 30.68
BOTES	Botes	pza	0.26850	\$ 45.00	\$ 12.08
	Suma de Herramientas				\$ 307.30
	Equipo				
VEHICULO	Vehiculo	jor	0.26500	\$ 750.00	\$ 198.75
	Suma de Equipo				\$ 198.75
	Costo Directo				\$ 3,103.45
	Indirectos			% 8.00	\$ 248.28
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 248.28
	Subtotal				\$ 3,600.00
	Utilidad			% 10.00	\$ 360.00
	Subtotal				\$ 3,960.00
					\$ 3,960.00
PRECIO UNITARIO					
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.					

PRECIO UNITARIO

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

15 DE JULIO DEL 2020

[Handwritten signature]



AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.					
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
11	INTERCONEXION DE LINEA DE DRENAJE, INCLUYE DEMOLICION DE POZO DE VISITA COLOCACION Y ENSAMBLE CON CONCRETOFC 150 KGS/CM2, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.				PZA
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Mano de Obra				
OF. ALBAÑIL	Of. Albañil	jor	0.25000	\$ 741.00	\$ 185.25
AY. GENERAL	3Ay. General	jor	0.15345	\$ 1,443.00	\$ 221.43
					\$ 406.68
	Herramientas				
PALA	pala	jor	0.25000	\$ 120.00	\$ 30.00
PICO	pico	jor	0.11000	\$ 120.00	\$ 13.20
BOTE	Bote	jor	0.23000	\$ 155.00	\$ 35.65
ESCOBA	Escoba	jor	0.11500	\$ 120.00	\$ 13.80
MARRO	Marro	jor	0.11000	\$ 350.00	\$ 38.50
CINZEL	Cinzel	jor	0.23000	\$ 200.00	\$ 46.00
CARRETILLA	Carretilla	jor	0.11509	\$ 750.00	\$ 86.32
Mortero	Mortero cemento-arena	m3	0.01700	\$ 1,800.00	\$ 30.60
	Suma de Herramientas				\$ 294.07
	Costo Directo				\$ 700.75
	Indirectos			% 8.00	\$ 56.06
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 56.06
	Subtotal				\$ 812.87
	Utilidad			% 10.00	\$ 81.29
	Subtotal				\$ 894.15
					\$ 894.15
PRECIO UNITARIO					
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.					
15 DE JULIO DEL 2020					

[Handwritten signature]



**AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS
SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

12	REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCONFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESEADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO.(85.86X7.90/8.16).				M2
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
AGUA	Materiales				
	Agua	m3	0.10000	\$ 10.50	\$ 1.05
	Suma de Materiales				\$ 1.05
	Mano de Obra				
OP. MAQUINARIA	2 Op. Maquinaria	jor	0.00640	\$ 1,540.00	\$ 9.86
AY. GENERAL	1 Ay. General	jor	0.00501	\$ 580.00	\$ 2.91
	Suma de Mano de Obra				\$ 12.76
	EQUIPO				
MOTOCONFORM	Motoconformadora	hra	0.01000	\$600.00	\$ 6.00
PIPA	Pipa de agua	hra	0.01000	\$550.00	\$ 5.50
	Suma de Herramientas				\$ 11.50
	Costo Directo				\$ 25.31
	Indirectos			% 8.00	\$ 2.02
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 2.02
	Subtotal				\$ 29.36
	Utilidad			% 10.00	\$ 2.94
	Subtotal				\$ 32.30
					\$ 32.30
PRECIO UNITARIO					
TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.					
15 DE JULIO DEL 2020					

(Handwritten signature)



AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABSOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

13	MOTOCONFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA. (7.90X35.00)				M2
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
AGUA	Materiales				
	Agua	m3	0.10000	\$ 10.50	\$ 1.05
	Suma de Materiales				\$ 1.05
OP. MAQUINARIA AY. GENERAL	Mano de Obra				
	2 Op. Maquinaria	jor	0.00300	\$ 1,540.00	\$ 4.62
	1 Ay. General	jor	0.00200	\$ 580.00	\$ 1.16
	Suma de Mano de Obra				\$ 5.78
MOTOCONFORM PIPA	EQUIPO				
	Motoconformadora	hra	0.00900	\$600.00	\$ 5.40
	Pipa de agua	hra	0.00548	\$550.00	\$ 3.01
	Suma de Herramientas				\$ 8.41
	Costo Directo				\$ 15.24
	Indirectos			% 8.00	\$ 1.22
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 1.22
	Subtotal				\$ 17.68
	Utilidad			% 10.00	\$ 1.77
	Subtotal				\$ 19.45
PRECIO UNITARIO					\$ 19.45

DIECINUEVE PESOS 45/100 M.N.


15 DE JULIO DEL 2020

[Firma manuscrita]

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

CROQUIS

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

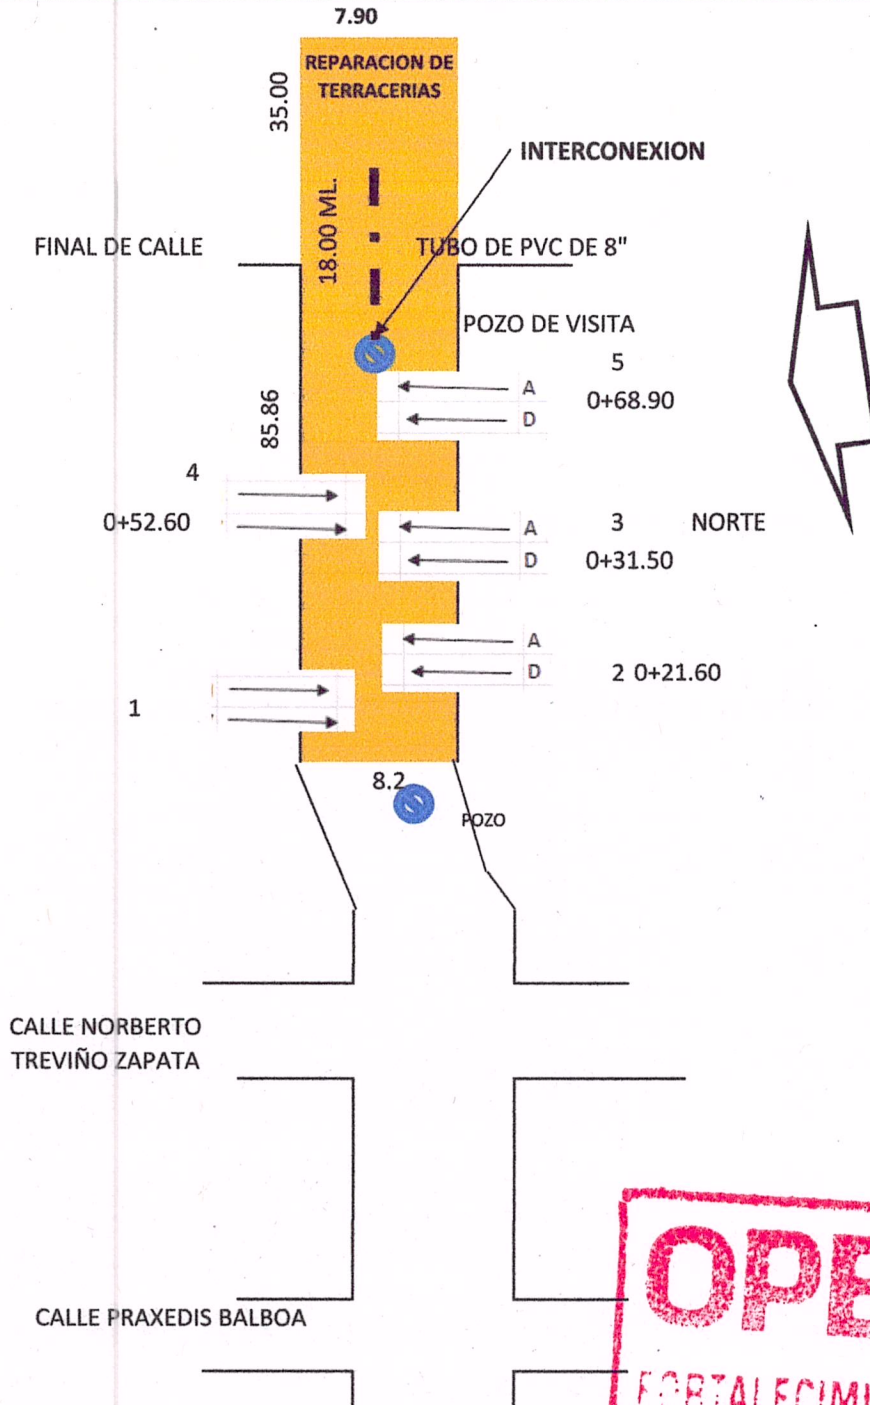

ELABORO

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO
15 DE AGOSTO DEL 2020

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020



CUADRO GENERADOR						
CONCEPTO	LARGO	PROFUNDIDAD	ANCHO		TOTAL	UNIDAD
EXCAVACION	18.00	1.30	0.70		16.38	M3
PLANTILLA	18.00	0.1	0.7		1.26	M3
VOL. TUBO PVC 8"	18.00	3.1416	0.1016	0.10116	0.58120042	M3
RELLENO DE COSTILLO DE TUBO	18.00	0.60	0.70	0.58120042	6.97879958	M3
RELLENO HASTA NIVEL DE RASANTE	18.00	0.60	0.70		7.56	M3



ELABORÓ 
ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO
15 DE JULIO DEL 2020

24 DE JULIO DEL 2020

ASUNTO: INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA

ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ
PEÑA NEVADA SUR. # 116
FRACC. SIERRA MADRE
CD. VICTORIA TAM.

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA A LA OBRA:

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

LA FIRMA DEL CONTRATO SERA EL DIA 27 DE JULIO DEL 2020 A LAS 12:00 HRS. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARÁ A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

C.C.P. LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA CONTRALORIA MUNICIPAL
C.C.P. ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO REGIDOR COMISION DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P. EXP.





**OFICIO NÚM.- OP2056
ABASOLO TAM. A 1 DE AGOSTO DEL 2020**

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO POR EL RESPONSABLE DE LA OBRA ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN, DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ESTE DOCUMENTO SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN V DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO.

SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE NO PODRÁ SER INVADIDA LA VÍA PUBLICA CON ESCOMBRO Y/O MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, APERCIBIDO QUE DE NO ATENDER ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARA LAS SANCIONES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO.

DEBERÁ RESPETAR ÍNTEGRAMENTE SU LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ALINEAMIENTO, NÚMERO OFICIAL, ASÍ COMO VACÍOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE SU PROYECTO.

EN CASO DE INCURRIR CON FALSEDAD EN LOS DATOS CONSIGNADOS ES SU SOLICITUD Y/O PROYECTO, SE REVOCARA LA PRESENTE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SE APLICARA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

ESTE PERMISO, UNA COPIA DE PLANOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES DEBERÁN ESTAR EN EL SITIO DE LA OBRA Y A DISPOSICIÓN DEL SUPERVISOR DE ESTA DIRECCIÓN.

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

**OBRAS
PÚBLICAS**

2018 - 2021

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

Municipio de Abasco Admon.
2018-2021
Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasco, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx





CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

DATOS DEL CONTRATO
AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.
META A CUMPLIR: 10 TOMAS Y DESCARGAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL
IMPORTE: \$ 105,315.83 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 83/100 M.N.)
ANTICIPO: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO HABRA ANTICIPO ALGUNO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020. (PERIODO 15 DIAS).
FECHA DE CONTRATO: 27 DE JULIO DEL 2020
LUGAR: MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM, REPRESENTADO POR: LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL C. **MARTIN CASTILLO TORRES** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. **ELIAZAR MURILLO CAMPOS** EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. **EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ** A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y "LA CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

El presente Contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de adjudicación directa en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su reglamento.



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 885 335 01 77 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

DECLARACIONES

1. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

1.2 Que para su correcta y oportuna realización desea emplear los servicios de una empresa constructora solvente que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con los requisitos de calidad óptima; aplicándose fielmente a las especificaciones requeridas por "EL MUNICIPIO".

1.3 "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene personalidad jurídica para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.

1.4 LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**, acredita su personalidad y facultades como Presidenta Constitucional del Municipio de Abasolo, Tam. conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.5 El **C. MARTIN CASTILLO TORRES** que acredita su personalidad en su carácter de secretario del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam

1.6 El **C. ELEAZAR MURILLO CAMPOS**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Municipio de Abasolo, Tam, conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.7 EL **C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA.**, que acredita su personalidad en su carácter de contralor del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.

1.7 EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** que acredita su personalidad del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.


1.8 Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Abasolo, Tam, situado en la C. Lázaro Cárdenas y Guillermo Prieto s/n en el Municipio de Abasolo, Tam. C.P. 87760.

2. "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Bajo formal protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcance de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Presente Contrato.

2.2 La empresa **CONTRATISTA** denominada **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ** cuenta con R.F.C. **VARY860629TF2**



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

2.3 Tiene establecido su domicilio en Peña Nevada sur N° 116 Fracc. Sierra madre C.P. 87037, en Ciudad Victoria, Tam., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.4 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del Presente contrato.

2.5 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas y que ratifica su declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 43 de la mencionada Ley.

2.6 Conoce debidamente el sitio de la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.


2.7 **"LA CONTRATISTA"** declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a **"LA CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en: **AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.** La cual beneficiara a esta comunidad.

Conforme al objeto del presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar la obra u objeto de este contrato hasta su total terminación. Acatando estrictamente la documentación referente al proyecto ejecutivo, catálogo de obra y programa, que firmados se anexan como parte integrante del presente contrato y como si se insertaran a la letra, así como todo lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Estado y Normas establecidas en los diversos ordenamientos de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal, por lo que es obligación de **"LA CONTRATISTA"** revisar acuciosamente todos los planos y especificaciones de la obra. En caso de detectar algún posible error, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas para que previa verificación, aprobación en su caso y firma de la supervisión que asigne la Dirección referida, se corrija.





CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20


"LA CONTRATISTA" deberá mostrar y explicar ampliamente a **"EL MUNICIPIO"** para su revisión y aprobación, los procedimientos y criterios técnicos que aplicará para resolver los trabajos objeto de éste contrato. **"LA CONTRATISTA"** estará sujeto a supervisiones por conducto del personal de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, fungiendo como órgano de vigilancia y control, otorgándole todas las facilidades técnicas y humanas para el buen cumplimiento y ejecución de la presente obra. **"LA CONTRATISTA"** será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale **"EL MUNICIPIO"**. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo del contratista. **"EL MUNICIPIO"** podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de **"LA CONTRATISTA"** y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es por la cantidad de: **\$ 105,315.83 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 83/100 M.N.)** INCLUYE el impuesto al valor agregado, integrando en él, todos los conceptos, volúmenes y precios unitarios detallados sobre la base de los cargos directos e indirectos necesarios para entregar puntualmente la obra con la calidad requerida. Si **"LA CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por este concepto. Si hubiere conceptos fuera de presupuesto, estos deberán presentarse para autorización previamente a su ejecución; acompañado de: presupuesto y análisis de Precios Unitarios, fotografías, notas de bitácora donde autorizan su ejecución, generadores con croquis y programa de ejecución de los mismos. Dicha suma sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional entre las partes. Cuando a juicio de **"EL MUNICIPIO"**, sea necesario llevar a cabo dichas modificaciones o trabajos extraordinarios, se procederá de la siguiente forma:

A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones o trabajos extraordinarios de que se trate, **"EL MUNICIPIO"** estará facultado para ordenarle su ejecución, a **"LA CONTRATISTA"** y éste se obliga a realizarlos conforme dichos precios.

B.- Si para estas modificaciones o trabajos extraordinarios, no existieren conceptos y precios en el contrato y **"EL MUNICIPIO"** considera factible determinarlos con base en los elementos contenidos en los análisis de precios establecidos para la formulación del presupuesto de contrato, procederá a determinarlos con la intervención de **"LA CONTRATISTA"**, y éste, estará obligado a ejecutarlos conforme a tales precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"EL MUNICIPIO"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso, **"LA CONTRATISTA"**, estará obligado a ejecutarlos.



Municipio de Abasolo Admon.
2018-2021



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

D.- Si, aun así, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos A), B) y


C), "**LA CONTRATISTA**", requerimiento de "**EL MUNICIPIO**" y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios, acompañados de sus respectivos análisis. En la inteligencia, de que para fijarlos, deberá aplicar el mismo criterio seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, conforme las especificaciones del proyecto y catálogo de conceptos; debiendo resolver "**EL MUNICIPIO**" en un plazo inmediato. Si ambas partes llegaron a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere éste inciso, "**LA CONTRATISTA**" se obliga a ejecutar las modificaciones o trabajos extraordinarios conforme a dichos precios. En el supuesto de que "**LA CONTRATISTA**" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el párrafo anterior, o bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "**EL MUNICIPIO**" podrá ordenarle la ejecución de las modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo equipo, personal, etc., que intervengan en estos trabajos.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020. (PERIODO 15 DIAS).

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO. - "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de "**LA CONTRATISTA**", el sitio en el cual deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, con la salvedad de ocupación u oposición de terceros ajenos a este contrato, igualmente se obliga a expedir las autorizaciones que se requieran para su realización. El retraso en la entrega del sitio prorroga en igual plazo la entrega de la obra. La entrega deberá constar por escrito en la bitácora de obra.

QUINTA. - ANTICIPOS. - "EL MUNICIPIO" no otorgará a "**LA CONTRATISTA**" ningún anticipo.

SEXTA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimación única; debidamente requisitadas con generadores, carátula de estimación y demás documentos de apoyo necesarios, obligatoriamente revisados y calificados por la supervisión de obra de la Dirección de Obras Públicas del Municipio; dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de corte para su validación y firmas. Estas serán pagada el día 30 (treinta) de diciembre del 2020. El pago se realizará MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA en la Tesorería Municipal. "**LA CONTRATISTA**" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para justificar atraso en los pagos o en la ejecución de la obra.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasco, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 535 01 77, 336 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y/o verificar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto de la obra realizada, y de comunicar a **“LA CONTRATISTA”**, por escrito, las instrucciones que estime pertinente.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “LA CONTRATISTA”, en acatamiento a lo que establecen los Artículos 39 y 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tamaulipas, se obliga a constituir las garantías siguientes:

A. - FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - Fianza a favor del Municipio de Abasolo, Tam., por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la obra contratada.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos de los insumos pactados en este Contrato, cuando durante la vigencia del contrato y la ejecución de la obra dentro del programa correspondiente, ocurran circunstancias de orden económico no previstas dentro del contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción en un 5% (cinco por ciento) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. Con base a la solicitud que presente **“LA CONTRATISTA”** a **“EL MUNICIPIO”**, este llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al **“LA CONTRATISTA”**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado. Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido amortizado en su totalidad.

DÉCIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - La recepción de los trabajos será efectuada en forma total, salvo pacto en contrario que conste por escrito, por lo que **“LA CONTRATISTA”** se obliga a entregar la obra terminada con estándar de calidad de acuerdo al catálogo de contrato, así como de las modificaciones que durante el proceso de la obra **“EL MUNICIPIO”** solicite cumpliendo además con los términos comprometidos en programa contratado. **“LA CONTRATISTA”** avisará por escrito la terminación de la obra y **“EL MUNICIPIO”**. Realizará la inspección, constatando su conclusión en un plazo de 5 (cinco) días naturales posteriores al aviso. El acto de Entrega-Recepción de los trabajos se llevará a efecto dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, después de que **“EL MUNICIPIO”** verifique su terminación. Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega, serán a cargo de **“LA CONTRATISTA”**. Si aparecieren defectos o vicios ocultos dentro del año siguiente a la fecha de recepción por **“EL MUNICIPIO”**, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata y **“LA CONTRATISTA”** se obliga desde ahora a ejecutarla por su cuenta,

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio Municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

sin derecho a retribución alguna. "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar el Finiquito del Contrato a más tardar 15 días después de terminada la obra, en la inteligencia, de que, de no cumplir con este requisito. "EL MUNICIPIO" resolverá con los documentos que obren en su poder, aún sin la intervención del "LA CONTRATISTA", y éste no podrá anteponer recurso alguno para nulificarlo.

Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A.- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "LA CONTRATISTA" el valor de la obra recibida.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a "LA CONTRATISTA" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.

C.- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y LA CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidará en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D.- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décimo sexta, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "EL MUNICIPIO", el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "LA CONTRATISTA" se obliga a establecer, permanentemente en el lugar de la obra a su representante profesional, que fungirá como su Residente de Construcción; el cual, deberá tener conocimiento y poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, deberá presentar Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que lo acredite como Arquitecto o Ingeniero Civil, al momento de la apertura de la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar o rechazar al Representante Profesional. De acuerdo a la normatividad "LA CONTRATISTA" llevará una bitácora de obra, en hojas foliadas y selladas por "EL MUNICIPIO", la cual debe contener en el encabezado el registro de firmas autorizadas por ambos, para el asiento y autorización de las notas respectivas. La bitácora que en este acto presenta "LA CONTRATISTA", misma que permanecerá en residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos, debiendo las notas de precisar según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional la ubicación. Causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y la fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

"EL MUNICIPIO" Y "LA CONTRATISTA" se obligan a aceptar la bitácora de obra como un documento anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus asientos se consideren como un elemento contractual.



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

Esta bitácora registrará el cumplimiento de todas las obligaciones contratadas, constituirá el instrumento legal y técnico donde se asienten los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, y permitirá a los órganos de control y vigilancia el apoyo documental e informativo que requieran las revisiones de las obras.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - "LA CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "LA CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos objeto de este contrato y que se refieran a los rubros antes citados, por lo que en este acto releva a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil o penal que pudiera derivar de la plantilla de trabajadores de "LA CONTRATISTA" en la ejecución de la obra.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - "LA CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos, cumplan con las normas de calidad establecidas, y que, la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, y daños y perjuicios que por observancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyos caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. - "EL MUNICIPIO" tendrá facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por "LA CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa de Obras aprobado vigente. "EL MUNICIPIO" comparará el avance de las mismas conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. En caso de que, durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieran efectuado varias comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "LA CONTRATISTA", ya que, en tal evento de común acuerdo, se hará al Programa las modificaciones que procedan, previa justificación. "EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.



Municipio de Abasolo Admon.
2018-2021

CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20


DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. En caso de suspensión del Presente Contrato, dicho convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza no imputable a "LA CONTRATISTA", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurrieran tales eventos.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato o suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DECIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a "LA CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente; lo que deberá efectuarse durante los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de rescisión. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de "LA CONTRATISTA" que pudiesen existir, además de lo anterior, la rescisión tendrá lugar en los siguientes casos y se tendrán que tomar las medidas que a continuación se establecen:

A.- "EL MUNICIPIO" procederá a la rescisión del Contrato por alguna de las siguientes causas: cuando "LA CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada o lo suspenda injustificadamente; incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de "EL MUNICIPIO" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como cualquier otra casusa que implique contravención a los términos del Contrato.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión administrativa del Contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a "LA CONTRATISTA" exponiendo las razones que al respecto se tuvieron para que éste, dentro del término de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 535 01 77, 835 02 29 y 835 00 91
www.abasolo.gob.mx

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.

CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga.

C.- Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "LA CONTRATISTA".

D.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.

DÉCIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "LA CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.


DÉCIMA NOVENA. - OBLIGACIONES. Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "LA CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

VIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. -Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

[Firmas manuscritas]





CONTRATO DE OBRA

N.º: FM6315-20

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2020.

R. AYUNTAMIENTO

POR "EL MUNICIPIO"

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR
MUNICIPAL
2018 - 2021

POR "LA CONTRATISTA"

ARQ. YOANA VANOYS RESENDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 01 DE AGOSTO DEL 2020
ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA

ING. YOANA VANOYE RESENDEZ
C. Peña Nevada Sur No.116
Fracc. Sierra Grande
C.P. 87100
CD. VICTORIA TAM.
PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO FH6415-20 LA SUPERVISIÓN POR ESTE DEPARTAMENTO ESTARÁ A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.

SIN OTRO DE MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO

DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



Yoana Vanoye + Arquitectura

Diseño y CONSTRUCCIÓN

CALLE PEÑA NEVADA SUR N°116 FRACC.
SIERRA MADRE C.P. 87037
CD VICTORIA, TAM.
RFC: VARY860629TF2
CURP: VARY860629TF2MTS NSN04
REG. PATRONAL: F05-43317-10-4

AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR

ABASOLO TAM. A 01 DE AGOSTO DEL 2020

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Por medio del presente le informo que con esta fecha se iniciaron los trabajos correspondientes a la:

AMPLACION DE 18.00 ML.DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL.LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

Amparados con el contrato FH6415-20, y a lo cual su servidor Ing. Yoana Vanoye Resendez supervisará los trabajos para atender cualquier observación o sugerencia de parte de la supervisión del municipio y así cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ
CONTRATISTA
RECIBIDO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020



Yoana Vanove + *Arquitectura*

Diseño y CONSTRUCCIÓN

CALLE PEÑA NEVADA SUR N°116 FRACC.
SIERRA MADRE C.P. 87037
CD VICTORIA, TAM.
RFC: VARY860629TF2
CURP: VARY860629TF2MTSNSN04
REG. PATRONAL: F05-43317-10-4

AVISO DE TERMINACION DE OBRA

ABASOLO TAM. A 15 DE AGOSTO DEL 2020

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Por medio del presente le informo que con esta fecha terminaron los trabajos correspondientes a la:

AMPLACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

Amparados con el contrato FH6415-20, LO ANTERIOR PARA CUALQUIER ACLARACION O SUGERENCIA Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.

Sin otro de momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Yoana Vanove Resendez
ARO. YOANA VANOVE RESENDEZ
CONTRATISTA

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 150

No. de serie del CSD del emisor

00001000000413934836

Fecha y Hora de emisión

2020-12-30T15:20:19

Folio Fiscal

D1CAA710-4AE4-11EB-919C-00155D014009

Emisor

RFC: VARY860629TF2

Razón Social: YOANA VANOYE RESENDEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87037

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-12-30T15:20:19

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
18.00	LM - Metro lineal	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$104,771.09 (CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM6315-20 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. ClaveProdServ - 72151906 - Servicio de instalación de tubería de drenaje No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$90,789.51 Tasa - 0.160000 Importe - \$14,526.32	5,043.86	90,789.51

TOTAL EN LETRA:

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 MXN

Subtotal	90,789.51 MXN
IVAT 0.160000	14,526.32 MXN
RET. CONTRALORIA MPAL 0.50	453.95 MXN
RETENCION 0.10	90.79 MXN
Total	104,771.09 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D1CAA710-4AE4-11EB-919C-00155D014009|2020-12-30T15:20:19|TBN040609RKA|ELdevN5QoNzvdpgWz5gEwwh2wGcL+NMXI+cOjB47Js1O5+md7kg0BtXbqXU/LkkBFHYeu3WUnPRu54x0zFdlGBITSPOFQoEZ9bhWV1DCIt6yarEr8pxF0pN1GijdF0KK1pPdxQ2bde7zCqzJIEDaz5NVIEUDY6WKI3vCLz7H0NpfcfnxGqaZ14ogeJi7hjaOlxOJpGuzKxIvSEK3J8kLyuNzygbnglXeW7Ttw/Dk++ytBQHHYh1aFrTb7Qc+BTyDgpPcmq9b45dOWB7LDbYauwnzOjBFCcmj4IWZ4Jlqk2sora1Cel0hFBLq5EJNmna315UEK7CRACITYAXw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

ELdevN5QoNzvdpgWz5gEwwh2wGcL+NMXI+cOjB47Js1O5+md7kg0BtXbqXU/LkkBFHYeu3WUnPRu54x0zFdlGBITSPOFQoEZ9bhWV1DCIt6yarEr8pxF0pN1GijdF0KK1pPdxQ2bde7zCqzJIEDaz5NVIEUDY6WKI3vCLz7H0NpfcfnxGqaZ14ogeJi7hjaOlxOJpGuzKxIvSEK3J8kLyuNzygbnglXeW7Ttw/Dk++ytBQHHYh1aFrTb7Qc+BTyDgpPcmq9b45dOWB7LDbYauwnzOjBFCcmj4IWZ4Jlqk2sora1Cel0hFBLq5EJNmna315UEK7CRACITYAXw==

Sello digital del SAT

KnDhPpsIYie/xGTRmzXskQnSLq2p7tqH3IXuNgOloMyYnJ/rf5hRSaftOoT6cUwHaNbnD6kCDXul6qVCIZ648NisP52C3YQBzhQJfMIT8TMUavWVYVsFd3Hrqd+WlIk583KtuGsh5TpZ6Q6eQG8y6imf4cEwJWgluuA4SAhP9Y/hhXfchBuFKjNWqZYp+PyNifhmCjdXegJ+QWYI87pgHK0xIFaCDJDr4nK43PHRLdcm+KfmMUMn2yZdD4VYpVgehplgTrom5FYiree2ZYt455q3klbz5MtxpOAltsFFRQ1js2mBOWw+RNCzk3+2QZLRQCLZs26iSpWaglw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturax.com

Página 1 de 1

Emisor

RFC: VARY860629TF2

Razón Social: YOANA VANOYE RESENDEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87037

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-12-30T15:20:19

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
18.00	LM - Metro lineal	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$104,771.09 (CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM6315-20 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. ClaveProdServ - 72151906 - Servicio de instalación de tubería de drenaje No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$90,789.51 Tasa - 0.160000 Importe - \$14,526.32	5,043.86	90,789.51

TOTAL EN LETRA:

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 MXN

90,789.51 MXN

14,526.32 MXN

453.95 MXN

90.79 MXN

104,771.09 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

30T15:20:19[BN040606RKA]ELdevN5QcNzvdpgWz5gEwWh2wGcL+MMX+cQ[B47]Ja105+md7kg0BHXbXULdkBFHYeu3WUnPRuS+td2fGIBIT3PQFQcE20bhW
N1DCKsYarErtppxF0pN1G[dF9Kk1pPdxQ2bde7zCqzJIEDax5NVEUDY6WK5vCLz7fH0NpfcfxGqaZ14ogwJ7hJcaDlxOJpGuzKofVSFEcJ8kLyuNzygbingXaW7TtW
/dk++yBQHYYH1aFrTb7Qc+BTyDgpPcmqB45dOWB7LDbyYauwnzOJbFCcmJ4VZ4Jlqk2sora1Ce10hFBLq5EJNmna315UEk7CRACITVAXw==10000100000050458
7508]]

ELdevN5QcNzvdpgWz5gEwWh2wGcL+MMX+cQ[B47]Ja105+md7kg0BHXbXULdkBFHYeu3WUnPRuS+td2fGIBIT3PQFQcE20bhW
N1DCKsYarErtppxF0pN1G[dF9Kk1pPdxQ2bde7zCqzJIEDax5NVEUDY6WK5vCLz7fH0NpfcfxGqaZ14ogwJ7hJcaDlxOJpGuzKofVSFEcJ8kLyuNzygbingXaW7TtW
/dk++yBQHYYH1aFrTb7Qc+BTyDgpPcmqB45dOWB7LDbyYauwnzOJbFCcmJ4VZ4Jlqk2sora1Ce10hFBLq5EJNmna315UEk7CRACITVAXw==

KnDhPpsfYleXGTRmzX+KQnSLq2p7tdH3DxNgOclmly/nJl15hRSafQeT6cUvHtNbnD6KCDXW6qVCLZ546NlaP52C3YQBzhQJFMIT6TMUavWVYaf35HhdeYXWk5
83KtuGsh5TpZ6Q6eQ08ySilmf4cEwJWgluuA4SAHPSY/nH1chBuFKJNW6ZYp+PyN8hmCjdXagJ+QWYIY87pgHKOxFeCEJDnK43PHRLdcm+KtmLCUmnyZdD
4VYpVgshplgTroMSFYtre2Z7nd55q3k3z5MbpOJnFFRQ1Ja2nBOWw+RNCxk3+2QZLRQLZz26SpWqglw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturax.com

Página 1 de 1



Pagos SPEI enviados

Fecha: 30/12/2020
Hora: 09:40:50
Página: 1

Fecha valor: 30/12/2020 Clave de Rastreo: HSBC226587
Fecha de liquidación: 30/12/2020 Hora de liquidación: 15:40:45 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4064673080
Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante: 26965XH006QL
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 104,771.09

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072810004097793696 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: YOANA VANOYE RESENDEZ
Banco Receptor: BANORTE
Concepto de Pago: FM631520





COL. LA AMISTAD		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	
R.F.C.	DOMICILIO: C. PEÑA NEVADA SUR No. 116 FRACC. SIERRA GRANDE, en Ciudad Victoria, Tam		IMP. DEL CONTRATO	105,315.83
VARY860629TF2			\$	
RECIBI DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		(CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09 /100 M.N.)		
AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.		Nº DE CONTRATO: FM6315-20		
		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)		
FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020		BUENO POR: 105,315.83		
FECHAS DE EJECUCION		DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020		
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.:		TRABAJOS DE:		
1 (UNICA)		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:		
ANTIPOPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	MONTO ASIGNADO \$ 105,315.83
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PAGOS ANTERIORES \$ -
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SUB-TOTAL \$ 105,315.83
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SALDO POR AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 90,789.51				
AMORTIZACION DE ANTICIPO				
SUB-TOTAL \$ 90,789.51				
I.V.A. \$ 14,526.32				
TOTAL \$ 105,315.83				
DEDUCCIONES				
TOTAL: \$ 544.74				
NETO A PAGAR \$ 104,771.09				
SALDO DE ASIGNACION				
\$ 0.00				
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ		C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ		LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
				CONTRALOR ALOR MUNICIPAL
				2018 - 2021

ESTIMACION

ESTIMACION												
AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.												
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL												
CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	PRECIO U.	META 10 TOMAS Y DESCARGAS			FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020			IMPORTE (\$)	
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE				
1	TRAZO Y NIVELACION (UN TRAZO SOLAMENTE) INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO	ML.	18.00	19.50	0.00	18.00	18.00	0.00	\$	351.00		
2	EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 ML. ,INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM. DE DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	16.38	332.00	0.00	16.38	16.38	0.00	\$	5,438.16		
3	PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO APISONADA CON EQUIPO Y NIVELADA PARA RECIBIR TUBERIA DE DRENAJE ,INCLUYE MATERIALES ,EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	1.26	392.00	0.00	1.26	1.26	0.00	\$	493.92		
4	RELLENO DE COSTILLO DE 60 CMS. DE TUBO PARA PROTECCION CON MATERIAL INERTE FINO DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	6.98	388.50	0.00	6.98	6.98	0.00	\$	2,711.26		
5	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO HASTA NIVEL DE RASANTE DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	7.56	387.20	0.00	7.56	7.56	0.00	\$	2,927.23		
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PVC DE 8" SERIE 20 INCLUYE:MATERIALES,ENSAMBLE,NIVELACION,PRUEBA DE HERMITICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	18.00	996.10	0.00	18.00	18.00	0.00	\$	17,929.80		
7	DEMOLICION DE BANQUETA PARA INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	5.00	457.00	0.00	5.00	5.00	0.00	\$	2,285.00		
8	TOMAS CON MANGUERA FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA ,INCLUYE CORTES, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00	987.50	0.00	5.00	5.00	0.00	\$	4,937.50		
9	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO PVC 8" ,INCLUYE CORTES, EXCAVACION , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00	3,450.80	0.00	5.00	5.00	0.00	\$	17,254.00		
10	DESENSOLVE DE POZOS DE VISITA MANUAL ,INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y ENSOLVE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 500 ML.	PZA.	2.00	3,960.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$	7,920.00		
11	INTERCONEXION DE LINEA DE DRENAJE ,INCLUYE DEMOLICION DE POZO DE VISITA COLOCACION Y ENSAMBLE CON CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ,HERRAMIENTAS,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	1.00	894.15	0.00	1.00	1.00	0.00	\$	894.15		
12	REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCOFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO.(85.86X7.90/8.16).	M2	689.46	32.30	0.00	689.46	689.46	0.00	\$	22,269.56		
13	MOTOCOFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA ,INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.(7.90X35.00).	M2	276.50	19.45	0.00	276.50	276.50	0.00	\$	5,377.93		
										SUBTOTAL \$		90,789.51
										Ing. Lorenzo Antonio Alvarez Zapata		
										ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA		
										SUPERVISOR		

GENERADORES

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.						ESTIMACION: No. 1 (UNICA)																																																																			
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL						Nº DE CONTRATO: FM6315-20																																																																			
CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ						FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020																																																																			
META 10 TOMAS Y DESCARGAS																																																																									
DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020																																																																									
CUADRO GENERADOR <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>LARGO</th> <th>PROFUNDIDAD</th> <th>ANCHO</th> <th>TOTAL</th> <th>UNIDAD</th> <th>REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCONFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO (85.86X7.90/8.16).</th> <th>85.86</th> <th>7.90-8.16</th> <th>M2</th> <th>689.46</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXCAVACION</td> <td>18.00</td> <td>1.30</td> <td>0.70</td> <td>16.38</td> <td>M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLANTILLA</td> <td>18.00</td> <td>0.1</td> <td>0.7</td> <td>1.26</td> <td>M3</td> <td>MOTOCONFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA (7.90X35.00).</td> <td>35.00</td> <td>7.90</td> <td>M2</td> <td>276.50</td> </tr> <tr> <td>VOL. TUBO PVC 8"</td> <td>18.00</td> <td>3.1416</td> <td>0.1016</td> <td>0.18116</td> <td>M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELLENO DE COSTILLO DE TUBO</td> <td>18.00</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.5812004</td> <td>M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELLENO HASTA NIVEL DE RASANTE</td> <td>18.00</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>7.56</td> <td>M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								CONCEPTO	LARGO	PROFUNDIDAD	ANCHO	TOTAL	UNIDAD	REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCONFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO (85.86X7.90/8.16).	85.86	7.90-8.16	M2	689.46	EXCAVACION	18.00	1.30	0.70	16.38	M3						PLANTILLA	18.00	0.1	0.7	1.26	M3	MOTOCONFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA (7.90X35.00).	35.00	7.90	M2	276.50	VOL. TUBO PVC 8"	18.00	3.1416	0.1016	0.18116	M3						RELLENO DE COSTILLO DE TUBO	18.00	0.60	0.70	0.5812004	M3						RELLENO HASTA NIVEL DE RASANTE	18.00	0.60	0.70	7.56	M3					
CONCEPTO	LARGO	PROFUNDIDAD	ANCHO	TOTAL	UNIDAD	REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCONFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO (85.86X7.90/8.16).	85.86	7.90-8.16	M2	689.46																																																															
EXCAVACION	18.00	1.30	0.70	16.38	M3																																																																				
PLANTILLA	18.00	0.1	0.7	1.26	M3	MOTOCONFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA (7.90X35.00).	35.00	7.90	M2	276.50																																																															
VOL. TUBO PVC 8"	18.00	3.1416	0.1016	0.18116	M3																																																																				
RELLENO DE COSTILLO DE TUBO	18.00	0.60	0.70	0.5812004	M3																																																																				
RELLENO HASTA NIVEL DE RASANTE	18.00	0.60	0.70	7.56	M3																																																																				
OPERAADO OPERAACION MUNICIPAL 2020						<i>Lorenzo Antonio Alvarez</i>																																																																			
<i>Yoana Vanoys Resendez</i> ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ						ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA																																																																			
CONTRATISTA						SUPERVISOR																																																																			

CROQUIS

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION:
No. 1 (UNICA)

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL


DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

Nº DE CONTRATO: FM6315-20

CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ

META: 10 TOMAS Y DESCARGAS

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020

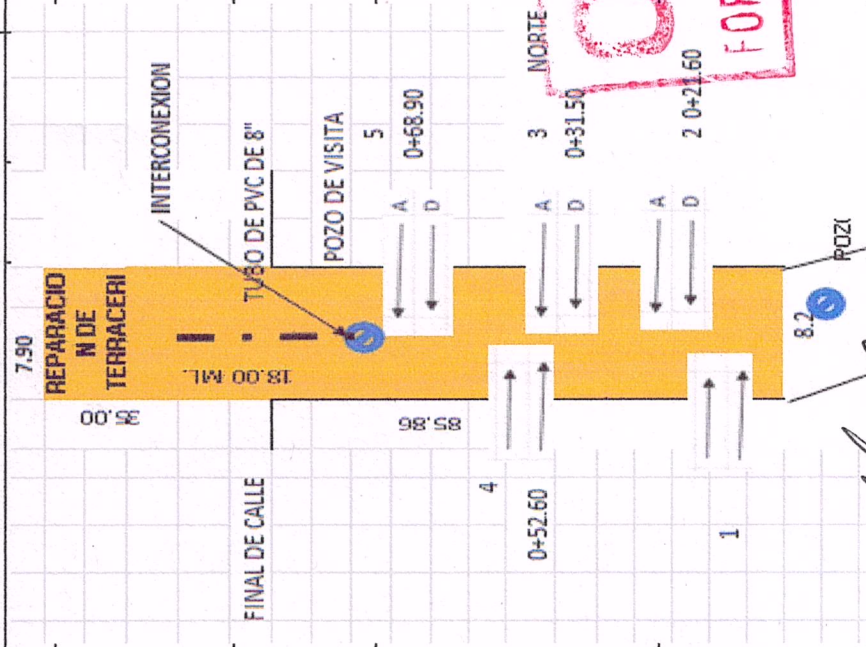

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

Yoana Vanoys Resendez
ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ
CONTRATISTA

Lorenzo Antonio Alvarez
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020	Nº DE CONTRATO: FM6315-20	
CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOVE RESENDEZ	META 10 TOMAS Y DESCARGA	FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020	



Yoana Vanove Resendez
ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ



CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
Lorenzo Antonio Alvarez Z.
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020	Nº DE CONTRATO: FM6315-20
CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ	DIETA 10 TOMAS Y DESCARGA	FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020



 ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ CONTRATISTA	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA  SUPERVISOR	

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No.
1 (UNICA)

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

Nº DE CONTRATO: FM6315-20

CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

HETA 10 TOMAS Y DESCARGA

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020



Yoana Vanoys Resendez
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo Antonio Alvarez
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No.
1 (UNICA)

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

Nº DE CONTRATO: FM6315-20

CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ

HETA 10 TOMAS Y DESCARGA

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020



Yoana Vanoys Resendez
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo Antonio Alvarez Z.
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No.
1 (UNICA)

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

Nº DE CONTRATO: FM6315-20

CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESEÑEZ

ITEMA: 10 TOMAS Y DESCARGA

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020



24°03'16.7"N 98°21'54.6"W





24°03'16.5"N 98°21'52.8"W

Yoana VanoYE Reseñez
ARQ. YOANA VANOYE RESEÑEZ
CONTRATISTA

Lorenzo Antonio Alvarez
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020	Nº DE CONTRATO: FM6315-20
CONTRATISTA: ARQ.. YOANA VANOYE RESENDEZ	NETA 10 TOMAS Y DESCARGA	FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020

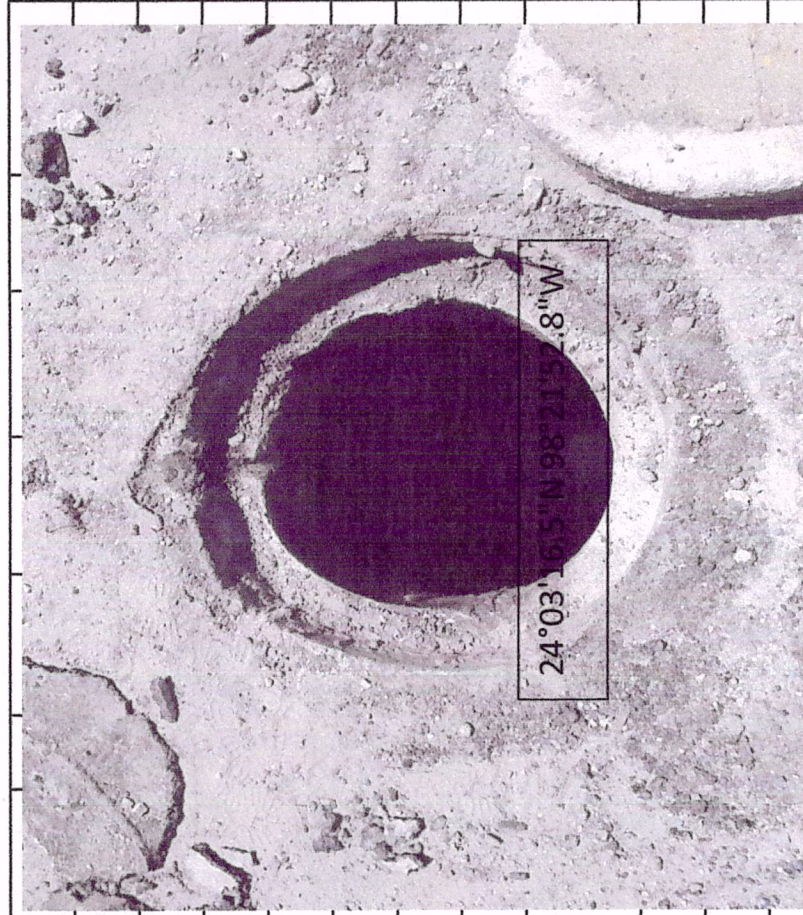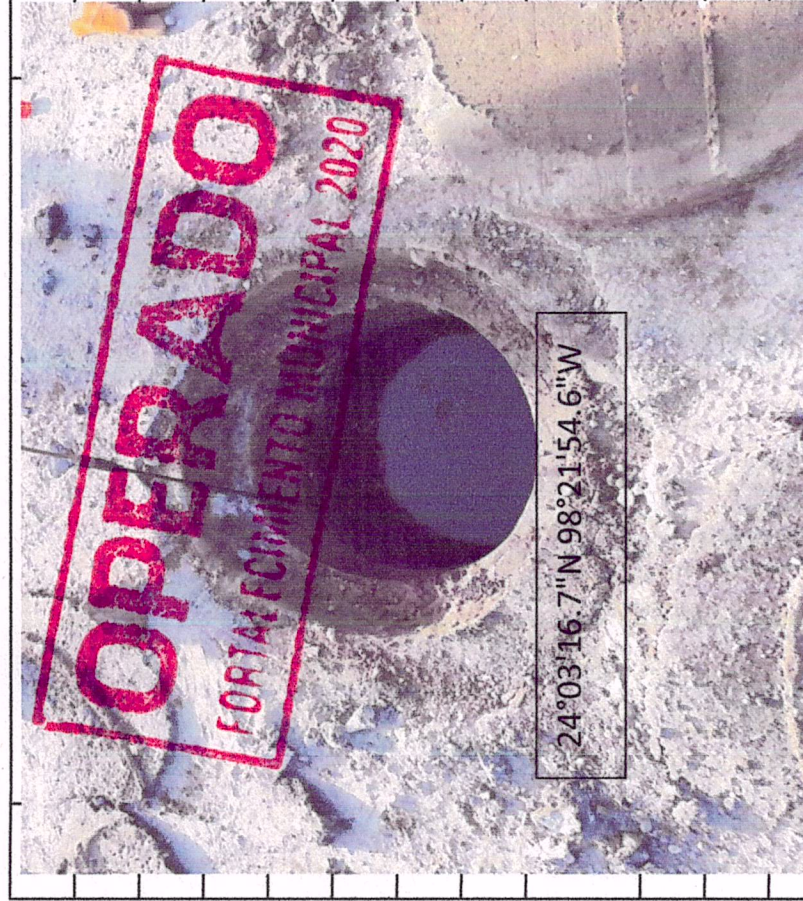

Yoana Vanoye Resendez
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo Antonio Alvarez Z.
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)	
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020	Nº DE CONTRATO: FM6315-20	
CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ	HETA 10 TOMAS Y DESCARGA	FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020	



Yoana VanoYe Resendez
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo Antonio Alvarez Z.
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No.
1 (UNICA)

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL


DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

Nº DE CONTRATO: FM6315-20

CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

HETA 10 TOMAS Y DESCARGA

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020

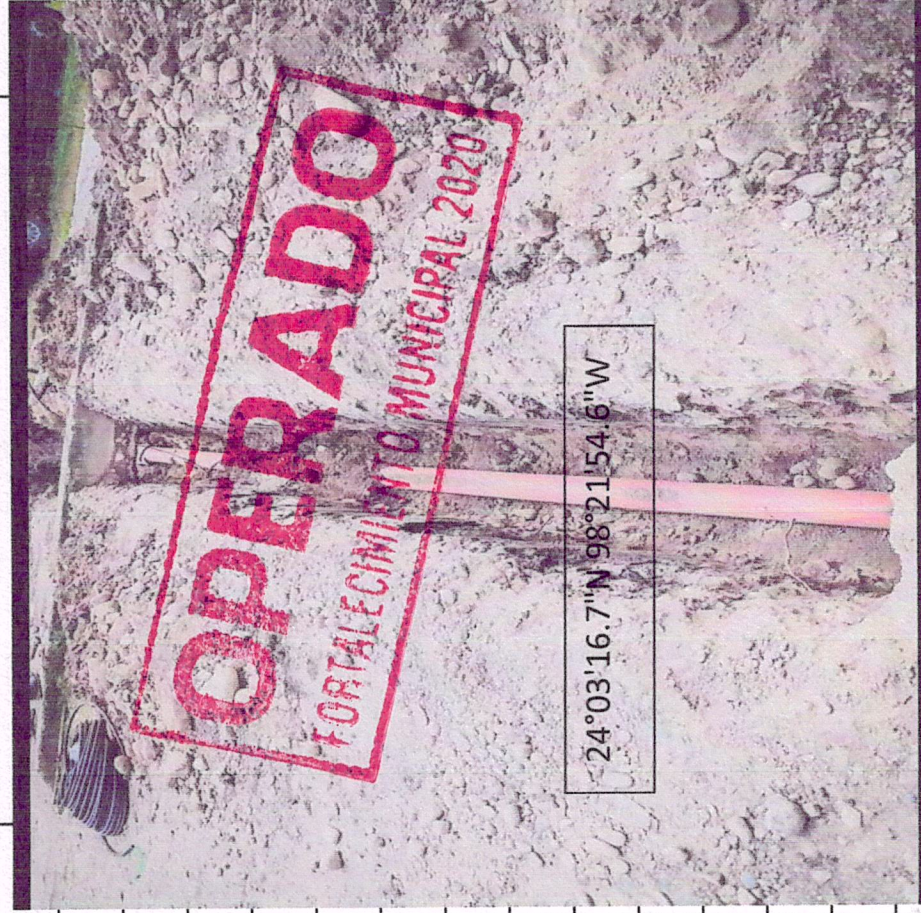

Yoana Vanoze Resendez
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

CONTRATISTA


Lorenzo Antonio Alvarez
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)	
RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020	Nº DE CONTRATO: FM6315-20	
CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ	HETA 10 TOMAS Y DESCARGA	FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020	



 ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ		 ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA	
CONTRATISTA		SUPERVISOR	

FOTOGRAFIA

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No.
1 (UNICA)

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

Nº DE CONTRATO: FM6315-20

CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

META 10 TOMAS Y DESCARGA

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020



Yoana Vanoys Resendez
ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo Antonio Alvarez Zapata
SUPERVISOR



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: FM6315-20

FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2020.

DATOS GENERALES:

OBRA: AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

DOMICILIO FISCAL: C. PEÑA NEVADA SUR N° 116 FRACC. SIERRA GRANDE, CD. VICTORIA, TAM. C.P. 87037.

R.F.C.: VARY860629TF2

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y LA ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:

ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMN 2018 - 2021
GUBERNADOR



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: FM6315-20

FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2020.

DATOS GENERALES:

OBRA: AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

DOMICILIO FISCAL: C. PEÑA NEVADA SUR N° 116 FRACC. SIERRA GRANDE, CD. VICTORIA, TAM. C.P. 87037.

R.F.C.: VARY860629TF2

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y LA ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:

ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018 - 2021

RECIBE:

C. ZOILA REYNA GARCIA SALAS
GERENTE GENERAL DE COMAPA

COMAPA
ABASOLO, TAM.




I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DÍA **30** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REÚNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **C. JOSE VALENTIN RODRIGUEZ DE LOS REYES**. AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS Y EL **C. HOMERO CONDE RODRÍGUEZ** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ**. LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.





ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM6315-20



TRAZO Y NIVELACION (UN TRAZO SOLAMENTE) INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO	ML.	18.00
EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 ML. ,INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM. DE DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	16.38
PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO APISONADA CON EQUIPO Y NIVELADA PARA RECIBIR TUBERIA DE DRENAJE ,INCLUYE MATERIALES ,EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	1.26
RELLENO DE COSTILLO DE 60 CMS. DE TUBO PARA PROTECCION CON MATERIAL INERTE FINO DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	6.98
RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO HASTA NIVEL DE RASANTE DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	7.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PVC DE 8" SERIE 20 INCLUYE:MATERIALES,ENSAMBLE,NIVELACION,PRUEBA DE HERMITICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	18.00
DEMOLICION DE BANQUETA PARA INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	5.00
TOMAS CON MANGUERA FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA ;INCLUYE CORTES, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00
CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO PVC 8" ;INCLUYE CORTES, EXCAVACION , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00
DESENSOLVE DE POZOS DE VISITA MANUAL ,INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y ENSOLVE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 500 ML.	PZA.	2.00
INTERCONEXION DE LINEA DE DRENAJE INCLUYE DEMOLICION DE POZO DE VISITA COLOCACION Y ENSAMBLE CON CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ,HERRAMIENTAS,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	1.00
REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCONFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO.(85.86X7.90/8.16).	M2	689.46
MOTOCONFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA ,INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.(7.90X35.00).	M2	276.50

OPERADO
POR EL COMITÉ MUNICIPAL
2020

III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NO. FM6315-20 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 105,315.83 (CIENTO CINCO MIL. TRSCIENTOSQUINCE PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 15 DE AGOSTO DEL 2020 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 15 (DIAS.) CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
ÚNICA	DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020	\$90,789.51	0.00	0.00	\$544.74	A 150

RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES ÚNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$105,315.83	0.00	0.00

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ"** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DIA **30 DE DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.





**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM6315-20**



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. EFRAÍN GONZÁLEZ ESCAMILLA
CONTRALOR MUNICIPAL
2018 - 2021

TESTIGOS

C. JOSE VALENTIN RODRIGUEZ DE LOS REYES
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS

C. HOMERO CONDE RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIN DEL ACTA

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FM6315-20** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA **FM6315-20.**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **30** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **C. JOSE VALENTIN RODRIGUEZ DE LOS REYES** AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ.**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DE 1 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2020.



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FM6315-20



TRAZO Y NIVELACION (UN TRAZO SOLAMENTE) INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO	ML.	18.00
EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 ML. INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM. DE DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	16.38
PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO APISONADA CON EQUIPO Y NIVELADA PARA RECIBIR TUBERIA DE DRENAJE INCLUYE MATERIALES ,EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	1.26
RELLENO DE COSTILLO DE 60 CMS. DE TUBO PARA PROTECCION CON MATERIAL INERTE FINO DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	6.98
RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO HASTA NIVEL DE RASANTE DE 60 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO Y HUMEDAD,INCLUYE EQUIPO,MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	7.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PVC DE 8" SERIE 20 INCLUYE:MATERIALES,ENSAMBLE,NIVELACION,PRUEBA DE HERMITICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	18.00
DEMOLICION DE BANQUETA PARA INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	5.00
TOMAS CON MANGUERA FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE CORTES, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00
CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO PVC 8" INCLUYE CORTES, EXCAVACION , MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	5.00
DESENSOLVE DE POZOS DE VISITA MANUAL INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y ENSOLVE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 500 ML.	PZA.	2.00
INTERCONEXION DE LINEA DE DRENAJE INCLUYE DEMOLICION DE POZO DE VISITA COLOCACION Y ENSAMBLE CON CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ,HERRAMIENTAS,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA.	1.00
REPARACION DE TERRACERIAS AVERIADAS POR EXCAVACIONES INCLUYE MOTOCONFORMACION PARA RECONSTRUIR RASANTE DESADA Y NIVELACION INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ACAMELLONADO INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, TENDIDO.(85.86X7.90X8.16)	M2	689.46
MOTOCONFORMACION PARA CONSTRUIR SALIDA PLUVIAL DE CALLE RUSTICA INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.(7.90X35.00)	M2	275.50

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 15 DÍAS
CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA EL INMUEBLE EN QUE SE LLEVÓ A CABO LOS TRABAJOS.

ANTICIPOS: NO HUBO ANTICIPO

FORMA DE PAGO. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJOS FUERON LIQUIDADOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES MISMAS QUE FUERON LIQUIDADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.

GARANTÍAS. EL CONTRATISTA CONSTITUYÓ EN FORMA Y TÉRMINOS LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS				

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA DESIGNO A SU REPRESENTANTE PERMANENTE **ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ** MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2020.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA EN TIEMPO Y FORMA. EN LO RELACIONADO A LOS MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADO ESTOS CUMPLIERON CON LAS NORMAS DE CALIDAD EN VIGOR, REALIZÁNDOSE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS: TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. FM6315-20.

AMPLIACION DE 18.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON PVC DE 8" Y CONSTRUCCION DE 5 TOMAS DE AGUA Y 5 DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE FINAL DE CALLE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA COL. LA AMISTAD EN LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

OPERADO
PORTALCENDIMIENTO MUNICIPAL 2020



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ARQ. YOANA VANOZE RESENDEZ


POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. EFRAÍN GONZÁLEZ ESCAMILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


C. JOSE VALENTIN RODRIGUEZ DE LOS REYES
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS






-----**FIN DEL ACTA**-----

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021**

DATOS DE LA OBRA

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM6315-20
NOMBRE DE LA OBRA	Ampliacion de 18 ml de red de drenaje sanitario		
UBICACIÓN DE LA OBRA	calle Hidalgo entre final de la calle Norberto Treviño		
CONTRATISTA	Arg. Yoana vanote Resendez		
REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Yoana vanote Resendez		
FECHA DE INICIO	01-08-20	FECHA DE TERMINO	15-08-20

REGISTRO DE FIRMAS

	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Homero conde rodriguez	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA	Arg. Yoana vanote Resendez	
SUPERVISOR DE OBRA	Lorenzo Antonio Alvarez zapata	 Lorenzo Antonio Alvarez z.
RESIDENTE DE OBRA	Arg. Yoana vanote Resendez.	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ampliacion de drenaje sanitario de 18 ml., con tubo de "8"
y construccion de 5 tomas de agua y descargas sanitarias
con tubo pvc de "8" + manguera flexible, excavacion y relleno
compactado, así como nivelación y acemilado con motoconformadora

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021**

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM6315-20
NOMBRE DE LA OBRA	Ampliación de 18 m2 de red de drenaje sanitario		
UBICACIÓN DE LA OBRA	calle Hidalgo entre final de la calle Norberto Treviño		
CONTRATISTA	Arq. Yoana Vanoye Rosender		
REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Yoana Vanoye Rosender		

NOTA No.	NOTAS	FECHA
1	trazo y nivelación y topografía en el área de trabajo	01-08-20
2	Excavación con maquinaria con una profundidad de 1.30m	02-08-20
3	aplicación de plantilla de 10 cm de espesor para nivelar la tubería del drenaje	04-08-20
4	Instalación de tubo pvc de 8" de drenaje sanitario en su ejecución	05-08-20
5	demolición de banquetas y excavación para tomas de agua y descargas sanitarias	07-08-20
6	instalación de tubo pvc para descarga y manguera flexible	08-08-20
7	relleno con material inerte blanco	09-08-20
8	desensolve de pozos de visitas	10-08-20
9	acarreo y retiro de escombros en el área	12-08-20
10	reparación de terracería averiada por excavaciones incluyendo motorización para resante y nivelación y acamellonado para salida pluvial de calle rústica	13-08-20
11	limpieza y terminación de obra	15-08-20

Lorenzo Antonio Alvarez Z.

FIRMA DEL SUPERVISOR
(SERVIDOR PUBLICO)

Yoana Vanoye Rosender
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
(CONTRATISTA)

