

CONTRATO DE OBRA

N.º: FM-01-19

C.- Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".

D.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.


DÉCIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES.- Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



CONTRATO DE OBRA

N.º:FM-01-19

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL 2019.

R. AYUNTAMIENTO
POR "EL MUNICIPIO"



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMIN 2018 - 2021



**SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021**

Eliazar Murillo Campos

C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO
SECRETARÍA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
2018 - 2021

LA CONTRATISTA

Armando David Vanoys Sanchez
ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ

REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL
EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



**OFICIO NÚM.- OP1923
ABASOLO TAM. A 16 DE ENERO DEL 2019.**

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO POR EL RESPONSABLE DE LA OBRA ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, REHABILITACIÓN DE 90.00 ML DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUÍA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS.

ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN, DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ESTE DOCUMENTO SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN V DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO.

SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE NO PODRÁ SER INVADIDA LA VÍA PUBLICA CON ESCOMBRO Y/O MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, APERCIBIDO QUE DE NO ATENDER ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARA LAS SANCIONES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO.

DEBERÁ RESPETAR ÍNTEGRAMENTE SU LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ALINEAMIENTO, NÚMERO OFICIAL, ASÍ COMO VACÍOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE SU PROYECTO.

EN CASO DE INCURRIR CON FALSEDAD EN LOS DATOS CONSIGNADOS ES SU SOLICITUD Y/O PROYECTO, SE REVOCARA LA PRESENTE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SE APLICARA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

ESTE PERMISO, UNA COPIA DE PLANOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES, DEBERÁN ESTAR EN EL SITIO DE LA OBRA Y A DISPOSICIÓN DEL SUPERVISOR DE ESTA DIRECCIÓN.

**SUB-DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Lorenzo Antonio Álvarez Zapata

**ING. LORENZO ANTONIO ÁLVAREZ ZAPATA
AUTORIZÓ**



**OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021**



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 16 DE ENERO DEL 2019


ASUNTO: ASIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 ENTRE
CAMILO MANZO Y FELIPE DE LA GARZA
COL. GPE. MAINERO
CD. VICTORIA TAM.

PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA AMPARADA BAJO EL **CONTRATO FM-01-19** LA SUPERVISION POR ESTE DEPARTAMENTO ESTARA A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.

ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021





AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACION DE SUPERVISOR

ABASOLO TAM. A 16 DE ENERO DEL 2019

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA SE
INICIARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA FM-02-19 ;**

**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE
10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

**ASI MISMO LA SUPERVISION DE DICHOS TRABAJOS ESTARA A CARGO DE SU SERVIDOR.
ING. JESUS ARMANDO VANOYE SANCHEZ PARA CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACION Y PARA
CUMPLIR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TIEMPO Y FORMA.**

SIN OTRO DE MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
CONTRATISTA**



Haciendo realidad sus ideas



DISEÑOS

Obras Civiles

Redes de A. Potable y Alcantarillado

• Vivienda • Escuelas • Edificaciones • Centros de Salud

AVISO DE TERMINACION DE OBRA


ABASOLO TAM. A 7 DE FEBRERO DEL 2019.

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA TERMINARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. DEL CONTRATO FH-01-19. PARA CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACION Y PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TIEMPO Y FORMA.

SIN OTRO DE MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


**ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ
CONTRATISTA**



ARMANDO DAVID

Vanoye Sanchez

INGENIERIA CIVIL

Haciendo realidad sus ideas

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A1 299

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409115676

Fecha y Hora de emisión

2019-02-07T15:40:05

Folio Fiscal

EF1EED29-2B20-11E9-899C-00155D014009

Emisor

RFC: VASA521020A12

Razón Social: ARMANDO DAVID VANOSY SANCHEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-02-07T15:40:06

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90.00	LM - Metro lineal	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$315,149.67 (TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM-01-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE FC=150KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 AL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM ClaveProdServ - 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	3,034.37	273,093.30

TOTAL EN LETRA:

TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN

Subtotal

273,093.30 MXN

IVAT 0.160000

43,694.93 MXN

RET. CONTRALORIA MPAL.

1,365.47 MXN

0.50

RETENCION 0.10

273.09 MXN

Total

315,149.67 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EF1EED29-2B20-11E9-899C-00155D014009[2019-02-

07T15:40:06]TBN040609RKA[RhrCYrgT7pZsPB88IXp1JLvgfx2b7UsVpvnvGNHbEQyy4z3yHJpNq2ufQGulDgFaQwim7xJmDXsse2jb0cCYa4PDHqR6NW5EKY+ac5/IC5yWaD/Ex2i0j+6mTdmGMOnw1JUvsmUXyLJSL7Z8FTp9ORUSYznBLixShCg/2LstDeA78CDcae0AldphDTIBo2Vh3DJBB6N6K1rYsksmO5eThnxgQRKQoQYkPnC31zf39yEibIW7DKBQI035k5+38D++1r+URD37dyT0Z+uYNgZKhCYFZowTWCer9MymOJnouW917EZlplkwP63xb0bktMTBISDXWBfmlsXsDP+VJ0A==[00001000000403557578]]

Sello digital del emisor

RhrCYrgT7pZsPB88IXp1JLvgfx2b7UsVpvnvGNHbEQyy4z3yHJpNq2ufQGulDgFaQwim7xJmDXsse2jb0cCYa4PDHqR6NW5EKY+ac5/IC5yWaD/Ex2i0j+6mTdmGMOnw1JUvsmUXyLJSL7Z8FTp9ORUSYznBLixShCg/2LstDeA78CDcae0AldphDTIBo2Vh3DJBB6N6K1rYsksmO5eThnxgQRKQoQYkPnC31zf39yEibIW7DKBQI035k5+38D++1r+URD37dyT0Z+uYNgZKhCYFZowTWCer9MymOJnouW917EZlplkwP63xb0bktMTBISDXWBfmlsXsDP+VJ0A==

Sello digital del SAT

YI562rkinSGzF97Lt+SqMbQlqWA52zTxJw4uoRlx13pZ1MMH/M2LmnyUOO68FN2CaPdwuJ2IR4oW8hEcr6lbeOht2Hj8BMcCpMEXCRf47MC8J8/qg+I70491oOS+ALmvNbGwviCD+JH83FnaUoPTE/FhIaxHrW1+5TmY/HPUYMdGylfWfRtGxOup0bzFe185ISQvn0XEr5tWg+s2yGJNmGFISDj2YxuyVZlR0IUTBfOckmLgysdyk7ufYgF1GFaL4UzVrwoR/nKCPm46AC87xGfpy4jaOr9+ruKTelnmNmSSppZU+7UfxQ7kU8jym/iypXCp80RcQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.facturax.com>

Página 1 de 1



Liberty Fianzas

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.



POLIZA DE FIANZA

Lugar: CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS A 14 DE ENERO DE 2019

Fianza No. 2057447-0000

Fiado: VANOYE SANCHEZ ARMANDO DAVID *****

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Monto: \$31,678.82

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Treinta y Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 82/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 16 DE ENERO DE 2019

DOMICILIO DEL FIADO: BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760, COL. GUADALUPE MAINERO, C.P. 87100, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALLE LAZARO CARDENAS Y GUILLERMO PRIETO SIN NUMERO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS C.P. 87760

ANTE: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

POR ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760, COL. GUADALUPE MAINERO C.P. 87100, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VASA521020A12 EL CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS Y BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN MODALIDAD: DE ADJUDICACION DIRECTA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO FM-01-19 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, Y POR LA OTRA PARTE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, RELATIVO A: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. CON UN IMPORTE DE \$316,788.23 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARA CUANDO ASI LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO. LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA DE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.-FIN DE TEXTO.-

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14X8NdNcM

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte





Pagos SPEI enviados

Fecha: 12/02/2019
Hora: 07:50:19
Página: 1

Fecha Valor: 12/02/2019 Clave de Rastreo: HSBC049223
Fecha de proceso de la instrucción: 12/02/2019 Hora de proceso de la instrucción: 13:33:49 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4062214390
Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante: FM0119
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 315,149.67

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072810002156902634 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
Banco Beneficiario: BANORTE/IXE
Concepto de Pago:



*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

Informe procesado por: GARZA, YESIKA (MUNICIPIO21)

Autorización del pago > Detalles > Acuse de recibo - Pago preferente (autorizar)

Información del pago

Fecha valor (dd/mm/aaaa)	12/02/2019
Referencia de la instrucción	24745ED00J2A
Referencia del cliente	FM0119
Cuenta de débito	MXHBMICA4062214390
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	315,149.67
Nombre del beneficiario	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
Banco beneficiario	BANORTE/IXE
Cuenta de crédito o beneficiario	072810002156902634
Estado	En proceso por el banco

Se encontraron errores o advertencias

Hora del informe: 2 Feb 2019 07:29:13 GMT

-Fin del informe-



[illegible]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION

REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			Nº DE CONTRATO: FM-01-19				
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ				PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019							
META: 540.00 M2				FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE (\$)		
1	EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	M3	\$ 107.79	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	\$	8,730.90	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	\$ 489.56	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	\$	264,362.40	
SUBTOTAL									\$ 273,093.30		
ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ										ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA	
CONTRATISTA										SUPERVISOR	

OPERA
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 1 DE 11

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: E.J. GUIA DEL PORVENIR	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-01-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
META:: 540.00 M2	FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019		

		PROF	LARGO	ANCHO	UNIDAD	TOTAL	ANT	PRESENTE	ACUM	EXED	POR EFEC
1	EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	81	90.00	6.00	M3	81.00	0	81.00	81.00	0.00	0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	540	90.00	6.00	M2	540.00	0	540.00	540.00	0.00	0.00

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 1 DE 11
GENERADOR Nº: 1 (UNICO)

CROQUIS

OBRA: REHABILITACIÓN DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	Nº DE CONTRATO: FM-01-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
META 540.00 M2		7 DE FEBRERO DEL 2019	

90.00 M.L.
7W 00'9

CANCELADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

ING. ARMANDO DAVID YANDEY SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

Lorenzo A. Alvarez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRAFICO


GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-01-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.		FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019	

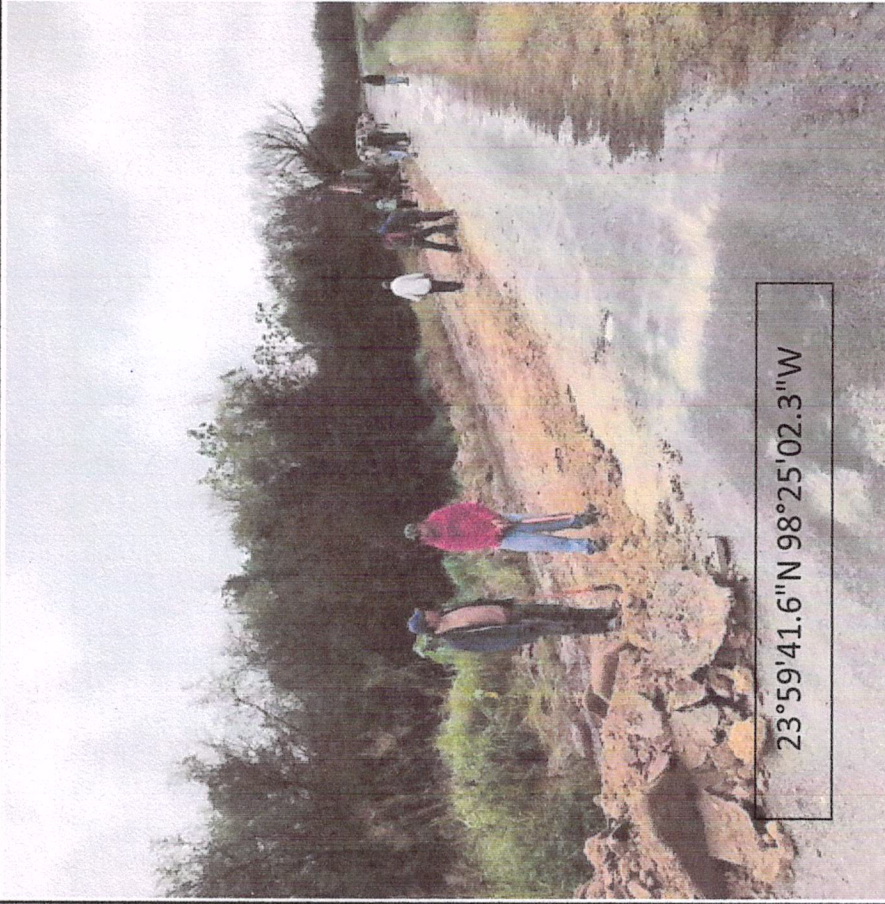

23°59'41.6"N 98°25'02.3"W

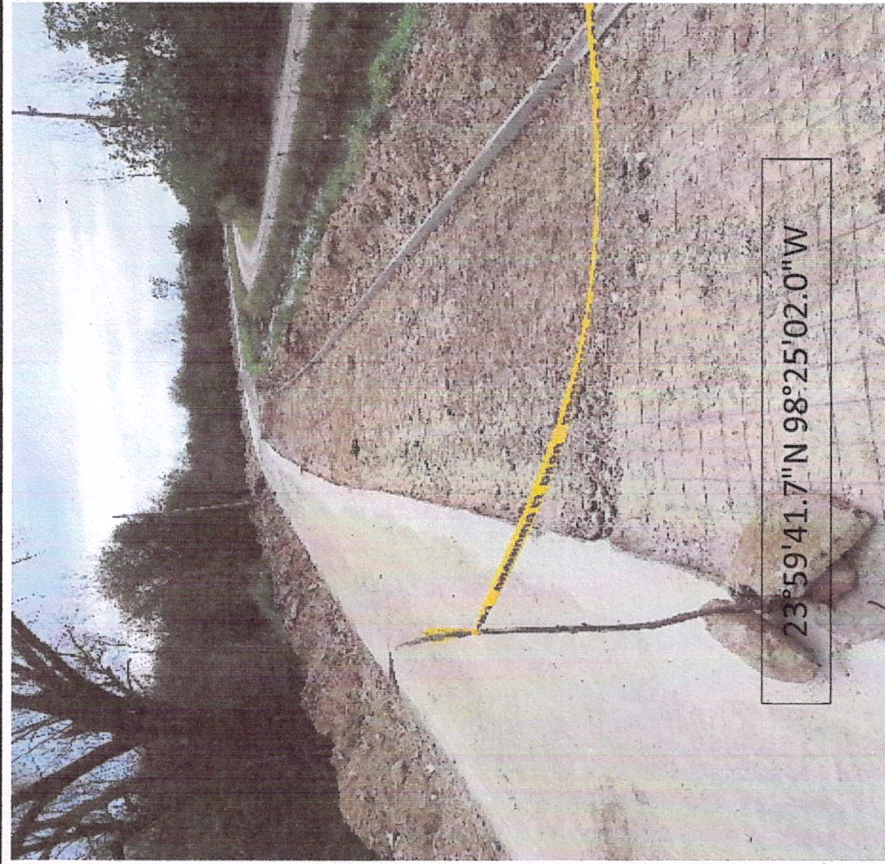

23°59'41.7"N 98°25'02.0"W

ING. ARMANDO DAVID VARGAS SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: E.J. GUIA DEL PORVENIR	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-01-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.		FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019	



ING. ARMANDO DAVID VARGAS SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-01-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.		FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019	

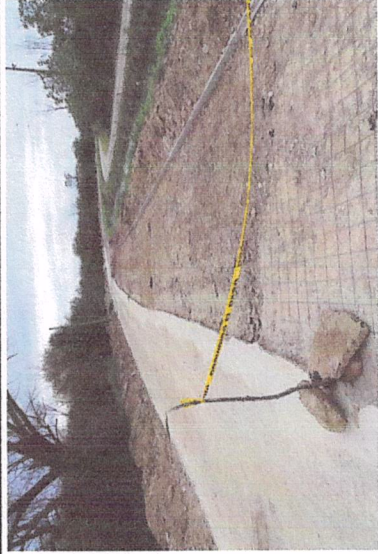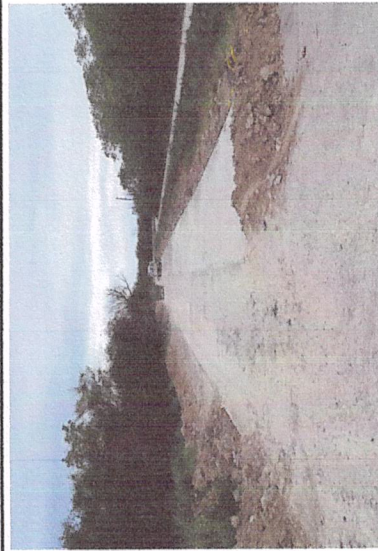

23°59'40.2"N 98°25'05.9"W



23°59'41.9"N 98°25'01.8"W

OPERADO

ING. ARMANDO DAVID MENDOZA SANCHEZ

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONTRATISTA

SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.


LOCALIDAD: EJ. GUIA DEL PORVENIR	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-01-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 16 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2019
OBRA: REHABILITACION DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL E.J. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.		FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2019	

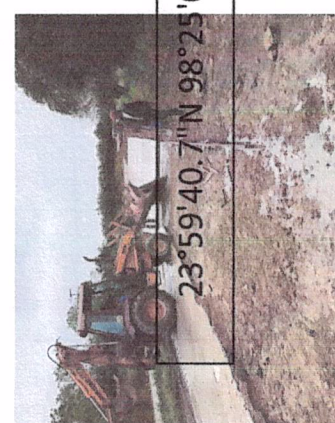

23°59'40.7"N 98°25'04.6"W



23°59'41.0"N 98°25'03.8"W

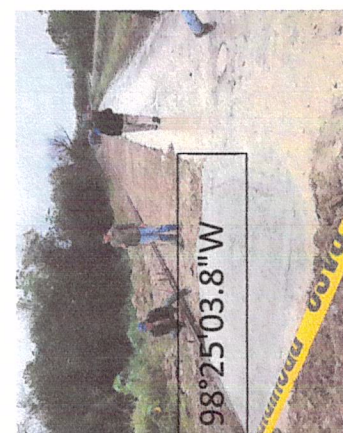

OT-E-RADO

ING. ARMANDO DAVID VARGAS SANCHEZ

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

CONTRATISTA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO N°: FM-01-19

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: REHABILITACIÓN DE 90.00 M.L. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUÍA DEL PORVENIR EN MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 16 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2019.

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SÁNCHEZ

DOMICILIO FISCAL: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 COL. MAINERO CIUDAD VICTORIA, TAM. C.P. 87100

R.F.C.: VASA521020A12

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.


ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:


ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-19**



I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **07** DEL MES DE **FEBRERO** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE 90.00 ML. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUÍA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-19**



N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	M3	81.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	540.00

III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. FM-01-19 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$316,788.23 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 23 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2019 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **07 DE FEBRERO DEL 2019** DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **23 (DIAS.)** CALENDARIO.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-19**



V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	16 DE ENERO DEL 2019 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019	\$273,093.30	0.00	0.00	\$1,638.57	A1 299

RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$316,788.23	0.00	0.00



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-19**



VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$31,687.82	2057447-0000	LIBERTY FIANZAS

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ"** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **07 DE FEBRERO** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-01-19**




ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ
SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIN DEL ACTA



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FM/01/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA FM/01/19.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **07 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRÍGUEZ** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SÁNCHEZ**. LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

REHABILITACIÓN DE 90.00 ML. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUÍA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATO QUE SE CUMPLIERON DEL 16 DE ENERO DEL 2019 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019.



N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	EXCAVACIÓN A MANO Y EQUIPO HASTA 15 cms.. EN TERRENO TIPO "B". CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , ACARREO A MANO EN CARRETILLA FUERA DE LA OBRA ,INCLUYE MATERIALES Y EQUIPO.	M3	81.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC=150 KG/CM2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10. , EN TERRENO COMPACTADO DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION,CIMBRA Y ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	540.00

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 23 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 16 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2019.

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPO

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.



Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS	\$31,678.82	2057447-0000	LIBERTY FIANZAS	08 DE FEBRERO DEL 2019 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020.

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** mediante oficio sin número de fecha **16 DE ENERO DEL 2019**.

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. FM-01-19.

REHABILITACIÓN DE 90.00 ML. DE ACCESO; CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR EN EL EJIDO GUÍA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.




ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FM-01-19




FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ING. ARMANDO DAVID VANOZE SANCHEZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-----**FIN DEL ACTA**-----

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021**

FOLIO: 01

BITÁCORA DE OBRA:

DATOS DE LA OBRA

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM-01-19
NOMBRE DE LA OBRA	Rehabilitación de 90.00 M.L.		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Es. Guic del Porvenir		
CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez		
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Armando David Vanoye Sanchez		
FECHA DE INICIO	16 de Enero del 19	FECHA DE TERMINO	07 de Febrero del 19

REGISTRO DE FIRMAS

	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. Homero Conde Rodriguez	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez	
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Lorenzo Antonio Alvarez Zapata	Lorenzo A. Alvarez Z.
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Rastreo con motoconformadora para retirar basura, acarreo de material producto de excavación.
Colocación de concreto hidráulico y malla electrosoldada.

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021**

FOLIO: 02

BITÁCORA DE OBRA:

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM-01-19
NOMBRE DE LA OBRA	Rehabilitación de 90.00 M.L.		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Ej. Guici de Porvenir		
CONTRATISTA	Ing. Armando David Vinyo Sanchez		
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Armando David Vinyo Sanchez		

NOTA No.	NOTAS	FECHA
01	Iniciamos los trabajos empezando a cortar la superficie del acceso con maquinaria retirando escombros y material contaminado.	16-01-19
02	Continuamos con los mismos trabajos, además por las orillas se retiro la maleza para delimitar el ancho que se requiere y poder colocar la cimbra.	17-01-19
03	Se le dio una nivelación al terreno y se empezó a colocar la cimbra.	18-01-19
04	Hoy se trabajo medio día porque llovió solo se siguió colando la cimbra.	19-01-19
05	Llegó el material, la revolvedora y la malla electrosoldada. Empezamos a colocar la malla y comenzamos a elaborar y tirar el concreto.	21-01-19
06	Continuamos con los mismos trabajos.	22-01-19
07	Se siguió colando	23-01-19
08	No se trabajo porque estuvo lloviendo.	24-01-19
09	No se trabajo porque siguió lloviendo.	25-01-19
10	Retiramos cimbra y la colocamos en tramos sig.	26-01-19
11	Cambio de cimbra y colocación de malla.	29-01-19
12	Colamos el siguiente tramo.	30-01-19
13	Llovió no se trabajo	31-01-19
14	Seguía lloviendo	01-02-19
15	Seguía lloviendo	02-02-19
16	Continuamos cimbrando y colocando malla.	04-02-19

Horacio A. Alvarez Z.
FIRMA DEL SUPERVISOR
(SERVIDOR PUBLICO)


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
(CONTRATISTA)

FOLIO: 03

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM-01-19
NOMBRE DE LA OBRA	Rehabilitación de 90.00 ML		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Ej. Guila del Porvenir		
CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoyle Sanchez		
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Armando David Vanoyle Sanchez		

[illegible]

~~FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA~~
~~(CONTRATISTA)~~

Sra presidenta Yesika Yanet Solvera

Mediante el presente me permito solicitar
Su Apoyo para el acceso de la Entro/a
del Ejido Guia del porvenir ya que esta muy
mal en condiciones para los vehiculos que
sinculan de este ejido

Agradeciendo de antemano lo antes
requerido enviandole un cordial saludo

Gracias



MÉXICO


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BOCANEGRA
MARTINEZ
MACRINA
DOMICILIO
- GUÍA DEL PORVENIR S/N
EJ GUÍA DEL PORVENIR 87760
ABASOLO, TAMPS.

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1960
SEXO: M

CLAVE DE ELECTOR BCMRMC60053022M600
CURP BOMM600530MQTCRC11 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 28 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0012
LOCALIDAD 0044 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



Bocanegra

EDUARDO HERRERA
SECRETARIO DEL INE

19989324

IDMEX1313891994<<0012029392123
6005306M2512314MEX<03<<01911<9
BOCANEGRA<MARTINEZ<<MACRINA<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ACOSTA
HERNANDEZ
MA. ELENA

FECHA DE NACIMIENTO
11/04/1970

DOMICILIO
- GUÍA DEL PORVENIR S/N
EJ GUÍA DEL PORVENIR 87760
ABASOLO, TAMPS.

CLAVE DE ELECTOR ACHRMA70120422M400

CURP AOHE701204MQTCRL05

ESTADO 28 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0012

LOCALIDAD 0044 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

AÑO DE REGISTRO 1991 02

EDMUNDO SECRETARIO EJECUTIVO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Ma. Elena Acosta Hdz

IDMEX1321971475<<0012003729495
7012048M2512314MEX<02<<02422<8
ACOSTA<HERNANDEZ<<MA<ELENA<<<<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
MARTINEZ
ALMA GRISELDA

DOMICILIO
- GUJA DEL PORVENIR S/N
EJ GUJA DEL PORVENIR 87760
ABASOLO, TAMP.

FECHA DE NACIMIENTO
20/11/1970

SEXO: M

CLAVE DE ELECTOR GRMRAL70112028M202

CURP GAMA701120MTSRRRL04 AÑO DE REGISTRO 2003 04

ESTADO 28 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0012

LOCALIDAD 0044 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INE



Alma Griselda Garcia
Martinez

EDUARDO SOLORIO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

1432318

IDMEX1321970788<<0012067863283
7011203M2512314MEX<04<<02412<7
GARCIA<MARTINEZ<<ALMA<GRISELDA

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VEGA
MARTINEZ
SEVERIANO

FECHA DE NACIMIENTO
21/02/1955

SEXO: H

DOMICILIO
GUÍA DEL PORVENIR S/N
EJ GUÍA DEL PORVENIR 87760
ABASOLO, TAMP.

CLAVE DE ELECTOR VGMRSV55022124H800

CURP VEMS550221HSPGRV00 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 28 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0012

LOCALIDAD 0044 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

EDUARDO JACOBO HOLLÁN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1270386397<<0012022332763
5502211H2412311MEX<02<<11166<0
VEGA<MARTINEZ<<SEVERIANO<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DIAZ
VILLANUEVA
NATIVIDAD

DOMICILIO
GUIA DEL PORVENIR SIN
EJ GUIA DEL PORVENIR 87760
ABASOLO, TAMP.

CLAVE DE ELECTOR DZVLNT60090826H500

CURP DIVN600908HTSZLT04

AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 28

MUNICIPIO 001

SECCIÓN 0012

LOCALIDAD 0044

EMISIÓN 2014

VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO
08/09/1960

SEXO: H



SECCIONES ELECTORALES

LOCALIDAD ADMINISTRATIVA

IFE



Natividad Diaz V



EDUARDO JACOBINO MORA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1186477488<<0012026320621
6009083H2412311MEX<02<<05317<7
DIAZ<VILLANUEVA<<NATIVIDAD<<<<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ALFARO
LEOS
RODOLFO

DOMICILIO
- GUIA DEL PORVENIR SN
EJ GUIA DEL PORVENIR
ABASOLO, TAMP.

CLAVE DE ELECTOR ALLSRD81122824H800

CURP AALR811228HSPLSD08

AÑO DE REGISTRO 2000 06

ESTADO 28

MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0012

LOCALIDAD 0044

EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO

28/12/1981


SEXO: H



IDENTIFICACION

FECHA DE EMISION

INE



Rodolfo Alfaro L.



EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1525637917<<0012054658333
8112288H2612317MEX<06<<03493<5
ALFARO<LEOS<<RODOLFO<<<<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
DE LA CRUZ
MORAN
BERONICA
DOMICILIO
- GUÍA DEL PORVENIR S/N
EJ GUÍA DEL PORVENIR 87760
ABASOLO, TAMPS.

FECHA DE NACIMIENTO
03/02/1976
SEXO -M-

CLAVE DE ELECTOR CRM RB 76020328M800
CURP CUMB760203MTSFRR09 AÑO DE REGISTRO 2005 02
ESTADO 28 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0012
LOCALIDAD 0044 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



INE

Baronica de la
Cruz Moran

EDMUNDO JUAN ROJO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1321968510<<0012072908124
7602034M2512314MEX<02<<02381<8
DE<LA<CRUZ<MORAN<<BERONICA<<<<



NOMBRE
MANZANO
GONZALEZ
GLORIA LETICIA
DOMICILIO
- LOC GUIA DEL PORVENIR S/N
EJ GUIA DEL PORVENIR 87760
ABASOLO, TAMPS.

FECHA DE NACIMIENTO
26/09/1983
SEXO: M



CLAVE DE ELECTOR MNGNGL83092628M100

CURP MAGG830926MTSNNL04 AÑO DE REGISTRO 2001 02

ESTADO 28 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0012

LOCALIDAD 0044 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



Gloria Leticia
Manzano G12



EDMUNDO ALONSO HOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1327485356<<0012057527501
8309260M2512314MEX<02<<02777<6
MANZANO<GONZALEZ<<GLORIA<LETIC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2019.

ANEXO PLAN DE OBRA 2019			
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Presupuesto Autorizado
1	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	2.00
2	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	3.00
3	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
4	CUARTOS DORMITORIO	EL PARRAS DE LA FUENTE	2.00
5	CUARTOS DORMITORIO	COL. BEATRIZ ANAYA	2.00
6	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
7	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
8	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
9	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
10	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
11	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
12	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
13	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
14	CONSTRUCCION DE 126.71 M2 DE LOSAS MONOLITICAS	EL JESUS RAMIREZ	2.00
15	CONSTRUCCION DE 126.71 M2 DE LOSAS MONOLITICAS	CABECERA MUNICIPAL	2.00
16	CUARTOS DORMITORIO	EL EL MODELO Y J. RAMIREZ	2.00
17	CUARTOS DORMITORIO	EL EL MODELO	2.00
18	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
19	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	2.00
20	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. GUADALUPE	2.00
21	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	2.00
22	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 4.10 X 1.40	EL EL MODELO	2.00
23	CUARTOS DORMITORIO	EL EL MODELO	2.00
24	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON 7 DESCARGAS	COL. BEATRIZ ANAYA	2.00
25	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON 9 DESCARGAS	N.C.P. GUADALUPE	2.00
26	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. GUADALUPE	2.00
27	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. NICOLAS BRAVO	2.00
28	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	N.C.P. VICTORIA	2.00
29	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CABECERA MUNICIPAL	2.00
30	CONSTRUCCION DE 770.00 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	EL GILDAIRDO MAGAÑAS	2.00
31	CONSTRUCCION DE 470.00 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	COL. CANALES LERMA	2.00
32	CONSTRUCCION DE 490.00 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	N.C.P. GUADALUPE	2.00
33	REHABILITACION DE CUENTAS PLUVIALES Y DENSOLAVE DE VADOS	N.C.P. GUADALUPE	2.00
34	REHABILITACION DE ACUEDO	EL PARRAS DE LA FUENTE	2.00
SUBTOTAL			\$12,660,911.40
TOTAL			\$12,660,911.40

PLAN DE OBRA PUBLICA 2019			
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	EL PARRAS DE LA FUENTE	1.00
2	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. BEATRIZ ANAYA	1.00
TOTAL			\$ 287,786.61
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS RECURSOS MARTIMOS 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	N.C.P. GUADALUPE	1.00
2	CONSTRUCCION DE 50.00 ML. DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PARRAS DE LA FUENTE	1.00
3	REHABILITACION DE TUBERIAS METALICAS EN ALBERQUE	EL PARRAS DE LA FUENTE	1.00
4	CONSTRUCCION DE TUBERIAS METALICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	N.C.P. DOLORES	1.00
5	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 150.00 ML. DE GUARNICIONES Y 450.00 M2 DE ENCALCAMIENTO	N.C.P. GUADALUPE	1.00
6	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TUBERIA	CABECERA MUNICIPAL	1.00
TOTAL			\$ 145,077.22
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE TUBERIAS SANITARIO	N.C.P. DOLORES	1.00
2	CONSTRUCCION DE TUBERIAS SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	1.00
3	CONSTRUCCION DE TUBERIAS SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	1.00
4	CONSTRUCCION DE TUBERIAS SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	1.00
5	CONSTRUCCION DE TUBERIAS SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	1.00
6	CONSTRUCCION DE TUBERIAS SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	1.00
TOTAL			\$ 30,516.52
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE 50.00 ML. DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PARRAS DE LA FUENTE	1.00
2	CONSTRUCCION DE TUBERIAS METALICAS EN ALBERQUE	EL PARRAS DE LA FUENTE	1.00
3	CONSTRUCCION DE TUBERIAS METALICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	N.C.P. DOLORES	1.00
4	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 150.00 ML. DE GUARNICIONES Y 450.00 M2 DE ENCALCAMIENTO	N.C.P. GUADALUPE	1.00
5	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TUBERIA	CABECERA MUNICIPAL	1.00
6	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TUBERIA	CABECERA MUNICIPAL	1.00
TOTAL			\$ 1,646,475.07
